

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Orellana

PROYECTO: K029 MTOP - Puente sobre el río Zamona

Líder del Proyecto:	Navarrete Gilces, Silvia Katherine (snavarrete@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Programas Relacionados:	PUENTE SOBRE EL RIO ZAMONA
Titular:	Mendoza Carreño, Adrian Alberto	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.375649	TIR:	20.01 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	385.40
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	964,440.98
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2012 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	04/01/2020	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	Fecha del siguiente Hito:	10/12/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION:

La construcción del Puente Sobre el Río Zamona de las siguientes características:

Longitud (m.) : 40 m.

Ancho (m) : 11,30m.

No. de carriles: 2

Capacidad de carga :45ton

La sección transversal de la vía en el sitio de cruce contempla dos aceras de 1.20m de ancho; dos espaldones exteriores 0.80m; 2 vías de tráfico, 1 en cada sentido de 3.65m cada una.

Estructura : Losa de hormigón armado

Esta necesidad de la construcción de este puente se crea porque estos puentes previstos como mecanismos de emergencia realizados con tubería reciclada ubicados en la vía de Coca a la parroquia de Dayuma de 40.30 Km., que actualmente presentan un alto grado de desgaste en su estructura originados por muchos factores como: incremento de la carga vehicular, mayor intensidad de tráfico, deterioro del pavimento, deterioro de la estructura de los puentes y condiciones climatológicas, la capacidad de carga del puente Zamona es de 30 toneladas de un solo carril, lo cual es insuficiente para los volúmenes de tráfico de tubería para taladros, tanques de almacenamiento de diesel de 500 barriles, taladros de perforación petrolera, contenedores de dormitorios, plantas generadoras de energía, maquinaria pesada como excavadoras, volquetas, y grúas que transitan en la vía Coca-Dayuma, ocasionando inseguridad a los usuarios de la vía. además debido a la intensidad de tráfico por la estrechez del puente los vehículos al rebasarse una al otro al momento de ingresar a los puentes han ocasionado accidentes de tránsito por lo que es necesario la construcción de dicho puente para así de esta manera dar un mejor servicio.

LINEA BASE DEL PROYECTO

La capacidad de carga del puente sobre el río Zamona es de 30 toneladas.

La estructura del puente Zamona es metálica de 15m. de longitud y 4.5 m. de ancho.

El tiempo de viaje de la parroquia Francisco de Orellana a la parroquia Dayuma es de 1 hora.

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la movilidad y conectividad de la población del cantón Orellana mediante la Construcción del puente sobre el río Zamona de hormigón armado, en la Carretera Coca - Dayuma, con condiciones de transitabilidad permanente.

PRODUCTO:

Ampliar y mejorar la movilidad y conectividad de la población del cantón -Orellana mediante la construcción del puente, obteniendo así un significativo ahorro en los costos de operación vehicular y tiempo de viaje y brindar al usuario un alto confort y seguridad.

Es primordial indicar también que este Proyecto es un Compromiso Presidencial

Beneficios Cualitativos

Al realizarse la Construcción de este proyecto se mejoraría la viabilidad del transporte interprovincial y los de carga pesada de las petroleras y de toda quienes circulan por la vía habría una mejor conectividad entre las provincias en un menor tiempo y así mejorar la seguridad del usuario de dichas vías que conectan a las provincias aledañas.

Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios serian el sector productivo , las operadoras petroleras y usuarios en general

Restricciones


TIEMPO : El contratista debe cumplir con los plazos establecidos en el cronograma de trabajos para la culminación de la obra

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

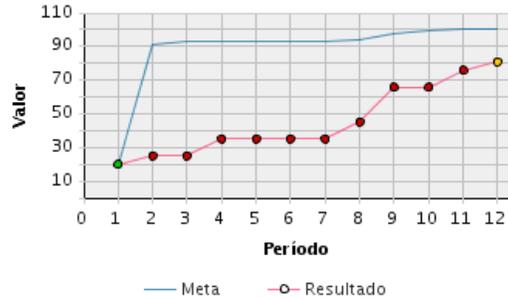

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	20 %	91 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	94 %	98 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	20 %	25 %	25 %	35 %	35 %	35 %	35 %	45 %	66 %	66 %	76 %	81 %
Estado												
	●	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	▼

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Diciembre 2019: Se concluyo con los trabajos de construcción de la pantalla de protección, colocación de base y subbase en accesos al puente, se realizaron los trabajos de construcción de cunetas y bordillos , cajas de revisión de aguas lluvias, cuenta con un porcentaje de 98.50 %	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/01/2020 - 02:24 PM
Noviembre 2019: Se estan realizando los trabajos de construccion de la pantalla de protección, colocación de base y subbase en accesos al puente.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/12/2019 - 03:09 PM
Octubre 2019: Se encuentran realizando trabajos de mejoramiento, colocación de subbase y base en los accesos del puente hormigón simple en las obras complementarias, colocación de guardavías. Se encuentra pendiente la legalización del Contrato Complementario y Orden de Cambio.cuenta con un avance 90%	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/11/2019 - 02:13 PM
Septiembre 2019: Mediante oficio Nro. MTOP-CONS_ORE-2019-002-AM-EQ, de fecha 28 de agosto de 2019, se procede a levantar la suspension de los trabajos por el administrador de la Obra, se reinician los trabajos a fin de culminar la obra.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/10/2019 - 12:57 PM
Agosto 2019: La obra se encuentra suspendida hasta que exista certificación presupuestaria para una orden de cambio y contrato complementario. Actualmente cuenta con un avance físico del 82%, se encuentra armada la losa lista para el hormigonado. La orden de cambio ya se encuentra certificada con fecha 28-08-2019, falta la aprobación del aval para el contrato complementario, mismo que se solicitó con memorando nro. MTOP-DDO-2019-814-ME de fecha 21 de agosto del 2019, y enviado al subsecretario de infraestructura del transporte con memorando nro. MTOP-SUBZ2-2019-1154-M de fecha 23 de agosto de 2019.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/09/2019 - 04:36 PM
Julio 2019.- Se realizan los trabajos de armado de acero estructural en la losa del puente, se tiene previsto la fundición de la losa del tablero del puente para el fines del mes de julio 2019, al momento se encuentra suspendida la obra mediante oficio Nro.MTOP-DDO-2019-01-ME-EQ, suscrito por el señor ingeniero Adrián Mendoza Carreño, Administrador del Contrato de Obra, por motivos de asignación de recursos para la implementación de la Orden de Cambio Nro. 01, y Contrato Complementario Nro. 01.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	03/08/2019 - 08:43 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Junio 2019: Se ejecutaron trabajos de excavación y relleno para puentes, transporte de material de excavación, montaje de acero estructural ASTM A-538 ($f_y=3500\text{m kg/cm}^2$), hormigón estructural clase B ($f'c=kg/cm^2$), acero de refuerzo en barras, material filtrante. Tubería de PVC, hormigón C ($f'c=210\text{ kg/cm}^2$) Obra suspendida a partir del 21 de mayo de 2019. cuenta con un avance de 75.26%	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/07/2019 - 08:23 AM
Abril 2019: Se termino la construccion del estribo izquierdo del puente, se realizo la fundicion de los pilotes del lado derecho, fundidos 7 pilotes, llegaron las vigas metalicas. cuenta con un avance de 58.28%	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	02/05/2019 - 07:29 AM
Marzo 2019: Se levanto la suspensión de los trabajos con fecha 04 de abril de 2019 , al momento se encuentran trabajando en el hincado de pilotes en el lado derecho, se esta colocando refuerzo para la pantalla del estribo izquierdo, transporte de material, hormigonado del estribo izquierdo.Cabe indicar; que en el presente periodo a pesar que la obra esta suspendida se ejecutaron trabajosEs decir se tiene un avance físico hasta la presente fecha del 55,17 %	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/04/2019 - 08:15 AM
Febrero 2019: Se encuentra en tramite suspensión de plazo	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	06/03/2019 - 08:46 AM
Enero 2019: Se encuentra en tramite suspensión de plazo, debido a que existe un proceso realizado por la Empresa Eléctrica denominado "Construcción y Repotenciación Eléctrica del Alimentador Vía al Auca - San Vicente a 13.8 KV desde la cruce de Río Payamino, y que justamente cruza por la obra construcción Puente Zamona, para lo cual se solicito la autorización para la instalación de la posteria de dicha obra por la CNEL, por tales motivo esta en tramite de suspensión ya que actualmente la linea electrica existente no permite realizar los trabajos con normalidad.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/02/2019 - 02:44 PM
Diciembre 2018: Se encuentran actualmente se encuentran realizando los siguientes rubros: Suministro, fabricacion, montaje de acero estructural (A36) Transporte de material. Excavación.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/01/2019 - 03:59 PM
Noviembre 2018: Se ha solicitado la suspensión de plazo del proyecto de parte de la Contratista, debido a que en los estudios iniciales no contempla el alcantarillado de aguas servidas construidas por el Municipio en el año 2015, posterior a la entrega definitiva de los estudios.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/12/2018 - 01:32 PM
Octubre 2018: Se ha venido realizando campamento, transporte de maquinaria, trabajos de replanteo y nivelación con el equipo topografico.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/11/2018 - 11:57 AM
Septiembre 2018: Con fecha 25 de septiembre se firmo el contrato para la ejecución del proyecto con la Compañía ACCYEM PROYECTOS, el mismo que a partir de la suscripción iniciara los trabajos de ejecución de la obra.	Pita Suarez, Esteban Alejandro	04/10/2018 - 01:01 PM
Agosto 2018: El proyecto se encuentra en proceso de adjudicación para luego iniciar con la fase constructiva,	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/09/2018 - 03:25 PM
Julio 2018: El proyecto se encuentra en proceso precontractual para luego iniciar con la fase constructiva	Lara Mendoza, Richard Patricio	01/08/2018 - 02:56 PM
Junio 2018: Se encuentra en proceso precontractual para su ejecución	Lara Mendoza, Richard Patricio	06/07/2018 - 12:55 PM
Mayo 2018: Se esta preparando la la etapa preparatoria para el inicio del proceso del proyecto por parte de la Dirección Distrital de Orellana	Lara Mendoza, Richard Patricio	04/06/2018 - 02:22 PM
Abril 2018: En apego a lo dispuesto en el artículo 9 literal b) inciso 2 del Acuerdo Ministerial Nro. 006-2018 de fecha 12 de marzo del 2018, se ha solicitado al Ordenador de Gastos la autorización para el inicio de la etapa preparatoria para la ejecución del proyecto en mención a la Dirección Distrital de Orellana	Lara Mendoza, Richard Patricio	04/05/2018 - 01:33 PM
Marzo 2018: Se esta preparando la información y toda la documentación para su proceso precontractual .	Lara Mendoza, Richard Patricio	16/04/2018 - 04:12 PM
Febrero 2018: Se esta preparando la información y toda la documentación para su proceso precontractual.	Lara Mendoza, Richard Patricio	16/04/2018 - 04:11 PM
Enero 2018: Se estan preparando dctos para el proceso precontractual del proyecto	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/03/2018 - 10:40 PM
Diciembre 2017: Se lo ejecutara en el año 2018	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/01/2018 - 01:00 PM
Noviembre 2017: Se ejecutara en el año 2018	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/12/2017 - 04:36 PM
Octubre 2017:Se cuenta con el Dictamen de actualizacion de la Prioridad, y el aval correspondiente por parte del MF, se esta realizando los documentos a fin de realizar el proceso precontractual para su contratación a mediados del mes de noviembre 2017	Lara Mendoza, Richard Patricio	03/11/2017 - 04:14 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Septiembre 2017:Se cuenta con el Dictamen de actualizacion de la Prioridad, y el aval correspondiente por parte del MF, se esta realizando los documentos a fin de realizar el proceso precontractual para su contratación a mediados del mes de agosto 2017	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/10/2017 - 04:05 PM
Agosto 2017:Se cuenta con el Dictamen de actualizacion de la Prioridad, y el aval correspondiente por parte del MF, se esta realizando los documentos a fin de realizar el proceso precontractual para su contratación a mediados del mes de agosto 2017	Lara Mendoza, Richard Patricio	05/09/2017 - 06:19 PM
Julio 2017:Se cuenta con el Dictamen de actualizacion de la Prioridad, y el aval correspondiente por parte del MF, se esta realizando los documentos a fin de realizar el proceso precontractual para su contratación a mediados del mes de agosto 2017.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/08/2017 - 07:49 PM
Junio 2017:Se cuenta con el Dictamen de actualizacion de la Prioridad, y el aval correspondiente por parte del MF, se esta realizando los documentos a fin de realizar el proceso precontractual para su contratación	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/07/2017 - 01:03 PM
Mayo 2017:Se cuenta con el Dictamen de actualizacion de la Prioridad, y el aval correspondiente por parte del MF, se esta realizando los documentos a fin de realizar el proceso precontractual para su contratación	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/06/2017 - 07:55 PM
Abril 2017:Se cuenta con el Dictamen de actualizacion de la Prioridad, se cuenta con el aval correspondiente por parte del MF, se esta realizando los documentos necesarios para posteriormente realizar el proceso precontractual para su contratación	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/05/2017 - 10:56 PM
Marzo 2017:Se cuenta con el Dictamen de la actualizacion de la Prioridad, se estan elaborando los documentos para de esta manera solicitar aval correspondiente y posteriormente realizar el proceso precontractual para su contratación	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/04/2017 - 10:00 AM
Febrero 2017:Se estan realizando las correcciones a los proyectos en Formato Senplades a fin de obtener la actualizacion de la Prioridad para de esta manera solicitar aval correspondiente y para posteriormente realizar el proceso precontractual para su contratación.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/03/2017 - 02:29 PM
Enero 2017:Se estan realizando los tramites a fin de obtener la actualizacion de la Prioridad para poder solicitar aval para posteriormente realizar el proceso precontractual para su contratación.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/02/2017 - 03:50 PM
Diciembre 2016: Están aprobados los estudios, mediante Oficio Nro. MTOP-DM-16-888-OF de fecha 24 de Noviembre de 2016, el señor ingeniero Boris Córdova MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, solicita al MINISTRO DE FINANZAS la aprobación de la reforma presupuestaria y certificación plurianual de los 9 puentes de la vía Coca-Dayuma de la provincia de Orellana por declaración de emergencia ministerial. La Reforma Presupuestaria para la asignación de recursos para los 9 puentes Coca Dayuma ha sido aprobada	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/01/2017 - 07:27 AM
Noviembre 2016: Están aprobados los estudios, mediante Oficio Nro. MTOP-DM-16-888-OF de fecha 24 de Noviembre de 2016, el señor ingeniero Boris Córdova MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, solicita al MINISTRO DE FINANZAS la aprobación de la reforma presupuestaria y certificación plurianual de los 9 puentes de la vía Coca-Dayuma de la provincia de Orellana por declaración de emergencia ministerial. La Reforma Presupuestaria para la asignación de recursos para los 9 puentes Coca Dayuma ha sido aprobada.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/12/2016 - 05:38 PM
Octubre 2016: Estan aprobados los estudios, se espera a asignación de recursos para su contratación	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/11/2016 - 04:14 PM
Septiembre 2016: Estan aprobados los estudios, se esta elaborando el acta de recepcion definitiva a fin de poder realizar la contratación.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/10/2016 - 04:56 PM
Agosto 2016: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/09/2016 - 03:02 PM
Julio 2016: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/08/2016 - 02:30 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Junio 2016: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/07/2016 - 03:51 PM
Mayo 2016: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/06/2016 - 11:33 AM
Abril 2016: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	06/05/2016 - 03:14 PM
Marzo 2016: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/04/2016 - 04:10 PM
Febrero 2016: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	02/03/2016 - 05:50 PM
Enero 2016: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	11/02/2016 - 11:47 AM
Diciembre 2015: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/01/2016 - 12:34 PM
Noviembre 2015: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/12/2015 - 11:48 AM
Octubre 2015: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	04/11/2015 - 04:25 PM
Septiembre 2015: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	07/10/2015 - 04:50 PM
Agosto 2015: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	08/09/2015 - 06:20 PM
Julio 2015: Se está a la espera de que se aprueben los estudios para poder la contratación de estos puentes. Los mismos que se encuentran en revisión por los especialistas de la Dirección de Estudios Quito, los cuales han enviado a correcciones para que sean sustentadas por el Consultor a fin de dar la aprobación definitiva	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	12/08/2015 - 03:48 PM
Junio 2015: Este proyecto esta aun en fase de estudios los mismos que se encuentran entregados a la Subsecretaria Regional 2 para su revisión y aprobación final, se encuentran en su proceso final para su aprobación final.	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	09/07/2015 - 04:11 PM
Mayo 2015: Este proyecto esta aun en fase de estudios los mismos que se encuentran entregados a la Subsecretaria Regional 2 para su revisión y aprobación final, los mismos que se encuentran en fase de correcciones para su aprobación final por parte de los Tecnicos de la Subsecretaria Regional 2	Navarrete Gilces, Silvia Katherine	05/06/2015 - 03:51 PM
Abril 2015: Este proyecto esta aun en fase de estudios los mismos que se encuentran en fase de revisión para su aprobación final por parte de los Tecnicos de la Subsecretaria Regional 2	Lara Mendoza, Richard Patricio	15/05/2015 - 12:07 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
3- REGIONAL. Ambiental. Fuertes estación invernal CAUSARIA suspendan los trabajos	12/11/2019	Silvia Katherine Navarrete Gilces	10 %	60	6	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Actualización de la Prioridad, actualizada	1-Solicitud de Información	20/03/2017		20/03/2017		Sí	2.5
2	PLANEACION: Elaboración de Pliegos, realizados	1-Solicitud de Información	25/06/2018		25/06/2018		Sí	2.5
3	PLANEACION: Publicación de pliegos, realizado	2-Publicación de Pliegos	27/06/2018		27/06/2018		Sí	2.5
4	PLANEACIÓN: : Adjudicación, realizada	1-Solicitud de Información	06/09/2018		06/09/2018		Sí	2.5
5	EJECUCION: Contrato, firmado	1-Solicitud de Información	25/09/2018		25/09/2018		Sí	5.0
6	EJECUCION: Anticipo, Entregado	1-Solicitud de Información	20/11/2018		20/11/2018		Sí	5.0
7	EJECUCION: Terraceria (Desbroce, desbosque, limpieza, excavación de suelo, transporte de material, remoción de puentes)	1-Solicitud de Información	25/02/2019		25/02/2019		Sí	5.0
8	CIERRE: Informes de Fiscalización, aprobados	V - Verificación ejecutiva	28/02/2019		30/09/2019		Sí	1.0
9	EJECUCIÓN: Capa de Rodadura (mejoramiento de la subrasante, transporte de suelo seleccionado, capa de rodadura, transporte de mezcla asfáltica, asfalto)	1-Solicitud de Información	28/02/2019	30/12/2019			No	10.0
10	EJECUCIÓN: Componente Ambiental, Realizado	1-Solicitud de Información	28/02/2019		30/09/2019		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Drenaje (Excavación para cunetas y encauzamiento, transporte de material, geotextil, hormigón) Realizado	1-Solicitud de Información	28/02/2019		30/09/2019		Sí	5.0
12	EJECUCIÓN: Infraestructura del puente, Realizada	1-Solicitud de Información	28/02/2019		30/08/2019		Sí	10.0
13	EJECUCIÓN: Pilotes, Realizado	1-Solicitud de Información	28/02/2019		30/04/2019		Sí	10.0
14	EJECUCIÓN: Señalización del puente, Realizado	1-Solicitud de Información	28/02/2019		30/11/2019		Sí	10.0
15	EJECUCIÓN: Superestructura del Puente; Realizado	1-Solicitud de Información	28/02/2019		30/09/2019		Sí	10.0
16	EJECUCIÓN:Obras complementarias, Realizado	1-Solicitud de Información	28/02/2019		30/12/2019		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
17	CIERRE: Liquidación Económica, aprobada	9-Entregables Formales	15/03/2019	15/12/2019		▼	No	1.0
18	CIERRE: Acta de Entrega de Recepción Provisional, Suscrita	9-Entregables Formales	22/03/2019	22/12/2019		▼	No	1.0
19	CIERRE: Acta de Entrega de Recepción Definitiva, Suscrita	9-Entregables Formales	30/08/2019	30/12/2019		▼	No	1.0
20	CIERRE: Cierre de proyecto según formato SENPLADES, aprobado	9-Entregables Formales	16/09/2019	16/12/2019		▼	No	2.0
21	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, Suscrito.	9-Entregables Formales	20/09/2019	20/12/2019		▼	No	1.0
22	CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago. Suscrito.	9-Entregables Formales	27/09/2019	27/12/2019		▼	No	1.0
23	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios contables o de tesorería pendientes por liquidar .suscrito-MEF	9-Entregables Formales	10/10/2019	10/12/2019		▼	No	1.5
24	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	21/11/2019	21/12/2019		▼	No	0.5
25	COMPLETADO	9-Entregables Formales	30/11/2019	30/12/2019		▼	No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	964,440.98 **
Costo Total:	2,140,012.60
Total Devengado:	1,590,822.93
% Costo Total Devengado:	74.34 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 74.34 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,140,015.60	282,622.02	0.00	2,422,637.62
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	2,968,901.50	210,091.52	0.00	3,178,993.02
Ppto. Codificado	2,441,292.67	210,091.52	0.00	2,651,384.19
Ppto. Comprometido	559,227.20	0.00	0.00	559,227.20
Planeado - Codificado (2019)		72,530.50		
Programado a Devengar	624,378.45	409,176.07	0.00	1,033,554.52
Ppto. Devengado	555,264.91	1,035,558.02	0.00	1,590,822.93
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 555,264.91	0.00	0.00	555,264.91
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	69,113.54	409,176.07	0.00	478,289.61
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 88.93 %	253.08 %	0.00 %	153.92 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

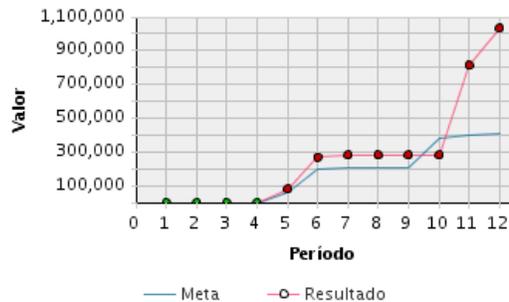

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	58,412.59	79,783.05	58,412.59	79,783.05	136.59 %		19.50 %
Jun	137,518.10	187,829.60	195,930.69	267,612.65	136.59 %		65.40 %
Jul	12,605.49	12,605.49	208,536.18	280,218.14	134.37 %		68.48 %
Ago	0.00	0.00	208,536.18	280,218.14	134.37 %		68.48 %
Sep	1,555.34	0.00	210,091.52	280,218.14	133.38 %		68.48 %
Oct	169,643.58	0.00	379,735.10	280,218.14	73.79 %		68.48 %
Nov	19,816.16	534,682.48	399,551.26	814,900.62	203.95 %		199.16 %
Dic	9,624.81	220,657.40	409,176.07	1,035,558.02	253.08 %		253.08 %
Total	409,176.07	1,035,558.02					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
16	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
19	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Actualización de Prioridad SENPLADES 20 de Marzo 2017	A.6.pdf	04/04/2017
2	Aval del MCPEC	A.5.pdf	04/04/2017
3	Cedula Presupuestaria Noviembre 2019	B.2.pdf	16/12/2019
4	Cedula Presupuestaria OCTUBRE 2019	Cedula_presupuestaria_octubre_2019_orellana.pdf	05/11/2019
5	Cedulas presupuestarias ZAMONA septiembre 2019	B.1.PDF	04/10/2019
6	CONTRATO ZAMONA	A.8.pdf	04/10/2018
7	Declaratoria de emergencias de los puentes de la Vía Coca-Dayuma.	A.3.pdf	05/12/2016
8	Dictamen de Prioridad	A.2.pdf	29/08/2015
9	Estudios Aprobado puente Zamona	A.4.rar	05/12/2016
10	Levantamiento de Suspensión.	A.9.PDF	05/04/2019
11	Proyecto Puente Zamona	A.1.PDF	29/08/2015
12	Solicitud de Autorización al Ordenador de gastos	A.7.pdf	04/05/2018

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Mendoza Carreño, Adrian Alberto	Administrador del proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Orellana	amendoza@mtop.gob.ec	023974798

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Ramirez Barahona, Rodrigo Santiago	Patrocinador ejecutivo	Subsecretario Zonal 2	rramirez@mtop.gob.ec	
VALENCIA CORRALES, RUBEN DARIO	Supervisor Financiero	SUPERVISOR FINANCIERO	rvalencia@mtop.gob.ec	062860951 ext. 23805
Valencia Delgado, Carlos Julio	supervisor de la obra	Analista de Infraestructura Distrital 1	cvalencia@mtop.gob.ec	

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
97546_1.jpg	04/01/2020
