

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 3
Dirección Provincial Chimborazo

PROYECTO: K033 MTOP - Estudios definitivos del nuevo puente vehicular sobre la quebrada Salsipuedes, cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo.

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto: | Miño Vizuete, Andrea Michelle (ammino@mtop.gob.ec) | | |
| Patrocinador Ejecutivo: | Gamboa López, Enma Katherine | Programas Relacionados: | |
| Titular: | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | Prioridad: | 0 |
| Tipo de Proyecto: | Infraestructura | Retorno Económico: | 0.00 |
| CUP: | 175200000.0000.380004 | TIR: | 0.00 % |
| Objetivos Operativos: | 3 | VAN: | 0.00 |
| Viabilidad Técnica: | Alta | Estimado Al Fin Del Proyecto: | 194,686.50 |
| Localidad de Gestión: | Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito | | |
| Tipo de Ppto. Externo: | | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 15/03/2018 - 31/12/2021 |
| Fecha de última actualización: | 01/04/2021 | Fecha de Fin Base: | 31/12/2019 |
| Modificado por: | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | Fecha del siguiente Hito: | 10/04/2021 |

DATOS GENERALES

| Descripción |
|--|
| <p>PRODUCTOS/SERVICIOS: Estudios para la construcción del nuevo puente ubicado sobre la quebrada Salsipuedes, tomamos las coordenadas del puente "Cornelio Dávalos" situado en la abscisa 34+560 de la carretera E-487 "Balbanera - Pallatanga - Bucay", a la altura del Cantón Pallatanga.</p> <p>LÍNEA BASE:El Puente Cornelio Dávalos construido hace más de 38 años, es una de las pocas obras de infraestructura que tiene el Ecuador de este estilo, tiene una altura de 60 metros sobre la Quebrada Salsipuedes, pertenecientes al Cantón Pallatanga. Actualmente presta un servicio al 50% de su capacidad, pues luego de la evaluación realizada en la reparación del año 2014, se determinó que su servicio es unidireccional implementado con un sistema semafórico y un sistema de seguridad para reducir el ancho del puente.</p> <p>Tomando en cuenta la gran importancia que significa para el desarrollo socio - económico y de integración Nacional, por cuanto se ubica en la arteria vial E-478 que integra las provincias de las Regiones Costa y Sierra, la utilización actual del puente genera riesgos en lo referente a seguridad vial y se convierte un cuello de botella al tránsito por la carretera, generando un incremento en los costos de operación y tiempo de recorrido.</p> <p>El colapso del puente Cornelio Dávalos generará pérdidas económicas, incremento de inseguridad vial y el aislamiento de los pueblos de las Regiones Costa y Sierra.</p> <p>OBJETIVO GENERAL: Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad, mediante la contratación de la consultoría a fin de contar con los "ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL NUEVO PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA SALSIPUEDES, CANTÓN PALLATANGA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO", validados y aprobados por el MTOP, que sirvan de base para la construcción del puente a ubicado en la abscisa 34+560 de la vía Pallatanga - Bucay.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Integrar la concepción técnica del proyecto con el ambiente y viceversa, a través del establecimiento de parámetros que permitan el análisis y evaluación del impacto ambiental, bajo los Lineamientos Generales establecidos por la Dirección de Gestión Ambiental Vial y la Legislación Ambiental Vigente. *Realizar los estudios necesarios para contar con toda la documentación (informes, planos, metodología de ejecución, personal mínimo, etc.) que posibilite la ejecución del proyecto. *Determinar el Presupuesto de inversión y su cronograma de ejecución. |
| Beneficios Cualitativos |
| <p>El puente será diseñado según la concepción estructural que sea sugerida por el Consultor de acuerdo a los objetivos planteados anteriormente, donde se presentará al menos 2 alternativas que serán analizadas para una de ellas ser aprobada por el MTOP, luego de lo cual se continuará con el diseño definitivo.</p> <p>Los requerimientos físicos generales aproximados para el diseño del nuevo puente son los siguientes:</p> <p>Longitud total aproximada:188 m.200 m. Ancho de calzada 8,50 m.La de la vía construida Veredas 1,00 m.La recomendación del consultor Ancho total10,50 m.En base a la sección de la vía</p> |

Beneficios Cualitativos

Superestructura: Tablero de H°A°Sugerida por el Consultor
 Infraestructura: Arco metálicoSugerida por el Consultor
 Capa de rodadura: FlexibleSugerida por el Consultor

Tipo de Beneficiario

De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) y a la información del VI Censo de Población y Vivienda, la población beneficiaria del proyecto en la zona de intervención corresponde a los habitantes de los Cantones: Colta, Cumandá, Pallatanga, Bucay (General Antonio Elizalde) que suman 80.079 habitantes, Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

POBLACIÓN POR AREA DE INFLUENCIA

| POBLACIÓN POR AREA DE INFLUENCIA | | | | | | |
|----------------------------------|------|---------|------|---------|------|-------|
| CANTONES | **** | MUJERES | **** | HOMBRES | **** | TOTAL |
| Colta | **** | 23329 | **** | 21642 | **** | 44971 |
| Cumandá | **** | 6579 | **** | 6343 | **** | 12922 |
| Pallatanga | **** | 5826 | **** | 5718 | **** | 11544 |
| Bucay | **** | 5273 | **** | 5369 | **** | 10642 |


Restricciones

Al finalizar cinco meses de la contratación de los estudios de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería definitivos para iniciar la construcción del Nuevo Puente sobre la Quebrada Salsipuedes, Provincia de Chimborazo, se contará con todos los trabajos que realice en cumplimiento de los términos de referencia definidos y aprobados por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que permita su ejecución conforme a los lineamientos institucionales y legales vigentes en el país.

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|
| Fase Actual: | Anteproyecto | Definición | Planeación | Ejecución | Cierre | Completado | Congelado | Cancelado |
|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 80.33 %
 Fecha de Inicio: 15/03/2018 Fecha de Fin: 31/12/2021

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



| Porcentaje de Avance | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 2021 | Avance programado acumulado | | | | | | | | | | | |
| | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Avance real acumulado | | | | | | | | | | | |
| | Estado | | | | | | | | | | | |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| MARZO 2021: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, con Acta de Entrega Recepción Única, Pendiente liquidación económica. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 01/04/2021 - 10:59 AM |
| FEBRERO 2021: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, con Acta de Entrega Recepción Única | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/03/2021 - 10:17 PM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| ENERO 2021: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, actualmente Aprobados | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 02/02/2021 - 02:25 PM |
| DICIEMBRE 2020: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, actualmente en trámite de aprobación. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/01/2021 - 01:18 PM |
| NOVIEMBRE 2020: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, actualmente en trámite de aprobación. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/12/2020 - 09:43 AM |
| OCTUBRE 2020: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, actualmente en trámite de aprobación. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/11/2020 - 09:55 PM |
| SEPTIEMBRE 2020: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, actualmente en trámite de aprobación. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 01/10/2020 - 10:42 PM |
| AGOSTO 2020: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, actualmente en trámite de aprobación. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 02/09/2020 - 08:24 PM |
| JULIO 2020: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, actualmente en trámite de aprobación. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/08/2020 - 08:46 PM |
| JUNIO 2020: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, actualmente en trámite de aprobación. | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 02/07/2020 - 09:03 PM |
| MAYO 2020: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, actualmente en trámite de aprobación. | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 04/06/2020 - 12:22 AM |
| ABRIL 2020: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, actualmente en trámite de aprobación. | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 04/05/2020 - 01:06 PM |
| MARZO 2020: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, actualmente en trámite de aprobación. | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 02/04/2020 - 01:18 PM |
| FEBRERO 2020: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, actualmente en trámite de aprobación. | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 04/03/2020 - 02:51 PM |
| ENERO 2020: Los estudios se encuentran ejecutados al 100%, actualmente en trámite de aprobación. | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 05/02/2020 - 11:28 AM |
| DICIEMBRE 2019: 1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019, mientras se gestiona su inclusión. | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 03/01/2020 - 10:52 AM |
| NOVIEMBRE 2019: 1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019, mientras se gestiona su inclusión. | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 04/12/2019 - 11:54 AM |
| OCTUBRE 2019: 1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019, mientras se gestiona su inclusión. | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 05/11/2019 - 11:38 AM |
| SEPTIEMBRE 2019: 1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019, mientras se gestiona su inclusión. | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 03/10/2019 - 12:13 PM |
| AGOSTO 2019: 1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019, mientras se gestiona su inclusión. | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 04/09/2019 - 03:46 PM |
| JULIO 2019: 1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019, mientras se gestiona su inclusión. | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 05/08/2019 - 12:35 PM |
| JUNIO 2019: | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 04/07/2019 - 10:58 AM |

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

| Resúmenes Ejecutivos | Modificado por | Fecha de última actualización |
|--|--|-------------------------------|
| 1. Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019, mientras se gestiona su inclusión. | | |
| MAYO 2019: Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019, mientras se gestiona su inclusión. | Ponce Sigchay, Felix Ramiro | 03/06/2019 - 02:54 PM |
| ABRIL 2019: Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019, mientras se gestiona su inclusión. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 02/05/2019 - 12:05 PM |
| MARZO 2019: Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019, mientras se gestiona su inclusión. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/04/2019 - 11:23 AM |
| FEBRERO 2019: Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019, mientras se gestiona su inclusión. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/04/2019 - 11:22 AM |
| ENERO 2019: Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2019-0082-ME, suscrito por la Subsecretaria Regional 3, se autoriza el cambio a fase congelado, por no haber sido contemplado en el PAI 2019, mientras se gestiona su inclusión. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/02/2019 - 09:51 AM |
| DICIEMBRE 2018 Contrato adjudicado | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/01/2019 - 10:17 AM |
| NOVIEMBRE 2018 Se eleva el proceso al portal de compras públicas. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/12/2018 - 09:48 AM |
| OCTUBRE 2018 Se eleva el proceso al portal de compras públicas. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/11/2018 - 11:56 AM |
| SEPTIEMBRE 2018 Se eleva el proceso al portal de compras públicas. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/10/2018 - 04:59 PM |
| AGOSTO 2018 Se solicitó certificación presupuestaria | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 03/09/2018 - 05:21 PM |
| JULIO 2018 Se solicitó certificación presupuestaria | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 02/08/2018 - 11:20 AM |
| JUNIO 2018 Términos de referencia Aprobados | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 04/07/2018 - 11:51 AM |
| MAYO 2018 Términos de referencia elaborados | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/06/2018 - 04:24 PM |
| ABRIL 2018 Términos de referencia elaborados | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 02/05/2018 - 12:00 PM |
| MARZO 2018 En trámite elaboración de términos de referencia. | Santillan Morocho, Ingrid Pamela | 05/04/2018 - 06:02 PM |

Problemas cerrados: 2, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

| Riesgo | Fecha de última actualización | Responsable | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|-------------------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 5- PROYECTO. * General. La demora en aprobación definitiva de los estudios CAUSARÍA un retraso en la contratación de la construcción del puente | 09/12/2020 | Andrea Michelle Miño Vizúete | 10 % | 10 | 1 | 0/1 |

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

| Localidad de Impacto | |
|----------------------|---|
| 1 | Zona 3 - Centro > Chimborazo > Pallatanga |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|--|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | PLANEACIÓN: Términos de referencia. Elaborado | 1-Solicitud de Información | 31/03/2018 | | 30/04/2018 | | Sí | 5.0 |
| 2 | PLANEACIÓN: Términos de referencia. Aprobado | 2-Publicación de Pliegos | 15/04/2018 | | 15/05/2018 | | Sí | 5.0 |
| 3 | PLANEACIÓN: Contrato. Adjudicado | 3-Adjudicación | 15/05/2018 | | 12/12/2018 | | Sí | 5.0 |
| 4 | PLANEACIÓN: Anticipo. Solicitado | 4-Inicio de Trabajo | 25/05/2018 | | 15/12/2018 | | Sí | 5.0 |
| 5 | EJECUCIÓN: Inicio de trabajos. Anticipo entregado | 4-Inicio de Trabajo | 05/06/2018 | | 30/12/2018 | | Sí | 8.0 |
| 6 | EJECUCIÓN: Cronograma de trabajos. Aprobado | 5-Entregables Intermedios | 20/06/2018 | | 12/01/2019 | | Sí | 6.0 |
| 7 | EJECUCIÓN: Informes geotécnicos planilla 1. Aprobado | 5-Entregables Intermedios | 31/07/2018 | | 31/01/2020 | | Sí | 6.0 |
| 8 | EJECUCIÓN: Informes de diseño estructural planilla 2. Aprobado | 5-Entregables Intermedios | 31/08/2018 | | 31/01/2020 | | Sí | 6.0 |
| 9 | EJECUCIÓN: Informes de drenaje planilla 3. Aprobado | 5-Entregables Intermedios | 30/09/2018 | | 31/01/2020 | | Sí | 5.0 |
| 10 | EJECUCIÓN: Informes de diseño de accesos y Plan de Manejo Ambiental planilla 4. Aprobado | 5-Entregables Intermedios | 31/10/2018 | | 31/03/2020 | | Sí | 5.0 |
| 11 | EJECUCIÓN: Informes de diseño definitivos. Entregado | 5-Entregables Intermedios | 15/11/2018 | | 15/02/2020 | | Sí | 5.0 |
| 12 | EJECUCIÓN: Primera revisión. Entregada | 5-Entregables Intermedios | 15/12/2018 | | 31/05/2019 | | Sí | 10.0 |
| 13 | EJECUCIÓN: Segunda revisión. Observaciones corregido | 5-Entregables Intermedios | 21/01/2019 | | 28/12/2019 | | Sí | 10.0 |
| 14 | EJECUCIÓN: Entrega de estudio definitivo. Aprobado | 5-Entregables Intermedios | 20/02/2019 | | 15/06/2020 | | Sí | 10.0 |
| 15 | CIERRE: Informes de fiscalización aprobados | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 29/03/2019 | | 25/06/2020 | | Sí | 1.0 |
| 16 | CIERRE: Liquidación Económica aprobada | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 29/04/2019 | | 30/06/2020 | | Sí | 1.0 |

HITOS

| | Hito | Categoría | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|----|---|--|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 17 | CIERRE: Acta entrega recepción Provisional (aplica para obras) ó Acta entrega recepción única (aplica para estudios) | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 30/06/2019 | | 15/12/2020 | | Sí | 1.0 |
| 18 | CIERRE: Formatos de cierre/baja según acuerdo 025, elaborados | 9-Entregables Formales | 10/07/2019 | 10/04/2021 | | | No | 2.0 |
| 19 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita | 9-Entregables Formales | 14/07/2019 | 14/04/2021 | | | No | 0.5 |
| 20 | CIERRE: Certificación de la Coordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago, suscrito | 9-Entregables Formales | 15/07/2019 | 15/04/2021 | | | No | 0.5 |
| 21 | CIERRE: Información del proyecto en los sistemas GPR, SIPeIP y SITOP actualizada | 9-Entregables Formales | 25/08/2019 | 25/05/2021 | | | No | 0.5 |
| 22 | CIERRE: Documentos habilitantes para cierre/baja conforme Instructivo de Cierre/Baja, entregados a la Coordinación General de Planificación | 9-Entregables Formales | 31/08/2019 | 31/05/2021 | | | No | 0.5 |
| 23 | CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF | 9-Entregables Formales | 15/09/2019 | 15/06/2021 | | | No | 1.0 |
| 24 | CIERRE: Aprobación del Ministro de Obras Públicas, suscrita | 9-Entregables Formales | 25/09/2019 | 25/06/2021 | | | No | 0.25 |
| 25 | CIERRE: Solicitud a Senplades para registro de cierre/baja, suscrita | 9-Entregables Formales | 26/09/2019 | 26/06/2021 | | | No | 0.25 |
| 26 | CIERRE: Informe de Cierre de Proyectos (Senplades) aprobado | 9-Entregables Formales | 30/09/2019 | 30/06/2021 | | | No | 0.5 |

INDICADORES DEL PROYECTO

| Indicador | Estado | Avance al Período | Meta | Resultado del Período | Fecha de Inicio | Último Período Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible | | | | | | |


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Anticipo Desembolsado: | 0.00 |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 194,686.50 ** |
| Costo Total: | 203,784.00 |
| Total Devengado: | 183,405.60 |
| % Costo Total Devengado: | 90.00 % |

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 90.00 %

Perfil Económico 2021

| | Años Previos | Año Actual (2021) | Años Futuros | Total |
|---|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Ppto. Planeado | 183,405.76 | 11,280.90 | 0.00 | 194,686.66 |
| Ppto. Externo Planeado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ppto. Aprobado Inicial | 101,892.00 | 203,784.00 | 0.00 | 305,676.00 |
| Ppto. Codificado | 407,568.00 | 11,280.90 | 0.00 | 418,848.90 |
| Ppto. Comprometido | 274,380.60 | 0.00 | 0.00 | 274,380.60 |
| Planeado - Codificado (2021) | | 0.00 | | |
| Programado a Devengar | 407,568.00 | 11,280.90 | 0.00 | 418,848.90 |
| Ppto. Devengado | 183,405.60 | 0.00 | 0.00 | 183,405.60 |
| Pagado Real | 183,405.60 | 0.00 | 0.00 | 183,405.60 |
| Estimado a fin de año | * 183,405.60 | 0.00 | 0.00 | 183,405.60 |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 224,162.40 | 11,280.90 | 0.00 | 235,443.30 |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado | * 45.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 43.79 % |
| Ppto. Codificado 998 | 90,975.00 | 0.00 | 0.00 | 90,975.00 |
| Ppto. Devengado 998 | 81,877.50 | 0.00 | 0.00 | 81,877.50 |

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

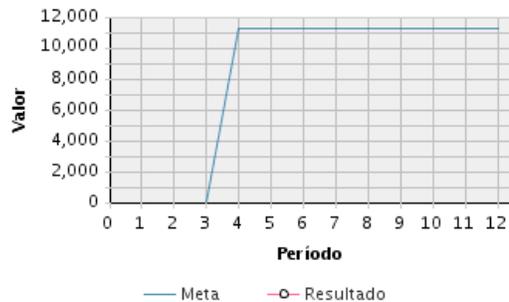

Presupuesto Mensual 2021

| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
|-----|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Ene | 0.00 | | 0.00 | | | | |

| Presupuesto Mensual 2021 | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|--------|--------------|
| Mes | Prog. a Devengar (Mensual) | Devengado (Mensual) | Prog. a Devengar (Acumulado) | Devengado (Acumulado) | Avance Acumulado | Estado | Avance Anual |
| Feb | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Mar | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| Abr | 11,280.90 | | 11,280.90 | | | | |
| May | 0.00 | | 11,280.90 | | | | |
| Jun | 0.00 | | 11,280.90 | | | | |
| Jul | 0.00 | | 11,280.90 | | | | |
| Ago | 0.00 | | 11,280.90 | | | | |
| Sep | 0.00 | | 11,280.90 | | | | |
| Oct | 0.00 | | 11,280.90 | | | | |
| Nov | 0.00 | | 11,280.90 | | | | |
| Dic | 0.00 | | 11,280.90 | | | | |
| Total | 11,280.90 | | | | | | |

OBJETIVOS ALINEADOS

| Objetivos Operativos | |
|----------------------|---|
| 16 | Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada. |
| 17 | Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, estudios de ingeniería de puntos críticos. |
| 19 | Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente. |

ARCHIVOS DEL PROYECTO

| | Descripción de Archivo | Archivo | Fecha de Alta |
|----|--|--|---------------|
| 1 | ASOCIACIÓN HITO 1. Términos de Referencia | 2015-04-13_08-48-49_TDRNUEVOPUENTESALSIPUEDES | 05/07/2018 |
| 2 | ASOCIACIÓN HITO 10. Informe de diseño de accesos aprobado | MTOP-SUBZ3-2020-0187-ME_accesos.pdf | 26/04/2020 |
| 3 | ASOCIACIÓN HITO 10. Informe de impacto ambiental aprobado | MTOP-SUBZ3-2020-0177-ME_impacto_ambiental.pdf | 26/04/2020 |
| 4 | ASOCIACIÓN HITO 11. Informe de diseño definitivo | MTOP-SUBZ3-2020-0186-ME_ingeniería.pdf | 26/04/2020 |
| 5 | ASOCIACIÓN HITO 17.- ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA | ACTA_ENTREGA_DEFINITIVA_ESTUDIOS_SALSIPUEDES | 02/02/2021 |
| 6 | ASOCIACIÓN HITO 2. Dictamen de prioridad | 2017-08-28_09-38-20_SENPLADES-SZ3C-2015-0232-OF.pdf | 05/07/2018 |
| 7 | ASOCIACIÓN HITO 2. Términos de Referencia Aprobados. | 2015-09-17_02-59-27_SENPLADES-SZ3C-2015-0232-OF(1).pdf | 05/07/2018 |
| 8 | ASOCIACIÓN HITO 3. Contrato Original | Contrato_Estudios_Puente.pdf | 25/04/2020 |
| 9 | ASOCIACIÓN HITO 4 Y 5. Notificación de inicio | MTOP-DDCH-19-58-OF_notificación_inicio.pdf | 26/04/2020 |
| 10 | ASOCIACIÓN HITO 6. Cronograma aprobado | MTOP-DDCH-19-60-OF_Cronograma.pdf | 26/04/2020 |
| 11 | ASOCIACIÓN HITO 7. Informe Geotécnico aprobado | mtop-subz1-2019-1243-me_conformidad_geotecnia.pdf | 26/04/2020 |
| 12 | ASOCIACIÓN HITO 8. Informe Estructural aprobado | MTOP-SUBZ3-2020-0191-ME_estructural.pdf | 26/04/2020 |
| 13 | ASOCIACIÓN HITO 9. Informe de drenaje aprobado | MTOP-SUBZ3-2020-0190-ME_drenaje.pdf | 26/04/2020 |
| 14 | Solicitud y Aprobación congelamiento y apertura fichas de proyectos PAC 2019 | Autorización_congelamiento_y_apertura_fichas.pdf | 24/01/2019 |

EQUIPO DEL PROYECTO

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|-----------------------|---------------|--|---------------------|-------------|
| Armijo Logroño, Ángel | Lider Técnico | Director Nacional de Conservación de la Infraestructura del Transporte | aarmijo@mtop.gob.ec | 023974600 |

| Nombre | Rol | Puesto | Correo Electrónico | Teléfono(s) |
|------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|-------------|
| Gamboa López, Enma Katherine | Subsecretario Regional 3 | Subsecretaria Zonal 3, Encargada | egamboa@mtop.gob.ec | 023974600 |
| Ponce Sigchay, Felix Ramiro | Director Distrital de Chimborazo | Director Distrital de Transporte y Obras Publicas del Chimborazo | fponce@mtop.gob.ec | |
