

**MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas**  
**Subsecretaría Zona 7**  
**Dirección Provincial El Oro**

**PROYECTO: K024 MTOP - Reconstrucción de la carretera Buenavista - Vega Rivera - Paccha - Zaruma.**

Líder del Proyecto:	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles (rvite@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Programas Relacionados:	Provincia - El Oro, RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BUENAVISTA - VEGA RIVERA - PACCHA - ZARUMA, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	175200000.0000.372416	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	76,422,998.70
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro		
Tipo de Ppto. Externo:	Economía mixta	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/09/2011 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	05/10/2018	Fecha de Fin Base:	15/06/2017
Modificado por:	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2018


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
<p>MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: \$ 61'032.766,50 USD dólares  CONTRATISTA: Consorcio C.C.E.C.C ( conformado por la Compañía Pública CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION y la compañía VERDU SA)  PLAZO: 24 meses  PRODUCTO: Esta vía pertenece al eje vial E 585, en el tramo comprendido entre Buenavista y Zaruma, requiere ser rehabilitada y su trazado corregido puntualmente en ciertos sectores; contempla el reemplazo varios puentes existentes; al finalizar el proyecto se contará con una vía que responda a las características geométricas acordes con su topografía, debidamente señalizada, que brinde confort, seguridad y un adecuado nivel de servicio para sus usuarios  LINEA BASE : Esta vía contribuye a la transitabilidad oportuna de bienes y servicios de la parte baja (costa) y alta (altiplano)de la provincia de El Oro, por su posición geográfica constituye una vía de evacuación de emergencia ante todo tipo de eventos sean naturales o los que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. Además permitirá la revalorización de los predios circundantes, y aportará al desarrollo productivo y turístico de la región  OBJETIVO GENERAL: Rectificación y mejoramiento de la carretera Buena Vista - Vega Rivera - Paccha - Zaruma.  OBJETIVO ESPECIFICO: Al final del proyecto se contará con una vía segura, confortable, que responda a las características geométricas acordes con su topografía, debidamente señalizada, con un adecuado nivel de servicio para sus usuarios, acorde con las normas y especificaciones del MTOP</p>
<b>Beneficios Cualitativos</b>
<p>Esta vía pertenece al eje vial E 585, permitirá la transitabilidad oportuna y segura de bienes y servicios logrando comodidad y seguridad de los usuarios y la consecuente revalorización de los predios de las zonas de influencia, mejorando la accesibilidad hacia las áreas productivas, turismo y comercial.</p>
<b>Tipo de Beneficiario</b>
<p>Agricultores, ganaderos, comercio, turismo internacional.  Area de influencia: El Oro, Cantones: Pasaje, Atahualpa, Piñas, Porotvelo, Zaruma</p>
<b>Restricciones</b>
<p>Asignación oportuna de recursos.</p>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	<b>Cierre</b>	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 97.87 %  
 Fecha de Inicio: 01/09/2011 Fecha de Fin: 31/12/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**

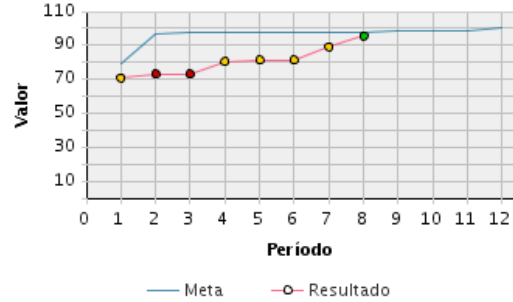

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											
	79 %	97 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	99 %	99 %	99 %	100 %
	Avance real acumulado											
	71 %	73 %	73 %	81 %	82 %	82 %	89 %	96 %				
Estado												
	▼	⊗	⊗	▼	▼	▼	▼	●				

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
SEPTIEMBRE 2018.- Con fecha 03 de Agosto se culmina el plazo y trabajos del proyeto. Con fecha 23 de Agosto se realizó el recorrido y suscripción del Acta de Recepción Provicional Parcial de la Obra, por el motivo de que este proyecto se encuentra dentro de un macro contrato en tres diferentes provincias del país, una vez realizada la Recepción Provicional Parcial en el proyecto dentro de la provincia del Azuay; se realizará la Recepción Provicional del contrato, hasta el momento se ha venido realizando los rubros que forman parte del mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, limpieza de alcantarillas, limpieza de señalizacion vertical, etc).	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	04/10/2018 - 08:57 AM
AGOSTO 2018.- Con fecha 03 de Agosto se culmina el plazo y trabajos del proyeto, lo cual fiscalización indica que es procedente realizar la Recepción Provicional de la Obra. Con Memorando: Nro. MTOP-SIT-2018-435-ME de fecha 22 de Agosto del 2018 se dispone la Comisión para la Recepción Provicional de la Obra. Con fecha 23 de Agosto se realizó el recorrido y suscripción del Acta de Recepción Provicional Parcial de la Obra, por el motivo de que este proyecto se encuentra dentro de un macro contrato en tres diferentes provincias del país, una vez realizada la Recepción Provicional Parcial en el proyecto dentro de la provincia del Azuay; se realizará la Recepción Provicional del contrato..	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	05/09/2018 - 10:28 AM
JULIO 2018: CON FECHA 30 DE JULIO DEL 2018 CON MEMORANDO NO. MTOP-DDDO-2018-2649-ME, SUSCRITO POR EL ING. GABRIEL SANCHEZ YOZA DIRECTOR DISTRITAL SE LEVANTA LA SUSPENSION	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	03/08/2018 - 10:28 AM
ABRIL 2018: CUNETAS KM 77 A 80, SEÑALIZACION HORIZONTAL, MURO ARCAPAMBA 72+020 Y SEÑALIZACION INFORMATIVA; CON FECHA 25 DE ABRIL DEL 2018 SE SUSPENDEN LOS TRABAJOS TOTALMENTE POR FALTA DE PAGO DEL MINISTERIO DE FINANZAS	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	04/05/2018 - 09:56 AM
MARZO.- PINTURA DEL KM 0+340 A 79+700, DELINEADORES KM 25+500 A 51+500, CUNETAS DIFERENTES ABCISAS Y ASFALTO 5CM Y BASE KM 21+200 ACCESO PLAYAS DAUYCAY	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	05/04/2018 - 07:56 AM
FEBRERO.- OBRAS DE ARTE MENOR (CUNETAS) EN PARROQUIA PACCHA, LANZADO DE VIGAS Y FIGURADO DE HIERRO EN EL PUENTE ARCAPAMBA, FUNDICION DE ACERAS, PILARETES Y LOSA DE APROXIMACION DEL PUENTE ABS 38+660, ABS 25+300 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE Y ENCAUZAMINETO, MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS SITIOS DISPUESTOS POR FISCALIZACION, SEÑALIZACION HORIZONTAL Y LIMPIEZA DE DERRUMBES.	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	02/03/2018 - 08:26 AM
ENERO 2018.- FUNDICION DE LOSA INFERIOR, VIGAS Y DIAFRAGMAS EN EL PUENTE DE LA ABS 38+660, ARMADO DE ACERO ESTRUCTURAL EN ESTRIBO IZQUIERDO DEL PUENTE ARCAPAMBA, FUNDICION DE CUNETAS Y BORDILLOS, CONSTRUCCIONES	Vite Quezada, Robespierre	06/02/2018 - 08:27 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DE MUROS ARMADOS, CABEZALES Y MUROS DE ALA A LO LARGO DEL PROYECTO, CARPETA ASFALTICA EN ACCESOS, LIMPEZA DE DERRUMBES, MONITOREOS DE RUIDO-POLVO-AGUA.	Roberto Aristoteles	
DICIEMBRE 2017: -Limpieza de derrumbes. -Cunetas km 73+200 a 76+230 -Muros y hormigón armado y cabezales (varias abscisas) -Fundición de losa en puente El Salado -Hincado de Pilotes en Puente Arcapamba -Apertura al tráfico en puente Buenavista	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	04/01/2018 - 08:00 AM
NOVIEMBRE 2017: KM 18+500 A 19+020 COLOCACION DE GEOTEXTIL , BASE, SUB BASE Y CARPETA ASFALTICA. KM 27+360 A 27+720 COLOCACION DE GEOTEXTIL , BASE, SUB BASE Y CARPETA ASFALTICA. KM 63+870 A 64+290 CUNETAS 0+000 A 0+370, 18+500, 63+000, 75+300 FUNDICION DE LOSA PUENTE BUENAVISTA HORMIGON DE ZAPATAS Y PANTALLAS PUENTE 38+660  HORMIGON DE ZAPATAS Y PANTALLAS PUENTE EL SALADO  ALCANTARILLADO HUERTAS Y PACCHA	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	05/12/2017 - 04:42 PM
Octubre 2017: Explotación de agregados para base y subbase en las abscisas 44+500. En lo que se realizo esta semana fueron las siguientes actividades: Puentes se realizaron: en el puente sobre río Buenavista relleno y compactado de enfoque en estribo derecho, lanzamiento de viga central; pte Dumari TERMINADO; en lo que es pte. 18+060 TERMINADO; en el pte Chilola TERMINADO; pte. 38+360 suspensión de trabajos por rediseño (PARALIZACION); pte El Palto TERMINADO; pte El Salado soldadura de vigas y armado de losa de aproximación; pte Arcapamba excavación para armado de estribos. Colocación de base accesos parroquias y sitios; colocación de carpeta asfáltica km 4-3 (se realizan ensayos de micro y macro textura de carpeta asfáltica); se continua con obras de arte menor (alcantarillas y cunetas). El día jueves 20 de abril se produjo un deslizamiento de gran magnitud el cual cerró y provoco un dique en el río en la abs 18+700 a través de esta fiscalización se ha dispuesto realizar trabajos emergentes y consolidar un paso provisional ya que estos trabajos se evalúa que aproximadamente se tenga que mover 750.000 metros cúbicos y realizar terrazas en el sector se realizan trabajos nocturnos.	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	06/11/2017 - 08:51 AM
Septiembre 2017: Se encuentran realizando trabajos de explotación agregados para base y subbase, colocación geotextil, base y sub-base; y carpeta asfáltica; se continua con obras de arte menor (alcantarillas y cunetas). El día jueves 20 de abril se produjo un deslizamiento de gran magnitud el cual cerró y provoco un dique en el río en la abs 18+700, se ha dispuesto consolidar un paso provisional y realizar terrazas en el sector. En lo que respecta a los puentes se realizó lo siguiente: Puente sobre Río Buenavista: hormigonado de parapeto estribo derecha y relleno y compactado de enfoque en estribo izquierdo, además se construye obra falsa para lanzamiento de vigas; Puente Dumari: terminado; Puente 18+060: terminado; Puente: Chilola: terminado; Puente: 38+360: suspensión de trabajos por rediseño (PARALIZACION); Puente: Palto: terminado; Puente El Salado:armado de hierro pantalla izquierda y mejoramiento del área estribo derecho; pte Arcapamba armado de obra falsa.	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	04/10/2017 - 08:03 AM
Agosto 2017: Explotación de agregados para base y subbase en las abscisas 44+500. : en el puente sobre río Buenavista hincado de pilotes estribo derecho y armado de camisas, estribo derecho hormigonado de tercer nivel; pte Dumari TERMINADO; en lo que es pte. 18+060 TERMINADO; en el pte Chilola se construye losa y viga de impacto; pte. 38+360 suspensión de trabajos por rediseño (PARALIZACION); pte El Palto TERMINADO; pte El Salado replanteo de estribo izq y derecho; pte Arcapamba armado de obra falsa. Colocación de geotextil y subbase km 56; colocación de base km 55-75 y colocación de carpeta asfáltica km 17-54-78; se continua con obras de arte menor (alcantarillas y cunetas). El día jueves 20 de abril se produjo un deslizamiento de gran magnitud el cual cerró y provoco un dique en el río en la abs 18+700 a través de esta fiscalización se ha dispuesto realizar trabajos emergentes y consolidar un paso provisional ya que estos trabajos se evalúa que aproximadamente se tenga que mover 750.000 metros cúbicos y realizar terrazas en el sector se realizan trabajos nocturnos.	Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	05/09/2017 - 04:50 PM
Julio 2017: Se encuentran realizando trabajos de explotación de agregados para base y subbase, colocación geotextil, base y sub-base; y carpeta asfáltica; se continua con obras de arte menor (alcantarillas y cunetas). El día jueves 20 de abril se produjo un deslizamiento de gran magnitud el cual cerró y provoco un dique en el río en la abs 18+700, se ha dispuesto consolidar un paso provisional y realizar terrazas en el sector. En lo que respecta a los puentes se realizó lo siguiente: Puente sobre Río Buenavista: hincado de pilotes y armado de camisas; Puente Dumari: terminado; Puente 18+060: terminado; Puente:	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	04/08/2017 - 06:01 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Chilola: se construye losa y viga de impacto; Puente: 38+360: cierre de trabajos por continuos deslizamientos en la zona (PARALIZACION); Puente: Palto: losa y viga de impacto; Puente Arcapamba: excavación para estribo izquierdo.		
Junio 2017: Se encuentran realizando trabajos de explotación de agregados para base y subbase, excavación de suelo, colocación de subdren, conformación de terrazas, colocación de material de préstamo importado, geotextil, sub-base, base, fundición de cunetas, se construyen cabezales y muros de alas, y limpieza de derrumbes buenavista-paccha-zaruma; y en lo que respecta a puentes se realizo: Puente Buenavista soldadura en camisas para pilotes, Puente 18+060 obras de protección, losa y viga de impacto; Puente Chilola hormigonado de losa; y puente 38+360 cierre de trabajos por continuos deslizamientos en la zona (PARALIZACION), Puente El Palto figurado de hierro para losa. Las continuas lluvias han provocado el cierre de algunos frentes de trabajo entre vega rivera km 15 hasta zaruma km 80, colocación de asfalto.	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	04/08/2017 - 06:01 AM
Mayo 2017: Se encuentran realizando trabajos de explotación de agregados para base y subbase, excavación de suelo, colocación de subdren, conformación de terrazas, colocación de material de préstamo importado, geotextil, sub-base, base, fundición de cunetas, se construyen cabezales y muros de alas, y limpieza de derrumbes buenavista-paccha-zaruma; y en lo que respecta a puentes se realizo: Puente Buenavista soldadura en camisas para pilotes, Puente 18+060 obras de protección, losa y viga de impacto; Puente Chilola hormigonado de losa; y puente 38+360 cierre de trabajos por continuos deslizamientos en la zona (PARALIZACION), Puente El Palto figurado de hierro para losa. Las continuas lluvias han provocado el cierre de algunos frentes de trabajo entre vega rivera km 15 hasta zaruma km 80, colocación de asfalto.	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	05/06/2017 - 05:38 PM
Abril 2017: Se encuentran realizando trabajos de explotación de agregados para base y subbase, excavación de suelo, colocación de subdren, conformación de terrazas, colocación de material de préstamo importado, geotextil, sub-base, base, fundición de cunetas, se construyen cabezales y muros de alas, y limpieza de derrumbes buenavista-paccha-zaruma; y en lo que respecta a puentes se realizo: Puente Buenavista derrocamiento de vigas y pantallas, y soldadura de camisas para pilotes, Puente 18+060 construcción de obras de protección; Puente Chilola soldadura de vigas y armado de losa; y puente 38+360 cierre de trabajos por continuos deslizamientos en la zona (PARALIZACION), Puente El Palto hormigonado de zapatas y pantallas izquierda y derecha. Las continuas lluvias han provocado el cierre de algunos frentes de trabajo entre vega rivera km 15 hasta zaruma km 80, colocación de asfalto km 55+000, 56+000 y 57+000.	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	03/05/2017 - 11:21 PM
Marzo 2017: Se encuentran realizando trabajos de explotación de agregados para base y subbase, excavación de suelo, colocación de subdren, conformación de terrazas, colocación de material de préstamo importado, geotextil, sub-base, base, fundición de cunetas, se construyen cabezales y muros de alas, y limpieza de derrumbes buenavista-paccha; y en lo que respecta a puentes se realizo: Puente Buenavista derrocamiento de vigas y pantallas, Puente 18+060 construcción de obras de protección; Puente Chilola soldadura de vigas y puente 38+360 cierre de trabajos por continuos deslizamientos en la zona (PARALIZACION), Puente El Palto armado de hierro de zapatas izquierda y derecha. Las continuas lluvias han provocado el cierre de algunos frentes de trabajo entre vega rivera km 15 hasta zaruma km 80	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	04/04/2017 - 09:01 AM
Febrero 2017: Explotación de agregados para base y subbase, conformación de terrazas, excavación en suelo. Se realiza control de polvo y limpieza de derrumbes, producción de subbase y base, colocación de material de préstamo importado, colocación de geotextil; en lo que respecta a puentes se realizo; en lo que es pte. 18+060 figurado de hierro para losa; en el pte Chilola figurado de hierro y pte. 38+360 armado de hierro para zapatas.	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	03/03/2017 - 04:15 PM
Enero 2017: Explotación de agregados para base y subbase, conformación de terrazas, excavación en suelo. Se realiza control de polvo y limpieza de derrumbes, producción de subbase y base, subdren, colocación de material de préstamo importado, colocación de geotextil; en lo que respecta a puentes se realizo; en lo que es pte. 18+060 figurado de hierro para losa; en el pte Chilola figurado de hierro y pte. 38+360 armado de hierro para zapatas. Se firmado contrato complementario No. 2 por aumento y disminución de cantidades con fecha el 04 de mayo del 2016, se aprueba reprogramación.	Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	03/02/2017 - 04:22 PM
Diciembre 2016: Explotación de agregados para base y subbase en las abscisas 26+800, 44+500 y 63+500. conformación de terrazas el avance es de 95%. Se realiza control de polvo y limpieza de derrumbes en lo que respecta a puentes se realizo; en lo que es pte. 18+060 figurado de hierro para losa; en el pte Chilola hormigonado de zapata derecha y pte. 38+360 armado de hierro. Se firmado contrato complementario No. 2 por aumento y disminución de cantidades con fecha el 04 de mayo del 2016, se aprueba reprogramación.	Bazurto Orellana, Pedro	04/01/2017 - 10:15 AM
Noviembre 2016: Se realizaron los siguiente trabajos: TRAMO 1 Desbroce, desbosque y limpieza, Excavación en suelo; Acabado de Obra Básica; Colocación de Préstamo Importado, Base Clase I, Sub-Base Clase III; Geotextil; Carpeta Asfáltica; Construcción de Obras de Arte y Cunetas y Bordillos; Escombrera.	Bazurto Orellana, Pedro	05/12/2016 - 11:58 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>TRAMO 2 Excavación en suelo; Acabado de Obra Básica; Colocación de Préstamo Importado, Base Clase I, Sub-Base Clase III, Geotextil; Carpeta Asfáltica e=10 cm; Construcción de Cunetas, Bordillos y Obras de Arte; Escombrera.</p>		
<p>Octubre 2016: Se realizaron los siguiente trabajos Desbroce, desbosque y limpieza (ha.); Remoción de tuberías; Remoción hor. cem. portland (inc. desalojo); Excavación en suelo, fango, marginal y desalojo de material; Colocación de material préstamo local, importado y transporte; Acabado de la obra básica existente; Colocación de base, sub-base clase 3 y transporte; Geotextil 1600 nt; Carpeta asfáltica espesor 10 cm; Subdrenes; Tuberías de hormigón armado; Hormigón cabezales y muros de alas; Cinta plástica; Sum. e inst. conos demarcadores para trabajo de vía (h=0,71m); Escombrera disposición final y tratamiento paisajístico en zonas de depósito; Comunicados radiales; Charlas de adiestramiento; Agua para control del polvo; Sondajes exploratorios en Puentes.</p>	<p>Bazurto Orellana, Pedro</p>	<p>08/11/2016 - 09:31 AM</p>
<p>Septiembre 2016: Se realizaron los siguiente trabajos Desbroce, desbosque y limpieza (ha.); Remoción de tuberías; Remoción hor. cem. portland (inc. desalojo); Excavación en suelo, fango, marginal y desalojo de material; Colocación de material préstamo local y transporte; Acabado de la obra básica existente; Colocación de base, sub-base clase 3 y transporte; Geotextil 1600 nt; Carpeta asfáltica espesor 10 cm; Subdrenes; Tuberías de hormigón armado; Hormigón cabezales y muros de alas; Cinta plástica; Sum. e inst. conos demarcadores para trabajo de vía (h=0,71m); Cinta reflectiva; Escombrera disposición final y tratamiento paisajístico en zonas de depósito; Comunicados radiales; Charlas de adiestramiento; Agua para control del polvo; Sondajes exploratorios en Puentes.</p>	<p>Bazurto Orellana, Pedro</p>	<p>05/10/2016 - 08:06 AM</p>
<p>AGOSTO 2016: En el presente mes se realizaron los siguientes trabajos: Desbroce, desbosque y limpieza (ha.); Remoción de tuberías; Remoción hor. cem. portland (inc. desalojo); Excavación en suelo, fango, marginal, en roca y desalojo de material; Acabado de la obra básica existente; Colocación de material de préstamo importado, base, sub-base clase; Transporte de material de préstamo importado, base y sub base; Colocación de geotextil; Colocación de carpeta asfáltica espesor 10 cm; Subdrenes; Tuberías de hormigón armado; Hormigón cabezales y muros de alas; Cinta plástica; Escombrera disposición final y tratamiento paisajístico en zonas de depósito; Comunicados radiales; Charlas de adiestramiento; Agua para control del polvo; Sondaje de puentes.</p>	<p>Bazurto Orellana, Pedro</p>	<p>02/09/2016 - 05:02 PM</p>
<p>JULIO 2016: En el presente mes se realizaron los siguientes trabajos: Desbroce, desbosque y limpieza; Remoción de hormigón (inc. desalojo); Excavación en suelo, fango, marginal, roca y desalojo de material; Acabado de la obra básica existente; Material de préstamo importado; Transporte de material de préstamo importado; Colocación de base, sub-base clase 3 y transporte; Colocación de geotextil 1600 nt; Colocación de carpeta asfáltica; Subdrenes; Colocación de tuberías de hormigón armado; Colocación de hormigón para cabezales y muros de alas; Escombrera disposición final y tratamiento paisajístico en zonas de depósito; Comunicados radiales; Charlas de adiestramiento; Agua para control del polvo.</p>	<p>Bazurto Orellana, Pedro</p>	<p>05/08/2016 - 08:27 AM</p>
<p>JUNIO 2016: Se realizaron trabajos de Desbroce, desbosque y limpieza; Excavación en suelo, fango, marginal y roca e incluido el desalojo de material; Remoción de hormigón incluido desalojo; Acabado de la obra básica existente; Colocación de material de préstamo importado, base, sub-base clase 3 incluido transporte; Colocación de geotextil, carpeta asfáltica espesor 10 cm, tuberías de hormigón armado, Cabezales de hormigón armado y muros de alas, Escombrera disposición final y tratamiento paisajístico en zonas de depósito; Comunicados radiales; Charlas de adiestramiento; Agua para control del polvo.</p>	<p>Bazurto Orellana, Pedro</p>	<p>04/07/2016 - 04:46 PM</p>
<p>MAYO 2016: Se realizaron trabajos de Desbroce, desbosque y limpieza; Excavación en suelo y desalojo de material; Acabado de la obra básica existente; Colocación de material de préstamo importado, base, sub-base clase 3 incluido transporte; Colocación de geotextil, carpeta asfáltica espesor 10 cm, tuberías de hormigón armado, Limpieza de derrumbes; Escombrera disposición final y tratamiento paisajístico en zonas de depósito; Comunicados radiales; Charlas de adiestramiento; Agua para control del polvo. Con fecha 04 de mayo del 2016 se firma contrato complementario No. 1 por aumento y disminución de cantidades por el mismo monto y plazo.</p>	<p>Bazurto Orellana, Pedro</p>	<p>04/07/2016 - 12:02 PM</p>
<p>Abril 2016: Se realizaron trabajos de Desbroce, desbosque y limpieza; Remoción de hormigón (inc. desalojo); Excavación en suelo, fango, marginal, roca y desalojo de material; Acabado de la obra básica existente; Colocación de material de préstamo importado, base, sub-base clase 3 incluido transporte; Colocación de geotextil, carpeta asfáltica espesor 10 cm, subdrenes, tuberías de hormigón armado, Limpieza de derrumbes; Escombrera disposición final y tratamiento paisajístico en zonas de depósito; Comunicados radiales; Charlas de adiestramiento; Agua para control del polvo.</p>	<p>Bazurto Orellana, Pedro</p>	<p>05/05/2016 - 10:29 AM</p>
<p>Marzo 2016: Se realizaron trabajos de Desbroce, desbosque y limpieza, Remoción de hormigón (inc. desalojo), Excavación en suelo, fango, marginal, roca y desalojo de material, Acabado de la</p>	<p>Bazurto Orellana, Pedro</p>	<p>04/04/2016 - 01:23 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
obra básica existente, Colocación de material de préstamo importado y Transporte, Colocación de Base, Sub-base clase 3 y transporte, Colocación de Geotextil, Subdrenes, Tuberías de hormigón armado, Limpieza de derrumbes, Suministro e instalación conos demarcadores, Escombrera disposición final y tratamiento paisajístico en zonas de depósito, Comunicados radiales, Charlas de adiestramiento y Agua para control del polvo.		
Febrero 2016: Se realizó trabajos de desbroce, desbosque y limpieza; Remoción hormigón inc. Desalojo, Excavación en suelo, fango, marginal, en roca y desalojo del material; Acabado de la obra básica existente; Material de préstamo importado s/t; Transporte de material de préstamo importado; Colocación de base, sub-base clase 3 y transporte; Colocación de geotextil; Desmontaje de señales verticales; Construcción e instalación de letrero de señalización para seguridad vial; Suministro e instalación conos demarcadores para trabajo de vía; Barricada de madera (1,2x1,5) y (2,4x1,5)m c/3 tablonos c/ cinta reflectiva; Escombrera disposición final y tratamiento paisajístico en zonas de depósito; Comunicados radiales; Charlas de adiestramiento; Agua para control del polvo.	Bazurto Orellana, Pedro	04/03/2016 - 09:57 AM
Enero 2016: Se realizó trabajos de: Desbroce, desbosque y limpieza; Remoción hormigón (incluido desalojo); Excavación en suelo, fango, marginal, en roca; Desalojo de material; Acabado de la obra básica existente; Colocación y transporte de Material de préstamo importado s/ t; Colocación de Base, Sub Base Clase III y Transporte; Colocación de Geotextil 1600 nt; Desmontaje de señales verticales; Construcción e instalación de letrero de señalización para seguridad vial (75x75) cm; Construcción e instalación de letrero de señalización para seguridad vial (90x90) cm cinta plástica; Suministro e instalación conos demarcadores para trabajo de vía (h=0,71m); Barricada de madera (1,2x1,5)m c/3 y (2,4x1,5)m c/3 tablonos c/ cinta reflectiva; Escombrera disposición final y tratamiento paisajístico en zonas de depósito; Comunicados radiales; Charlas de adiestramiento; Agua para control del polvo. La Orden de Cambio No. 1 fué aprobada ante la Comisión del Decreto EJcutivo No. 451 y se encuentra en proceso de legalización por las partes pertinentes la Acta.	Bazurto Orellana, Pedro	04/02/2016 - 03:05 PM
Diciembre 2015: La Contratista realiza trabajos de desbroce, desbosque y limpieza; remoción hor. cem. portland (inc. desalojo); excavación en suelo; desalojo de material; excavación marginal; excavación en roca; acabado de la obra básica existente; material de préstamo importado s/ t; transporte de material de préstamo importado; transporte base y sub base; sub-base clase 3; geotextil 1600 nt; subdrenes; tubería 1200mm; hormigón armado; En trámite una Orden de Cambio No. 1 por aumento y disminución de cantidades de obra, sin incremento de monto ni plazo.	Bazurto Orellana, Pedro	05/01/2016 - 04:44 PM
Noviembre 2015: La Contratista realiza movimiento de tierras en 11+200 al 13+000; 16+000 al 18+000; 22+200 al 28+000; 32+000 al 38+000; 60+000 al 67+300, explotación de agregados, obras de drenaje y conformación de escombreras en varias abscisas. Colocación de material de préstamo importado y subbase del 22+200 al 26+660. Se encuentra en trámite una Orden de Cambio No. 1 por aumento y disminución de cantidades de obra, sin incremento de monto ni plazo.	Bazurto Orellana, Pedro	07/12/2015 - 08:56 AM
Octubre 2015: Se realizaron trabajos de desbroce, excavación en suelo, excavación en fango, excavación en roca, desalojo de material, acabado de obra básica, sub-base, base, imprimación, señalización preventiva e informativa en el proceso constructivo.	Bazurto Orellana, Pedro	09/11/2015 - 08:41 AM
Septiembre 2015: En el presente mes se realizaron los siguientes trabajos: Desbroce; Excavación en suelo y fango; Colocación de Sub-base y geotextil; Acabado de obra básica; Alcantarilla: remoción e instalación de tubería, armado estructural, hormigón armado y simple; Escombrera en la abscisa (10+150, 12+560, 25+750), (47+320); Agua para control del polvo; Trituración y preparación de sub base clase 3 y base clase 1, Colocación y compactación de base clase 1A.	Davila Aguilar, Freddy	07/10/2015 - 09:43 AM
Agosto 2015: Se realizaron los siguientes trabajos: Desbroce, desbosque y limpieza, Remoción de hormigón incluido desalojo, Excavación en suelo y desalojo, Acabado de obra básica existente, Material de préstamo importado S/T y transporte, Sub-base Clase III y transporte, Colocación de Geotextil 1600 NT, Comunicados Radiales, Agua para control de polvo.	Bazurto Orellana, Pedro	08/09/2015 - 11:29 AM
JULIO 2015: Se realizaron trabajos de Desbroce y Limpieza, Remoción de Hormigón de Cunetas existentes, Excavación y Desalojo de Materiales para Escombrera, Transporte y Tendido de Material de Préstmo Importado, Desmontaje de Señalización Vertical, Construcción e instalación de letrero de señalización para seguridad vial (60x75)cm, Suministro e Instalación de elemento de sujeción o fijación de letreros de señalización en postes existentes, Trampa de grasas y aceites, Fosa de desechos sólidos (biodegradables-relleno sanitario), Comunicados Radiales, Charlas de Adiestramiento y Agua para control del polvo.	Bazurto Orellana, Pedro	07/08/2015 - 05:00 PM
JUNIO 2015: Con fecha 18 de Junio 2015 se realiza la entrega del 15% de Anticipo del Monto Original del Contrato siendo el valor de \$ 9'154,914.98, faltando el restante 15% del Anticipo por entregar al correspondiente al Crédito Chino. Se realizó la habilitación del Campamento en el 14+500 km, Construcción de Letrinas, Desbroce y Limpieza desde el 6+000 km hasta el 9+500 km, Excavación en suelos para cajoneras desde 7+000 hasta el 9+500, Colocación de laterales y corte desde 9+500 km hasta la 12+650 km,	Bazurto Orellana, Pedro	08/07/2015 - 05:02 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Excavación en suelo marginal desde 9+500 km hasta la 12+650 km, Desalojo de Material para escombrera desde la 8+260 km hasta 12+390, Acabado de la Obra Básica desde 7+000 hasta 9+500 km, Material de Préstamo Importado 7+000 km hasta 10+470 km.		
MAYO 2015: Se firma contrato con fecha 09 de Abril 2015, en espera de asignación del anticipo para inicio de obra	Bazurto Orellana, Pedro	05/06/2015 - 08:15 AM
ABRIL 2015: Proyecto adjudicado a la Cía CCECC bajo régimen especial con fecha 13 de Marzo de 2015, en espera de asignación del anticipo para inicio de obra	Bazurto Orellana, Pedro	14/05/2015 - 11:04 AM
Marzo 2015: Proyecto adjudicado a la Cía CCECC bajo régimen especial con fecha 19 de Marzo de 2015	Bazurto Orellana, Pedro	06/05/2015 - 09:28 AM
Febrero 2015: Enero2015: Estudios aprobados, en proceso de adjudicación por Régimen Especial	Bazurto Orellana, Pedro	06/03/2015 - 09:44 AM
Enero2015: Estudios aprobados, en proceso de adjudicación por Régimen Especial	Bazurto Orellana, Pedro	06/02/2015 - 09:55 AM
Doiciembre 2014: Estudios aprobados, en proceso de adjudicación por Régimen Especial	Bazurto Orellana, Pedro	06/01/2015 - 10:26 AM
Noviembre 2014: Estudios se encuentran a firma de aprobación, requisito necesario para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	03/12/2014 - 11:02 AM
Octubre 2014: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	05/11/2014 - 10:44 AM
Septiembre 2014: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	26/09/2014 - 10:59 AM
Agosto 2014: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	27/08/2014 - 11:23 AM
Julio 2014: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	05/08/2014 - 01:54 PM
Junio 2014: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	07/07/2014 - 09:59 AM
Mayo 2014: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	03/06/2014 - 03:18 PM
Abril 2014: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	08/05/2014 - 09:57 AM
Marzo 2014: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	07/04/2014 - 10:45 AM
Febrero 2014: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	06/03/2014 - 10:19 AM
Enero 2014: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	07/02/2014 - 11:45 AM
Diciembre 2013: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	03/01/2014 - 01:33 PM
Noviembre 2013: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	02/12/2013 - 10:12 AM
Octubre 2013: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	04/11/2013 - 11:07 AM
Septiembre 2013: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	03/10/2013 - 10:46 AM
Agosto 2013: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	04/09/2013 - 10:49 AM
Julio 2013: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	05/08/2013 - 04:28 PM
Junio 2013: Una vez que se cuente con los estudios, se podrá iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	02/07/2013 - 11:59 AM
Mayo 2013: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Bazurto Orellana, Pedro	10/06/2013 - 01:43 PM
Abril 2013: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Navas Yépez, Carlos Giovanni	06/05/2013 - 10:06 AM
Marzo 2013.- En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Navas Yépez, Carlos Giovanni	06/05/2013 - 10:05 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Febrero 2013: En espera de contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Chávez Valarezo, Hernán Augusto	05/03/2013 - 09:58 AM
Enero 2013: Se espera contar con los estudios, para iniciar etapa precontractual reconstrucción de obra	Chávez Valarezo, Hernán Augusto	08/02/2013 - 09:50 AM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. * General.</b> Efectos colaterales de fenómeno del Niño CAUSARIA retraso ejecución de obra	04/10/2018	Robespierre Roberto Aristoteles Vite Quezada	30 %	40	12	0/1

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 1

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > El Oro > Atahualpa
2	Zona 7 - Sur > El Oro > Zaruma

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICION: Proyecto definido	1-Solicitud de Información	01/09/2011		01/09/2011		Sí	1.0
2	PLANEACION: Justificativos tecnicos y economicos terminados	1-Solicitud de Información	15/02/2015		15/02/2015		Sí	2.0
3	PLANEACION:Revision de pliegos concluída	1-Solicitud de Información	20/02/2015		20/02/2015		Sí	2.0
4	PLANEACION:Publicacion de pliegos ejecutada	2-Publicación de Pliegos	31/03/2015		31/03/2015		Sí	1.0
5	PLANEACION:Contrato firmado	3-Adjudicación	09/04/2015		09/04/2015		Sí	1.0
6	EJECUCION: Trabajos iniciados	4-Inicio de Trabajo	18/06/2015		01/06/2015		Sí	1.0
7	EJECUCION: VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: Excavación Abril 2016	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	3.58
8	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: CALZADA: CARPETA ASFALTICA e=10CM: abril 2016	5-Entregables Intermedios	30/04/2016		30/04/2016		Sí	1.01
9	EJECUCION: VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: Excavación mayo-junio 2016	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	1.96
10	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: CALZADA: CARPETA	5-Entregables Intermedios	30/06/2016		30/06/2016		Sí	3.54



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ASFALTICA e=10CM: mayo - junio 2016							
11	EJECUCION: PUENTES: Puente en abscisa 39+360 L=16m	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.31
12	EJECUCION: VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: Excavación julio-agosto 2016	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	1.48
13	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: CALZADA: CARPETA ASFALTICA e=10CM: julio - agosto 2016	5-Entregables Intermedios	31/08/2016		31/08/2016		Sí	0.9
14	EJECUCION: VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: Excavación septiembre-octubre 2016	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	1.29
15	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: CALZADA: CARPETA ASFALTICA e=10CM: septiembre - octubre 2016	5-Entregables Intermedios	31/10/2016		31/10/2016		Sí	1.13
16	EJECUCION: VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: Excavación noviembre-diciembre 2016	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	1.83
17	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: CALZADA: CARPETA ASFALTICA e=10CM: noviembre - diciembre 2016	5-Entregables Intermedios	31/12/2016		31/12/2016		Sí	2.53
18	EJECUCION: VIA PRINCIPAL: Colocación subdren	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	3.38
19	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: transporte de base y sub-base	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		31/08/2017		Sí	1.18
20	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL: hormigon no estructural de cemento portland clase E f'c = 180kg/cm2	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		30/09/2017		Sí	0.45
21	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL: Hormigón estructural de cemento portland, clase b (*) f'c= 240 kg/cm2	5-Entregables Intermedios	30/09/2017		31/08/2017		Sí	3.09
22	EJECUCION: PUENTES: Puente sobre el rio Chilola L=35m	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		31/08/2017		Sí	0.63
23	EJECUCION: VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: Desalojo	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.52
24	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: CALZADA: CARPETA ASFALTICA e=10CM: enero - febrero 2017	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	2.26
25	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: Hormigones y muros	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		03/08/2018		Sí	0.53
26	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: geotextil	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	2.4
27	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: material de predaplen,	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	0.46

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	transporte y acabado de obra basica							
28	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: sub-base clase 3	5-Entregables Intermedios	30/11/2017		30/11/2017		Sí	2.01
29	EJECUCION: PUENTES: Puente en abscisa 38+660 L=16m	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		30/06/2017		Sí	0.21
30	EJECUCION: PUENTES: Puente sobre el rio Arcapamba L=55m	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		24/05/2018		Sí	0.95
31	EJECUCION: PUENTES: Puente sobre el rio Buenavista; L=60 m	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		15/12/2017		Sí	2.9
32	EJECUCION: PUENTES: Puente sobre el rio Palto L=20m	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		27/10/2017		Sí	0.36
33	EJECUCION: PUENTES: Puente sobre el rio Salado L=45m	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		22/12/2017		Sí	0.66
34	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: CALZADA: CARPETA ASFALTICA e=10CM: marzo - abril 2017	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	2.26
35	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: base clase 1	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	2.69
36	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: derrumbes	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/07/2018		Sí	0.35
37	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: material de prestamo	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	6.17
38	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: MOVIMIENTOS DE TIERRA: transporte de prestamo	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/12/2017		Sí	2.0
39	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL: excavación	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		21/04/2018		Sí	1.66
40	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL: Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 para cunetas en v inc. enlucido	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/07/2018		Sí	0.29
41	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL: Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 para cunetas en v inc. enlucido	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/07/2018		Sí	4.29
42	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL: Suministro e instalación de tubería h.a. 48" (inc. entibado y bombeo)	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		21/04/2018		Sí	3.35
43	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: PLAN DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL: Señalización para la seguridad vial (proceso constructivo)	5-Entregables Intermedios	31/12/2017		31/07/2018		Sí	2.15

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
44	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: CALZADA: asfalto MC para imprimación	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.87
45	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: CALZADA: CARPETA ASFALTICA e=10CM: mayo - junio 2017	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	3.54
46	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: CALZADA: transporte de mezcla asfáltica	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.22
47	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: PLAN DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL: Obras preliminares	5-Entregables Intermedios	31/01/2018		31/01/2018		Sí	0.06
48	EJECUCION: INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y AGUAPOTABLE DE POBLADOS PACCHA, HUERTAS, MULUNCAY, ARCAPAMBA Y MALVAS: Infraestructura sanitaria y agua potable Arcapamba	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		21/04/2018		Sí	0.24
49	EJECUCION: INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y AGUAPOTABLE DE POBLADOS PACCHA, HUERTAS, MULUNCAY, ARCAPAMBA Y MALVAS: Infraestructura sanitaria y agua potable Huertas	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.36
50	EJECUCION: INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y AGUAPOTABLE DE POBLADOS PACCHA, HUERTAS, MULUNCAY, ARCAPAMBA Y MALVAS: Infraestructura sanitaria y agua potable Malvas	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.13
51	EJECUCION: INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y AGUAPOTABLE DE POBLADOS PACCHA, HUERTAS, MULUNCAY, ARCAPAMBA Y MALVAS: Infraestructura sanitaria y agua potable Muluncay	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		21/04/2018		Sí	0.58
52	EJECUCION: INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y AGUAPOTABLE DE POBLADOS PACCHA, HUERTAS, MULUNCAY, ARCAPAMBA Y MALVAS: Infraestructura sanitaria y agua potable Paccha	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	1.09
53	EJECUCION: Mantenimiento	5-Entregables Intermedios	28/02/2018	31/12/2018			No	2.4
54	EJECUCION: PUENTES: Puente en abscisa 18+060 L=16m	2-Publicación de Pliegos	28/02/2018		30/04/2017		Sí	0.18
55	EJECUCION: SITIOS CRITICOS 1-2-3-4-5-6-7-8: Sitio crítico 1 (ABSCISA 24+925)	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		31/01/2018		Sí	0.9

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
56	EJECUCION: SITIOS CRITICOS 1-2-3-4-5-6-7-8: Sitio crítico 2 (ABSCISA 42+140)	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		28/02/2018		Sí	0.87
57	EJECUCION: SITIOS CRITICOS 1-2-3-4-5-6-7-8: Sitio crítico 3 (ABSCISA 43+146)	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		31/01/2018		Sí	0.25
58	EJECUCION: SITIOS CRITICOS 1-2-3-4-5-6-7-8: Sitio crítico 4 (ABSCISA 44+950)	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		31/01/2018		Sí	0.92
59	EJECUCION: SITIOS CRITICOS 1-2-3-4-5-6-7-8: Sitio crítico 5 (ABSCISA 49+166,89)	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		31/01/2018		Sí	0.76
60	EJECUCION: SITIOS CRITICOS 1-2-3-4-5-6-7-8: Sitio crítico 6 (ABSCISA 53+216)	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		31/01/2018		Sí	0.35
61	EJECUCION: SITIOS CRITICOS 1-2-3-4-5-6-7-8: Sitio crítico 7 (ABSCISA 58+549)	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		31/01/2018		Sí	0.34
62	EJECUCION: SITIOS CRITICOS 1-2-3-4-5-6-7-8: Sitio crítico 8 (ABSCISA 72+950)	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		31/01/2018		Sí	0.61
63	EJECUCION: VIA PRINCIPAL: Remoción de alcantarillas existentes	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		12/01/2018		Sí	0.32
64	EJECUCION: VÍA PRINCIPAL: Operaciones preliminares terminadas	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		06/01/2018		Sí	0.29
65	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL: Acero de refuerzo en barras	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		14/04/2018		Sí	1.48
66	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: PLAN DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL: Plan de manejo ambiental	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		03/08/2018		Sí	4.51
67	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: PLAN DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL: Plan de seguridad laboral	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		03/08/2018		Sí	0.04
68	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: PLAN DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL: Señalización definitiva vertical y turística	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		31/07/2018		Sí	0.77
69	EJECUCION:VIA PRINCIPAL: PLAN DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN VIAL: Señalización informativa	5-Entregables Intermedios	28/02/2018		03/08/2018		Sí	0.16
70	CIERRE:Acta de recepcion provisional legalizadas	5-Entregables Intermedios	31/03/2018		23/08/2018		Sí	1.0
71	COMPLETADO: Acta de recepcion definitiva legalizadas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	30/09/2018	31/12/2018			No	1.0


**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
72	CIERRE Liquidación económica concluida	9-Entregables Formales	31/12/2018	31/12/2018			No	1.0

**SUPERVISIONES EJECUTIVAS**

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	SUPERVISION EJECUTIVA JULIO DEL 2017.	Barriga Noblecilla, Rocío Marisol	{PR} - Provincia - EL ORO	31/07/2017
2	SUPERVISION EJECUTIVA: BUENAVISTA-VEGA RIVERA-PACCHA ZARUMA: PROBLEMAS EN PUNTO CRITICO 18+700	Barriga Noblecilla, Rocío Marisol	{PR} - Provincia - EL ORO	30/06/2017
3	SUPERVISION EJECUTIVA GOBERNACION	Barriga Noblecilla, Rocío Marisol	{PR} - Provincia - EL ORO	01/06/2017
4	Proyecto del MTOP cumple lo planificado	Barriga Noblecilla, Rocío Marisol	{PR} - Provincia - EL ORO	28/04/2017
5	Reconstrucción de la vía Buenavista, Vega Rivera, Paccha, Zaruma continua en ejecución y cumple lo planificado.	Barriga Noblecilla, Rocío Marisol	{PR} - Provincia - EL ORO	21/03/2017
6	Reconstrucción de la vía Buenavista, Vega Rivera, Paccha, Zaruma continua en ejecución y cumple lo planificado.	Barriga Noblecilla, Rocío Marisol	{PR} - Provincia - EL ORO	21/03/2017
7	Reconstrucción de la vía se ejecuta de acuerdo a lo planificado.	Barriga Noblecilla, Rocío Marisol	{PR} - Provincia - EL ORO	24/02/2017
8	Construcción de la vía cumple hitos planificados	Barriga Noblecilla, Rocío Marisol	{PR} - Provincia - EL ORO	26/01/2017
9	MTOP - Cumple con lo planificado en la construcción de la vía Buenavista - Zaruma.	Barriga Noblecilla, Rocío Marisol	{PR} - Provincia - EL ORO	27/12/2016
10	Proyecto de Reconstrucción de la vía Buenavista - Vega Rivera - Paccha - Zaruma sigue en ejecución.	Luna Bustamante, Asunción del Rocío	{PR} - Provincia - EL ORO	30/11/2016
11	Proyecto Reconstrucción de la carretera Buenavista - Vega Rivera - Paccha - Zaruma cumple lo planificado.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	29/09/2016
12	Proyecto K024 del MTOP -Se cumple los hitos planificados.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	31/08/2016
13	Reconstrucción de la carretera Buenavista - Vega Rivera - Paccha - Zaruma con el 41% de avance físico.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	26/07/2016
14	Proyecto K024 del Mtop cumple con hitos planificados	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	23/06/2016
15	Reconstrucción de la vía Buenavista Vega Rivera Paccha Zaruma cumple exitosamente.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	13/05/2016
16	Proyecto K024 del MTOP, no se realizan puentes por temporada invernal.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	19/04/2016
17	Proyecto Reconstrucción de la carretera Buenavista - Vega Rivera - Paccha - Zaruma se cumple con lo planificado.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	19/02/2016
18	Proyecto K024 del MTOP se ejecuta cumpliendo hitos en la construcción de la carretera	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	16/12/2015
19	Proyecto de Rectificación y Mejoramiento de la Carretera Buenavista-Vega Rivera - Paccha - Zaruma en ejecución, cumpliendo los hitos programados.	Zambrano Landín, Carlos Víctor	{PR} - Provincia - EL ORO	23/09/2015

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA		100.00 %	100	100	19/06/2015	Septiembre

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	9,154,914.98
Estimado Al Fin Del Proyecto:	76,422,998.70 **
Costo Total:	74,939,001.76
Total Devengado:	74,753,529.05
% Costo Total Devengado:	99.75 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 99.75 %

Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	68,123,870.93	13,035,227.00	0.00	81,159,097.93
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	20,000,000.00	13,048,111.97	0.00	33,048,111.97
Ppto. Codificado	86,694,855.58	17,630,558.22	0.00	104,325,413.80
Ppto. Comprometido	73,269,083.17	16,725,898.50	0.00	89,994,981.67
Planeado - Codificado (2018)		-4,595,331.22		
Programado a Devengar	86,931,683.65	17,661,635.50	0.00	104,593,319.15
Ppto. Devengado	58,761,363.20	15,992,165.85	0.00	74,753,529.05
Pagado Real	58,761,363.20	15,883,943.13	0.00	74,645,306.33
Estimado a fin de año	* 58,761,363.20	17,661,635.50	0.00	76,422,998.70
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	28,170,320.45	0.00	0.00	28,170,320.45
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 67.59 %	90.55 %	0.00 %	71.47 %
Ppto. Codificado 998	12,990,505.51	4,167,096.91	0.00	17,157,602.42
Ppto. Devengado 998	10,086,416.00	3,971,037.59	0.00	14,057,453.59

\* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2018

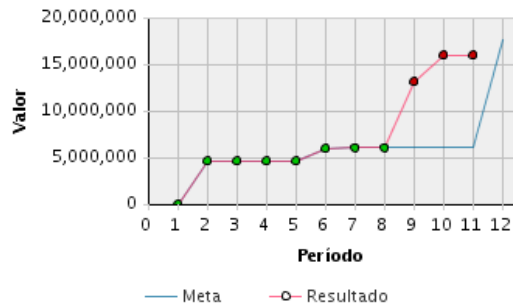

Presupuesto Mensual 2018

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	<span style="color: green;">●</span>	0.00 %

Presupuesto Mensual 2018							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	4,608,252.52	4,608,252.52	4,608,252.52	4,608,252.52	100.00 %		26.09 %
Mar	0.00	0.00	4,608,252.52	4,608,252.52	100.00 %		26.09 %
Abr	0.00	0.00	4,608,252.52	4,608,252.52	100.00 %		26.09 %
May	0.00	0.00	4,608,252.52	4,608,252.52	100.00 %		26.09 %
Jun	1,375,592.12	1,375,592.12	5,983,844.64	5,983,844.64	100.00 %		33.88 %
Jul	66,456.36	66,456.36	6,050,301.00	6,050,301.00	100.00 %		34.26 %
Ago	0.00	0.00	6,050,301.00	6,050,301.00	100.00 %		34.26 %
Sep	0.00	7,087,836.60	6,050,301.00	13,138,137.60	217.15 %		74.39 %
Oct	0.00	2,854,028.25	6,050,301.00	15,992,165.85	264.32 %		90.55 %
Nov	0.00	0.00	6,050,301.00	15,992,165.85	264.32 %		90.55 %
Dic	11,611,334.50		17,661,635.50				
<b>Total</b>	<b>17,661,635.50</b>	<b>15,992,165.85</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
20	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
21	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
22	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
23	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA_ENTREGA_RECEPCION_PROVISIONAL_PARCIAL	ACTA_DE_ENTREGA_RECEPCION_PROVISIONAL_PARCIAL-VEGA_RIVERA-PACCHA-ZARUMA.pdf	04/05/2018
2	BORRADOR_ABRIL_2018	SABANA_BORRADOR_ABRIL_2018.xlsx	04/05/2018
3	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2015	C_5_CEDULA_PRESUP_AÑO_2015.pdf	19/12/2016
4	CEDULA PRESUPUESTARIA AÑO 2016	C_6_CEDULA_PRESUP_AÑO_2016.pdf	19/12/2016
5	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA	C_7_CERTIFICACION_PRESUPUESTARIA.pdf	19/12/2016
6	CONTRATO	C_3_CONTRATO.pdf	16/12/2016
7	Contrato Complementario No. 1 firmado 04 de mayo del 2016	B_5_Contrato_Complementario_No._1.pdf	03/06/2016
8	CONTRATO MODIFICATORIO	C_4_CONTRATO_MODIFICATORIO.pdf	16/12/2016
9	DICTAMEN DE PRIORIDAD	A1_DICTAMEN_DE_PRIORIDAD.pdf	07/08/2015
10	E_7_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2018	E_7_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2018.pdf	04/05/2018
11	E_8_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2018	E_8_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2018.pdf	05/06/2018
12	E_9_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018	E_9_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2018.pdf	04/07/2018
13	F_1_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2018	F_1_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2018.pdf	03/08/2018
14	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2016	B_5_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2016.pdf	05/05/2016
15	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	D_3_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017.pdf	02/05/2017
16	INFORME EJECUTIVO ABRIL 2017	D_4_INFORME_EJECUTIVO_ABRIL_2017.pdf	04/05/2017

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
17	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2015	A_4_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2015.pdf	07/09/2015
18	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2016	B_8_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2016.pdf	02/09/2016
19	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2017	D_8_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2017_...pdf	05/09/2017
20	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2015	B_1_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2015.pdf	05/01/2016
21	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2016	C_8_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2016.pdf	04/01/2017
22	INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2017	E_3_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2017.pdf	04/01/2018
23	INFORME EJECUTIVO ENERO 2016	B_2_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2016.pdf	04/02/2016
24	INFORME EJECUTIVO ENERO 2017	C_9_INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2017.pdf	03/02/2017
25	INFORME EJECUTIVO ENERO 2018	INFORME_EJECUTIVO_ENERO_2018.pdf	06/02/2018
26	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2016	B_3_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2016.pdf	02/03/2016
27	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2017	D_1_INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2017.pdf	03/03/2017
28	INFORME EJECUTIVO FEBRERO 2018	INFORME_EJECUTIVO_FEBRERO_2018.pdf	02/03/2018
29	INFORME EJECUTIVO JULIO 2015	A2_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2015.pdf	07/08/2015
30	INFORME EJECUTIVO JULIO 2016	B_7_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2016.pdf	05/08/2016
31	INFORME EJECUTIVO JULIO 2017	D_7_INFORME_EJECUTIVO_JULIO_2017.pdf	04/08/2017
32	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2016	B_6_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2016.pdf	04/07/2016
33	INFORME EJECUTIVO JUNIO 2017	D_6_INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2017.pdf	03/07/2017
34	INFORME EJECUTIVO MARZO 2016	B_4_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2016.pdf	04/04/2016
35	INFORME EJECUTIVO MARZO 2017	D_2_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017.pdf	04/04/2017
36	INFORME EJECUTIVO MARZO 2018	E_6_INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2018.pdf	05/04/2018
37	Informe Ejecutivo mayo 2016	B_4_Informe_Ejecutivo_mayo_2016.pdf	03/06/2016
38	INFORME EJECUTIVO MAYO 2017	D_5_INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017.pdf	05/06/2017
39	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2015	A_8_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2015.pdf	04/12/2015
40	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2016	C_2_INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2016.pdf	05/12/2016
41	INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2017.pdf	05/12/2017
42	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2015	A_7_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2015.pdf	09/11/2015
43	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2016	C_1_INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2016.pdf	08/11/2016
44	INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017	INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017.pdf	06/11/2017
45	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2015	A_6_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2015.pdf	06/10/2015
46	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2016	B_9_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2016.pdf	05/10/2016
47	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017	D_9_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017.pdf	04/10/2017
48	INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2018	F4_INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2018.pdf	05/10/2018
49	INFORME EJECUTIVO AGOSTO 2018	F_2_INFORME_EJECUTIVO_AGOSTO_2018.pdf	05/09/2018
50	LEVANTAMIENTO_SUSPENSION_TRABAJS	MTOP-DDDO-18-85-OF_LEVANTAMIENTO_SUSPENSION_TRABAJS.pdf	03/08/2018
51	ORDEN DE CAMBIO No. 1	A_9_TRAMITE_DE_ORDEN_DE_CAMBIO_No._1.pdf	07/12/2015
52	ORDEN DE CAMBIO No. 4	ORDEN_DE_CAMBIO_No._4_AMPLIACION_DE_PLAZO.pdf	02/03/2018
53	REPORTE ESIGEF AGOSTO 2015	A_5_REPORTE_ESIGEF_AGOSTO_2015.pdf	07/09/2015
54	REPORTE ESIGEF JULIO 2015	A3_REPORTE_ESIGEF_JULIO_2015.pdf	07/08/2015
55	SUSPENSION_DE_TRABAJS	MTOP-DDDO-2018-1339-ME.-SUSPENSION_DE_TRABAJS.pdf	04/05/2018

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Calderón Ojeda, Jaime Ramiro	Patrocinador Ejecutivo - Subsecretario Región 7	Subsecretario Regional 7	jcalderon@mtop.gob.ec	023974600
González Villavicencio, Volter Hernel	Coordinador de infraestructura	Analista de Infraestructura Provincial 1	vgonzalez@mtop.gob.ec	023974600



Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	Director Provincial	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	gsanchez@mtop.gob.ec	023974600
Sánchez Yoza, Gabriel Vicente	Administrador del Contrato	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de El Oro	gsanchez@mtop.gob.ec	023974600
Vite Quezada, Robespierre Roberto Aristoteles	Líder de proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 1	rvite@mtop.gob.ec	023974600

**FOTOGRAFÍA SELECCIONADA**

Archivo	Fecha de Alta
62324_1.jpg	04/06/2018
