

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 5
Dirección Provincial Guayas

PROYECTO: K027 MTOP - Rehabilitación de la carretera Puerto Ayora - Canal de Itabaca, de 39.7 km, ubicada en la isla Santa Cruz, provincia de Galápagos.

Líder del Proyecto:	Suárez Mendieta, Manuel Orlando (msuarez@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Valle Zuñiga, Hugo Arturo	Programas Relacionados:	Provincia - Galápagos, REHABILITACION DE LA CARRETERA PUERTO AYORA CANAL DE ITABACA DE 39.7 KM UBICADA EN LA ISLA SANTA CRUZ PROV, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Delgado León, Andrés Glen	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	2.28
CUP:	175200000.21.6369	TIR:	28.30 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	7,620.96
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,737,599.88
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	17/08/2011 - 31/12/2019
Fecha de última actualización:	23/05/2019	Fecha de Fin Base:	31/08/2014
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	20/06/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La construcción de este proyecto beneficiará a todos los habitantes de la provincia de Galápagos y turistas que se desplazan por dicha carretera, fortaleciendo así la seguridad vial de los usuarios.

PRODUCTO / SERVICIO:

Mejorar la calidad de servicio y seguridad de la vía existente.

Este proyecto permitirá habilitar la carretera Puerto Ayora-Canal de Itabaca de 39,70 Kms ubicada en la Provincia de Galápagos.

LINEA BASE:

Debido a las malas condiciones que presentaba la vía, se volvía un sacrificio y peligro desplazarse por la misma, que a más de su mala condición era insegura debido a la falta de señalización horizontal y vertical. Ante esta circunstancia el MTOP contrata los estudios y posteriormente la ejecución de los trabajos, a fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios.

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Como objetivo general del proyecto será complementar el desarrollo vial y bienestar para los usuarios de la vía.

Objetivos específicos:

Que mejore la infraestructura de transporte de la zona.

Que mejore el turismo en la zona.

Que se haga la adecuada señalización de las vías de acceso para así mejorar la circulación.

Que se haga la adecuada señalización de la vía.

OBJETO DEL CONTRATO: Rehabilitación y reforzamiento de la carretera Puerto Ayora - Canal de Itabaca de una longitud de 39.70 km, ubicada en la provincia de Galápagos.

ID Contrato: 3652.

No. De Contrato Principal: LO-09-MTOP-2011 (Licitación de Obras).

CUP: 175200000.0000.21.6369.

Contratista: Ing. José Germánico Molina Vega.

Fiscalización: Compañía Pablo Herrera Álvarez Consultora CIA. LTDA. IPHc.

Supervisor: Ing. Julio Ricaurte Masson (MTOP-R5).

DATOS GENERALES

Descripción

Monto Original: \$ 7'703,497.95 (Siete millones setecientos tres mil cuatrocientos noventa y siete con 95/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

Anticipo: 30 %.

Valor Anticipo: \$ 2'311,049.39 (Dos millones trescientos once mil cuarenta y nueve con 39/100. Dólares de los Estados Unidos de América).

Plazo Original: 365 (días). Del 18 de agosto del 2011 al 17 de agosto del 2012.

Fecha de firma de contrato: 17 de agosto del 2011.

Orden de Cambio No. 1.

Monto: \$ 0.

Plazo: 136 (días). Del 17 de agosto del 2012 al 31 de diciembre del 2012.

Fecha de aprobación: 10 de abril del 2012.

Orden de Cambio No. 2.

Monto: \$ 0. (Aumento de monto se efectuará mediante contrato complementario).

Plazo: 12 (meses). Del 31 de diciembre del 2012 al 31 de diciembre del 2013.

Fecha de aprobación: 28 de diciembre del 2012.

Contrato Complementario No. 1:

Monto: \$ 2'179,218.89 (Dos millones ciento setenta y nueve mil doscientos dieciocho con 89/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

Anticipo: 30 %.

Valor Anticipo: \$ 653,765.67 (Seis ciento cincuenta y tres mil setecientos sesenta y cinco con 67/100. Dólares de los Estados Unidos de América).

Plazo: 0 (días).

Fecha de firma del Contrato Complementario: 28 de marzo del 2013.

Monto Contractual: \$9'882,716.84.

Plazo Contractual: 24 (meses) y 136 (días).

Beneficios Cualitativos

Facilitar el transporte de carga y pasajeros desde Puerto Ayora-Canal de Itabaca en la Isla Santa Cruz, ayudando al incremento del turismo y comercio local.

Tipo de Beneficiario

Pobladores de las Islas Galápagos.

Restricciones

TIEMPO: Dificultad para la internación de equipos en las Islas Galápagos.

TIEMPO: Terminar el proyecto dentro del tiempo establecido en el contrato.

COSTO: No excederse del monto presupuestado para el proyecto.


ALCANCE: Utilizar las canteras o minas según se especifica en los estudios.

RECURSOS: Utilizar los materiales según las especificaciones técnicas del contrato.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución **Cierre** Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 93.07 %

Fecha de Inicio: 17/08/2011

Fecha de Fin: 31/12/2019

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %	96 %	98 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2019; Los trabajos de reparación de la ciclovía culminaron el 19 noviembre 2018, se cuenta con el Acta Recepción Provisional por parte del Contratista.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	01/04/2019 - 01:45 PM
MARZO 2019; Los trabajos de reparación de la ciclovía culminaron el 19 noviembre 2018 y se encuentra en proceso de legalizar el Acta Recepción Provisional por parte del Contratista.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	06/03/2019 - 01:35 PM
FEBRERO 2019; Los trabajos de reparación de la ciclovía culminaron el 19 noviembre 2018 y se encuentra en proceso de legalizar el Acta Recepción Provisional por parte del Contratista.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	07/02/2019 - 09:44 AM
ENERO 2019; Los trabajos de reparación de la ciclovía culminaron el 19 noviembre 2018 y se encuentra en proceso de legalizar el Acta Recepción Provisional por parte del Contratista. DICIEMBRE 2018; Los trabajos de reparación de la ciclovía culminaron el 19 noviembre 2018	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	05/02/2019 - 10:08 AM
NOVIEMBRE 2018; Los trabajos de reparación de la ciclovía se continúan y se culminaron el 19 noviembre 2018 OCTUBRE 2018; Los trabajos de reparación de la ciclovía se continúan. SEPTIEMBRE 2018; Los trabajos de reparación de la ciclovía se continúan. AGOSTO 2018; Los trabajos de reparación de la ciclovía se continúan. JULIO 2018; Los trabajos de reparación de la ciclovía se continúan. JUNIO 2018; Los trabajos de reparación de la ciclovía se continúan. MAYO 2018; El 02-05-2018 se suscribió Contrato Complementario 2 y orden de Cambio 8 para realizar los trabajos de emergencia; luego de recibir el contratista el anticipo respectivo, se reanudan los trabajos el 21-05-2018. ABRIL 2018; En espera de la asignación presupuestaria para suscribir contrato complementario y orden cambio para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño. Actualmente el proyecto está suspendido, desde el 02-06-2017. Lo referente al objeto contractual fue inaugurado en febrero 2017.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	18/01/2019 - 04:22 PM
MARZO 2018; En espera de la asignación presupuestaria para suscribir contrato complementario y orden cambio para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño. Actualmente el proyecto está suspendido, desde el 02-06-2017. Lo referente al objeto contractual fue inaugurado en febrero 2017. FEBRERO 2018; En espera de la asignación presupuestaria para suscribir contrato complementario y orden cambio para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño. Actualmente el proyecto está suspendido, desde el 02-06-2017. Lo referente al objeto contractual fue inaugurado en febrero 2017. ENERO 2018; En espera de la asignación presupuestaria para suscribir contrato complementario y orden cambio para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño. Actualmente el proyecto está suspendido, desde el 02-06-2017. Lo referente al objeto contractual fue inaugurado en febrero 2017. DICIEMBRE 2017; En espera de la asignación presupuestaria para suscribir contrato complementario y orden cambio para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño. Actualmente el proyecto está suspendido, desde el 02-06-2017. Lo referente al objeto contractual fue inaugurado en febrero 2017.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	18/01/2019 - 04:18 PM
NOVIEMBRE 2017; En espera de la asignación presupuestaria para suscribir contrato complementario y orden cambio para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño. Actualmente el proyecto está suspendido, desde el 02-06-2017. Lo referente al objeto contractual fue inaugurado en febrero 2017.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	01/12/2017 - 02:45 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2017; En espera de la asignación presupuestaria para suscribir contrato complementario y orden cambio para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño. Actualmente el proyecto está suspendido, desde el 02-06-2017. Lo referente al objeto contractual fue inaugurado en febrero 2017.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	30/10/2017 - 03:50 PM
SEPTIEMBRE 2017; En espera de la asignación presupuestaria para suscribir contrato complementario y orden cambio para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño. Actualmente el proyecto está suspendido, desde el 02-06-2017. Lo referente al objeto contractual fue inaugurado en febrero 2017.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	05/10/2017 - 10:42 AM
AGOSTO 2017; En espera de la asignación presupuestaria para suscribir contrato complementario y orden cambio para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño. Actualmente el proyecto está suspendido, desde el 02-06-2017. Lo referente al objeto contractual fue inaugurado en febrero 2017.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	04/09/2017 - 09:55 AM
JULIO 2017; En espera de la asignación presupuestaria para suscribir contrato complementario y orden cambio para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño. Actualmente el proyecto está suspendido, desde el 02-06-2017. Lo referente al objeto contractual fue inaugurado en febrero 2017.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	02/08/2017 - 02:28 PM
junio 2017; En espera de la asignación presupuestaria para suscribir contrato complementario y orden cambio para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño. Actualmente el proyecto está suspendido, desde el 02-06-2017.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	04/07/2017 - 10:10 AM
mayo 2017; actualmente se espera la aceptación por planificación matriz y senplades la actualización del dictamen de prioridad del proyecto, para solicitar asignación presupuestaria y suscribir un contrato complementario para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño. marzo 2017; actualmente se espera la aceptación por planificación matriz y senplades la actualización del dictamen de prioridad del proyecto, para solicitar asignación presupuestaria y suscribir un contrato complementario para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño. abril 2017; actualmente se espera la aceptación por planificación matriz y senplades la actualización del dictamen de prioridad del proyecto, para solicitar asignación presupuestaria y suscribir un contrato complementario para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	04/05/2017 - 11:21 AM
FEBRERO 2017: el 15 febrero 2017 el Sr. Ministro Ing. Boris Córdova inauguró la obra, actualmente se espera la aceptación por planificación matriz y senplades la actualización del dictamen de prioridad del proyecto, para solicitar asignación presupuestaria y suscribir un contrato complementario para ejecutar rubros de emergencia causados por el Fenómeno El Niño.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	02/03/2017 - 01:43 PM
ENERO 2017: en espera de la aceptación por planificación matriz y senplades, de la actualización del dictamen de prioridad del proyecto, para solicitar asignación presupuestaria.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	02/02/2017 - 11:37 AM
DICIEMBRE 2016: el día 22-11-2016 el Administrador del Contrato autorizó la suspensión temporal hasta suscribir actos administrativos,	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	05/01/2017 - 08:30 AM
NOVIEMBRE 2016: el día 22-11-2016 el Administrador del Contrato autorizó la suspensión temporal hasta suscribir actos administrativos,	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	02/12/2016 - 03:32 PM
OCTUBRE 2016: el 13 septiembre 2016 se levantó la suspensión temporal , previo a la suscripción del acto administrativo respectivo, aprobado por la Comisión 451. La carretera tiene un avance del 99%.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	01/11/2016 - 03:59 PM
SEPTIEMBRE 2016: el 13 septiembre 2016 se levantó la suspensión temporal , previo a la suscripción del acto administrativo respectivo, aprobado por la Comisión 451.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	05/10/2016 - 04:00 PM
AGOSTO 2016: hasta la presente, el Ministerio de Finanzas no da el aval; razón por la cual no se suscribe el acto administrativo respectivo y por ende se mantiene la suspensión temporal .	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	07/09/2016 - 08:23 AM
JULIO 2016: hasta la presente, el Ministerio de Finanzas no da el aval; razón por la cual no se suscribe el acto administrativo respectivo y por ende se mantiene la suspensión temporal . JUNIO 2016: hasta la presente, el Ministerio de Finanzas no da el aval; razón por la cual no se suscribe el acto administrativo respectivo y por ende se mantiene la suspensión temporal .	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	02/08/2016 - 03:01 PM
MAYO 2016: Continúan los trabajos suspendidos desde el 1 octubre del 2015 hasta que se tramite el acto administrativo correspondiente por el incremento de cantidades de obra, además hasta la presente fecha no se acredita el pago de varias planillas al contratista.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	07/06/2016 - 09:23 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2016: Continúan los trabajos suspendidos hasta que se tramite el acto administrativo correspondiente por el incremento de cantidades de obra, además hasta la presente fecha no se acreditan las planillas de pago al contratista desde octubre del 2015.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	04/05/2016 - 09:56 AM
MARZO 2016: Continúan los trabajos suspendidos hasta que se tramite el acto administrativo correspondiente por el incremento de cantidades de obra, además hasta la presente fecha no se acreditan las planillas de pago al contratista desde octubre del 2015.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	04/05/2016 - 09:53 AM
FEBRERO 2016: Continúan los trabajos suspendidos hasta que se tramite el acto administrativo correspondiente por el incremento de cantidades de obra para cumplir con el bojeto del contrato.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	08/03/2016 - 03:02 PM
ENERO 2016: Continúan los trabajos suspendidos hasta que se tramite el acto administrativo correspondiente por el incremento de cantidades de obra para cumplir con el bojeto del contrato.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	08/03/2016 - 03:00 PM
DICIEMBRE 2015: Continúan los trabajos suspendidos hasta que se tramite el acto administrativo correspondiente	Calderón Cañar, Edgar Miguel	08/03/2016 - 02:59 PM
NOVIEMBRE 2015: Continúan los trabajos suspendidos hasta que se tramite el acto administrativo correspondiente	Calderón Cañar, Edgar Miguel	24/12/2015 - 03:20 PM
OCTUBRE 2015: A partir del 1/10/2015 la obra se encuentra suspendida por no existir el aval del Ministerio de Finanzas para elaborar el acto administrativo para implementación de la orden de trabajo Costo + Porcentaje	Calderón Cañar, Edgar Miguel	24/12/2015 - 03:17 PM
SEPTIEMBRE 2015: imprimación de la capa de rodadura. Persisten los problemas de transporte de asfalto del continente a las Islas. HITO 14	Palacios Pesantes, Daniel	05/11/2015 - 11:09 AM
AGOSTO 2015: Continúan con los trabajos de colocación de Base, Sub-Base, e imprimación de la capa de rodadura. Persisten los problemas de transporte de asfalto del continente a las Islas.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	07/09/2015 - 11:18 AM
JULIO 2015: capa rodadura y asfalto para imprimación desde km 14+900 al km 15+370	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	05/08/2015 - 04:04 PM
JUNIO 2015: en este mes se continuó con el mejoramiento de la capa de rodadura, imprimación, limpieza de cunetas y carpeta asfáltica en vía y ciclovía.	Suárez Mendieta, Manuel Orlando	05/08/2015 - 04:04 PM
MAYO 2015: en este mes se continuó con el mejoramiento de la capa de rodadura, imprimación, limpieza de cunetas y carpeta asfáltica en vía y ciclovía.	Palacios Pesantes, Daniel	04/06/2015 - 09:24 AM
ABRIL 2015: se realizaron trabajos de compactación de la Base Clase 2 y trituración de material de agregados, además se continuo con el asfalto de la vía.	Palacios Pesantes, Daniel	04/06/2015 - 09:21 AM
MARZO 2015: Se realizaron trabajos de mantenimiento en el tramo de la vía que se encuentra terminado, como roza de maleza, limpieza de cunetas y bacheo menor. HITO 13.	Palacios Pesantes, Daniel	06/04/2015 - 01:56 PM
FEBRERO 2015: Se realizaron trabajos de mantenimiento en el tramo de la vía que se encuentra terminado, como roza de maleza, limpieza de cunetas y bacheo menor. HITO 13.	Palacios Pesantes, Daniel	09/03/2015 - 08:42 AM
ENERO 2015: Comenzaron los trabajos de preparación de la carpeta de rodadura (asfáltica), y se realizaron trabajos de mantenimiento en el tramo de la vía que se encuentra terminado, como roza de maleza, limpieza de cunetas y bacheo menor. HITO 13.	Palacios Pesantes, Daniel	10/02/2015 - 01:54 PM
DICIEMBRE 2014: Continúan los trabajos de fragmentación de la piedra grande de la mina para la preparación del agregado grueso.	Palacios Pesantes, Daniel	06/01/2015 - 03:46 PM
NOVIEMBRE 2014: Se realizaron trabajos de explotación de canteras y trituración de piedras. Mantenimiento general de la vía.	Palacios Pesantes, Daniel	06/01/2015 - 03:45 PM
Octubre 2014: Se trabaja en dos frentes; de día y noche realizando lo siguiente: está fragmentando la piedra grande en pequeñas de la mina las primicias para la preparación del agregado grueso y acopiando material para producir finos de la mina granillo rojo para la capa de rodadura. Se realizó el rubro capa de rodadura e imprimación desde el km 36+120 al km 36+620. Actualmente se encuentran 32 personas en obra. La maquinaria y equipos utilizados en el proyecto se encuentran operativos. Fiscalización realiza el control de calidad cumpliendo con lo especificado. En la presente semana el contratista no ha introducido material asfáltico al proyecto.	Palacios Pesantes, Daniel	06/11/2014 - 06:10 PM
SEPTIEMBRE 2014: Se ejecutaron los siguientes trabajos Agua para Control de Polvo, imprimación, Capa de Rodadura desde km 35+260 al km 36+120, transporte de mezcla asfáltica y marcas en el pavimento (pintura) desde el km 0+000 al km 4+500. HITO 8	Palacios Pesantes, Daniel	20/10/2014 - 08:29 AM
AGOSTO 2014: Persisten los problemas con el transporte de material y equipo desde el Continente. HITO 8 y 9.	Palacios Pesantes, Daniel	11/09/2014 - 10:30 PM
JULIO 2014: Se continúa con la producción de agregados para la mezcla asfáltica y base. HITO 8 y 9.	Palacios Pesantes, Daniel	06/08/2014 - 03:29 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 2014: Se completa el 50% del acabado de la obra básica existente y se continúa con la producción de agregados para la mezcla asfáltica y base. HITO 5 y 6.	Palacios Pesantes, Daniel	07/06/2014 - 02:26 PM
Abril 2014: Se continua con la producción de agregados para la mezcla asfáltica y base. HITO 5 y 6	Palacios Pesantes, Daniel	07/06/2014 - 02:25 PM
Marzo 2014: Producción de agregados para mezcla asfáltica y base. HITO 6 y 9	Palacios Pesantes, Daniel	07/06/2014 - 02:23 PM
Febrero 2014: Producción de agregados para mezcla asfáltica y base. HITO 8 Y 9	Palacios Pesantes, Daniel	20/03/2014 - 05:42 PM
Enero 2014: Producción de agregados para mezcla asfáltica y base. HITO 8 Y 9	Palacios Pesantes, Daniel	20/03/2014 - 05:42 PM
DICIEMBRE 2013: Producción de agregados para mezcla asfáltica y base. HITO 8 Y 9	Palacios Pesantes, Daniel	20/03/2014 - 05:42 PM
Noviembre 2013: La contratista aun no completa el recapeo de la pista del Aeropuerto de Baltra por lo que no ha podido intervenir todavía en trabajos correspondientes a la calzada de la carretera Puerto Ayora-Canal de Itabaca. Se ejecutan trabajos de Base y Hormigón para prolongación de alcantarillas en la Ciclovía, tramo Puerto Ayora - Santa Rosa. HITO 8, 9, 10, 11 y 12.	Palacios Pesantes, Daniel	09/12/2013 - 06:11 AM
Octubre 2013: La contratista aun no completa el recapeo de la pista del Aeropuerto de Baltra por lo que no ha podido intervenir todavía en trabajos correspondientes a la calzada de la carretera Puerto Ayora-Canal de Itabaca.	Palacios Pesantes, Daniel	06/11/2013 - 03:12 PM
Septiembre 2013: Por disposición superior los trabajos correspondientes a mejoramiento de la estructura y colocación de la carpeta asfáltica fueron desplazados para permitir que el contratista realice el recapeo de la pista del aeropuerto de Baltra, considerado como prioridad. Colocación de Base Clase 1 en la ciclovía sector Santa Rosa Bellavista.	Palacios Pesantes, Daniel	30/09/2013 - 03:05 PM
Agosto 2013: Por disposición superior los trabajos correspondientes a mejoramiento de la estructura y colocación de la carpeta asfáltica fueron desplazados para permitir que el contratista realice el recapeo de la pista del aeropuerto de Baltra, considerado como prioridad.	Palacios Pesantes, Daniel	09/09/2013 - 10:36 AM
Julio 2013: Se realiza trabajos de prolongación de alcantarillas sector de Ciclovía tramo Bellavista Santa Rosa, acabado de obra básica. Junio 2013: Se baja el asfalto a los tanques estacionarios	Ortiz Revelo, Marlon Anibal	01/08/2013 - 09:20 AM
Mayo 2013: Prolongación de alcantarillas desalojo de material de excavación. Abril 2013: Movimiento de tierras para construcción de ciclovía, limpieza de cunetas, rosa de vegetación. Marzo 2013: Se realizó trabajos preliminares para construcción de ciclovía en tramo Bellavista Santa Rosa.	Ortiz Revelo, Marlon Anibal	05/06/2013 - 09:22 AM
Febrero 2013: Continua proceso de explotación de piedra y transporte al sitio de ubicación de la planta de asfaltos (Mina Granillo rojo). Contratista está armando planta de asfaltos	Calderón Cañar, Edgar Miguel	18/03/2013 - 03:04 PM
Enero 2013: Contratista continua explotando piedra para obtener los materiales necesarios para la mezcla	Calderón Cañar, Edgar Miguel	18/03/2013 - 03:03 PM
Diciembre 2012: Se suscribió el Acta mediante la cual la Comisión Especial resuelve incremento del monto del contrato y la prórroga de 12 meses en el plazo, el contratista a inicios del mes pudo ingresar la parte restante de la planta asfáltica.	Ricaurte Massón, Julio	17/01/2013 - 08:40 AM
NOVIEMBRE: La comisión especial reunida a inicios de noviembre conoció la situación del proyecto y en consideración a la propuesta de construir una nueva gabarra está siendo considerada la aplicación del plazo hasta diciembre del 2013	Calderón Cañar, Edgar Miguel	29/11/2012 - 01:25 PM
OCTUBRE 2012: La gabarra El Morro que está a cargo del Consejo de Gobierno de Galápagos continúa en espera de reparación en los astilleros navales. El contratista al no conseguir en alquiler otra gabarra, propuso la construcción de una nueva.	Calderón Cañar, Edgar Miguel	29/11/2012 - 01:23 PM
Julio-Septiembre 2012: Se mantienen los mismos problemas. Junio 2012: Se mantienen los mismos problemas de movilización de equipos y materiales pese a gestiones con otros armadores. Mayo 2012: Se mantienen los mismos problemas de movilización de equipos y materiales pese a gestiones con otros armadores. Abril 2012: Persisten los problemas para la movilización de equipos y materiales desde el continente. En este periodo el contratista no ha podido ingresar ningún equipo. Contratista se dedica a la producción de agregados de base granular. Marzo 2012: Hasta la presente fecha el contratista no puede disponer del equipo necesario para la ejecución de las obras programadas. Las características rocosas del suelo de la subrasante de la vía no posibilitan la ejecución de los subdrenes considerados para el proyecto. Febrero 2012: Limitaciones en el transporte para el traslado del equipo desde el continente hasta la Isla, impide que el contratista desarrolle trabajos programados	Calderón Cañar, Edgar Miguel	29/11/2012 - 01:20 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Enero-2012: Trituración de material para la obra. Diciembre-2011: Conseción de permisos para la explotación de materiales en las minas autorizadas. Noviembre-2011: Conseción de permisos para la explotación de materiales en las minas autorizadas. Octubre-2011: Trámite para internación de equipos a las islas Galápagos. Septiembre-2011: Trámite para internación de equipos a las islas Galápagos. Agosto-2011: Trámite para internación de equipos a las islas Galápagos.		

Problemas cerrados: 5, Abiertos: 0

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Santa Cruz

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACIÓN: Adjudicación realizada.	3-Adjudicación	17/08/2011		17/08/2011		Sí	1.0
2	PLANEACIÓN:Firma del contrato, ejecutada.	1-Solicitud de Información	18/08/2011		18/08/2011		Sí	1.0
3	EJECUCIÓN: Obra iniciada.	4-Inicio de Trabajo	16/10/2011		16/10/2011		Sí	1.0
4	EJECUCIÓN: Internación de equipo, realizados.	1-Solicitud de Información	31/12/2012		31/12/2012		Sí	6.0
5	EJECUCIÓN: Acabado de obra básica existente al 50% realizado.	5-Entregables Intermedios	16/09/2013		01/05/2014		Sí	6.0
6	EJECUCIÓN: Colocación de base al 50% terminada.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		06/08/2014		Sí	7.0
7	EJECUCIÓN: Instalación de alcantarillas, realizados.	5-Entregables Intermedios	30/09/2013		30/09/2013		Sí	6.0
8	EJECUCIÓN: Acabado de obra básica existente al 100% realizado.	5-Entregables Intermedios	02/10/2013		19/12/2014		Sí	6.0
9	EJECUCIÓN: Colocación de carpeta asfáltica (vía) al 50% terminada.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		17/09/2014		Sí	10.0
10	EJECUCIÓN: Excavación para cunetas y encauzamiento, realizados.	5-Entregables Intermedios	31/10/2013		31/10/2013		Sí	5.0
11	EJECUCIÓN: Colocación de base al 100% terminada.	5-Entregables Intermedios	15/11/2013		17/12/2014		Sí	7.0
12	EJECUCIÓN: Colocación de carpeta asfáltica (ciclovía) al 50% terminada.	5-Entregables Intermedios	22/11/2013		17/12/2014		Sí	8.0
13	EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical al 50% terminada.	5-Entregables Intermedios	30/11/2013		15/08/2015		Sí	7.0
14	EJECUCIÓN: Colocación de carpeta asfáltica (vía) al 100% terminada.	5-Entregables Intermedios	27/12/2013		31/08/2016		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
15	EJECUCIÓN: Colocación de carpeta asfáltica (ciclovía) al 100% terminada.	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		23/02/2017		Sí	8.0
16	EJECUCIÓN: Señalización horizontal y vertical al 100% terminada.	5-Entregables Intermedios	31/12/2013		28/02/2017		Sí	7.0
17	CIERRE: Acta entrega recepción provisional, realizados.	9-Entregables Formales	03/02/2014		20/12/2018		Sí	1.0
18	CIERRE: Liquidación económica del proyecto, realizada.	9-Entregables Formales	30/09/2014		25/07/2017		Sí	1.0
19	CIERRE: Acta de entrega Recepción Definitiva, realizados.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	04/10/2014	20/06/2019			No	1.0
20	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	09/09/2019	09/09/2019			No	2.0
21	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	V - Verificación ejecutiva	22/10/2019	22/10/2019			No	1.0
22	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	V - Verificación ejecutiva	22/10/2019	22/10/2019			No	1.0
23	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendietes por liquidar - suscrito MEF	V - Verificación ejecutiva	22/11/2019	22/11/2019			No	1.5
24	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	V - Verificación ejecutiva	31/12/2019	31/12/2019			No	0.5

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	Verificación en territorio	Tapia Núñez, Gladys Lorena	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	30/06/2017
2	Constatación carretera Puerto Ayora	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	26/01/2017
3	Constatación avance obra carretera Puerto Ayora	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	28/07/2016
4	Avance de obra carretera Puerto Ayora - Canal de Itabaca	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	29/12/2015
5	CONSTATACIÓN AVANCE CARRETERA PUERTO AYORA	Cruz Bedón, Eliécer Plutarco	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	29/05/2015
6	Constatación de avance de la obra Rehabilitación y refozamiento de la carretera Puerto Ayora-Canal Itabaca de 39,70 Kms. de longitud	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	14/03/2014
7	Avance de obra de carretera Pto. Ayora - canal Itabaca	Torres Pallo, Jorge	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	24/01/2014
8	Instalación de alcantarillas	Torres Pallo, Jorge Alfredo	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	23/09/2013
9	Rehabilitación y reforzamiento de la carretera Puerto Ayora- Canal Itabaca a cargo de Cosntructora Molina	Torres Pallo, Jorge Alfredo	{PR} - Provincia - GALÁPAGOS	03/05/2013

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	3,486,971.04
Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,737,599.88 **
Costo Total:	9,882,716.84
Total Devengado:	13,200,255.40
% Costo Total Devengado:	133.57 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 133.57 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	7,865,756.38	537,344.48	0.00	8,403,100.86
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	7,656,616.42	537,344.48	0.00	8,193,960.90
Ppto. Codificado	13,884,904.89	537,344.48	0.00	14,422,249.37
Ppto. Comprometido	13,330,846.46	0.00	0.00	13,330,846.46
Planeado - Codificado (2019)		0.00		
Programado a Devengar	8,414,974.07	537,344.48	0.00	8,952,318.55
Ppto. Devengado	13,200,255.40	0.00	0.00	13,200,255.40
Pagado Real	10,170,895.07	0.00	0.00	10,170,895.07
Estimado a fin de año	* 13,200,255.40	0.00	0.00	13,200,255.40
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-4,785,281.33	537,344.48	0.00	-4,247,936.85
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 156.87 %	0.00 %	0.00 %	147.45 %
Ppto. Codificado 998	2,954,207.01	0.00	0.00	2,954,207.01
Ppto. Devengado 998	2,884,602.05	0.00	0.00	2,884,602.05

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

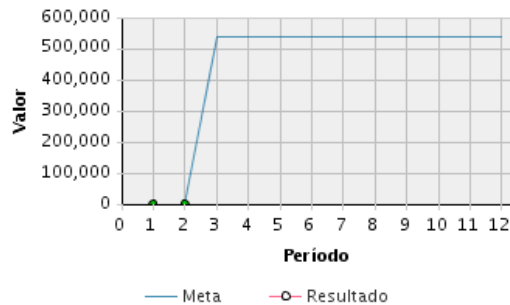

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	537,344.48		537,344.48				
Abr	0.00		537,344.48				
May	0.00		537,344.48				
Jun	0.00		537,344.48				
Jul	0.00		537,344.48				
Ago	0.00		537,344.48				
Sep	0.00		537,344.48				
Oct	0.00		537,344.48				
Nov	0.00		537,344.48				
Dic	0.00		537,344.48				
Total	537,344.48	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
14	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ACTA 451 DEL 03-07-2015	ACTA_451_ITABACA_3_julio_2015.pdf	05/01/2017
2	ACTA 451 DEL 18-12-2014	ACTA_DE_COMISIÓN_ESPECIAL_DECRETO_EJECUTIVO_05/01/2017.pdf	05/01/2017
3	ACTA 451 DEL 28-11-2016	ACTA_451_REHABILITACION_Y_REFORZAMIENTO_CARRERA_PUERTO_AYORA-CANAL_DE_ITABACA.pdf	28/12/2016
4	Acta de Compromiso y ampliación de plazo hasta 31/12/2012	C.03.pdf	18/03/2014
5	ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL	ACTA_DE_SUSPENSIÓN_TEMPORAL.pdf	05/11/2015
6	ACTA REINICIO TRABAJOS	ACTA_REINICIO_TRABAJOS_ITABACA.PDF	10/03/2017
7	ACTA SUSPENSION TEMPORAL 4	ACTA_DE_SUSPENSION_TEMPORAL_No_4.pdf	18/09/2017
8	Acta Suspensión 3	ACTA_DE_SUSPENSION_3.PDF	03/03/2017
9	ASOCIACION HITO 017: Suspensión Temporal 3	Suspensión_Temporal_No_3.PDF	13/01/2017
10	CEDULA PRESUPUESTARIA MES DICIEMBRE 2016	CEDULA_PRESUPUESTARIA_DICIEMBRE_2016.pdf	05/01/2017
11	CEDULAS PRESUPUESTARIAS	CÉDULAS_PRESUPUESTARIAS.pdf	28/12/2016
12	Contrato Complementario No. 1	A.02.pdf	18/03/2014
13	Contrato de Ejecución de Obra.	A.01.pdf	18/03/2014
14	DICTAMEN PRIORIDAD	DICTAMEN_ITABACA.pdf	28/12/2016
15	Foto agosto 2012 Puerto Ayora - canal de Itabaca	C.01.pdf	18/03/2014
16	Informe Ejecutivo SITOP, Abril 2014.	B.27.pdf	21/04/2014
17	Informe Ejecutivo SITOP, OCTUBRE 2014.	3652_IE_OCTUBRE2015.pdf	05/11/2015
18	Informe Ejecutivo SITOP, SEPTIEMBRE 2014.	3652_IE_SEPTIEMBRE2015.pdf	05/11/2015
19	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2014.	B.34.pdf	03/02/2015
20	Informe Ejecutivo SITOP, abril 2012.	B.03.pdf	18/03/2014
21	Informe Ejecutivo SITOP, abril 2013.	B.15.pdf	18/03/2014
22	Informe Ejecutivo SITOP, Abril 2015.	B.38.pdf	02/06/2015
23	Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2012.	B.07.pdf	18/03/2014
24	Informe Ejecutivo SITOP, agosto 2013.	B.19.pdf	18/03/2014
25	Informe Ejecutivo SITOP, Agosto 2014.	B.31.pdf	01/09/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
26	Informe Ejecutivo SITOP, Agosto 2015.	B.42.pdf	12/10/2015
27	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2012.	B.11.pdf	18/03/2014
28	Informe Ejecutivo SITOP, diciembre 2013.	B.23.pdf	18/03/2014
29	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2013.	B.12.pdf	18/03/2014
30	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2014.	B.24.pdf	18/03/2014
31	Informe Ejecutivo SITOP, enero 2015.	B.35.pdf	03/02/2015
32	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2012.	B.01.pdf	18/03/2014
33	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2013.	B.13.pdf	18/03/2014
34	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2014.	B.25.pdf	18/03/2014
35	Informe Ejecutivo SITOP, febrero 2015.	B.36.pdf	04/03/2015
36	Informe Ejecutivo SITOP, julio 2012.	B.06.pdf	18/03/2014
37	Informe Ejecutivo SITOP, julio 2013.	B.18.pdf	18/03/2014
38	Informe Ejecutivo SITOP, Julio 2014.	B.30.pdf	04/08/2014
39	Informe Ejecutivo SITOP, Julio 2015.	B.41.pdf	05/08/2015
40	Informe Ejecutivo SITOP, junio 2012.	B.05.pdf	18/03/2014
41	Informe Ejecutivo SITOP, junio 2013.	B.17.pdf	18/03/2014
42	Informe Ejecutivo SITOP, junio 2014.	B.29.pdf	07/07/2014
43	Informe Ejecutivo SITOP, Junio 2015.	B.40.pdf	01/07/2015
44	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2012.	B.02.pdf	18/03/2014
45	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2013.	B.14.pdf	18/03/2014
46	Informe Ejecutivo SITOP, marzo 2014.	B.26.pdf	18/03/2014
47	Informe Ejecutivo SITOP, Marzo 2015.	B.37.pdf	10/04/2015
48	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2012.	B.04.pdf	18/03/2014
49	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2013.	B.16.pdf	18/03/2014
50	Informe Ejecutivo SITOP, mayo 2014.	B.28.pdf	09/06/2014
51	Informe Ejecutivo SITOP, Mayo2015.	B.39.pdf	02/06/2015
52	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2012.	B.10.pdf	18/03/2014
53	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2013.	B.22.pdf	18/03/2014
54	Informe Ejecutivo SITOP, noviembre 2014.	B.33.pdf	03/12/2014
55	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2012.	B.09.pdf	18/03/2014
56	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2013.	B.21.pdf	18/03/2014
57	Informe Ejecutivo SITOP, octubre 2014.	B.32.pdf	06/11/2014
58	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2012.	B.08.pdf	18/03/2014
59	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2013.	B.20.pdf	18/03/2014
60	Informe Ejecutivo SITOP, septiembre 2014.	B.31.pdf	06/10/2014
61	Informe Ejecutivo SITOP, Septiembre 2015.	B.43.pdf	12/10/2015
62	Informe Fiscalización Febrero 2016	Informe_Fiscalización_febrero_2016.pdf	05/01/2017
63	INFORME FISCALIZACION ENERO 2016	Informe_Fiscalización_enero_2016.pdf	05/01/2017
64	Informe Fiscalización noviembre 2016	Informe_Fiscalización_noviembre_2016.pdf	05/01/2017
65	Informe Fiscalización octubre 2016	Informe_Fiscalización_octubre_2016.pdf	05/01/2017
66	Orden Cambio No.3	ORDEN_CAMBIO_No.3.pdf	05/01/2017
67	Orden Cambio No.4	ORDEN_CAMBIO_No.4.pdf	05/01/2017
68	Orden Cambio No.5	ORDEN_CAMBIO_No.5.pdf	05/01/2017
69	Orden de Cambio No. 1	A.03.pdf	18/03/2014
70	Orden de Cambio No. 2	A.04.pdf	18/03/2014
71	PLANILLA 001 CTO. ORIGINAL	Planillas_1.pdf	05/01/2017
72	PLANILLA 002 CTO. ORIGINAL	Planillas_2.pdf	05/01/2017
73	PLANILLA 003 CTO. ORIGINAL	Planillas_3.pdf	05/01/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
74	PLANILLA 004 CTO. ORIGINAL	Planilla__4.pdf	05/01/2017
75	PLANILLA 005 CTO. ORIGINAL	Planillas_5.pdf	05/01/2017
76	PLANILLA 006 CTO. ORIGINAL	Planilla_6.pdf	05/01/2017
77	PLANILLA 007 CTO. ORIGINAL	Planilla_7_Aug_29_2013_(1).PDF	05/01/2017
78	PLANILLA 008 CTO. ORIGINAL	Planilla_8_-_10_de_octubre_del_2013.pdf	05/01/2017
79	PLANILLA 009 CTO. ORIGINAL	Planilla_9.pdf	05/01/2017
80	PLANILLA 010 CTO. ORIGINAL	Planilla_10.pdf	05/01/2017
81	PLANILLA 011 CTO. ORIGINAL	Planilla_11.pdf	05/01/2017
82	PLANILLA 012 CTO. ORIGINAL	planilla_12.pdf	05/01/2017
83	PLANILLA 013 CTO. ORIGINAL	Planilla_13.pdf	05/01/2017
84	PLANILLA 014 CTO. ORIGINAL	Planilla_14.PDF	05/01/2017
85	PLANILLA 015 CTO. ORIGINAL	Planilla_15.PDF	05/01/2017
86	PLANILLA 016 CTO. ORIGINAL	Planilla_16.pdf	05/01/2017
87	PLANILLA 017 CTO. ORIGINAL	Planilla_17.PDF	05/01/2017
88	PLANILLA 018 CTO. ORIGINAL	Planilla_18.pdf	05/01/2017
89	PLANILLA 019 CTO. ORIGINAL	Planilla_19.PDF	05/01/2017
90	PLANILLA 020 CTO. ORIGINAL	Planilla_20.PDF	05/01/2017
91	PLANILLA 021 CTO. ORIGINAL	Planilla_21.pdf	05/01/2017
92	PLANILLA 022 CTO. ORIGINAL	Planilla_22.pdf	05/01/2017
93	PLANILLA 023 CTO. ORIGINAL	Planilla_23.pdf	05/01/2017
94	PLANILLA 024 CTO. ORIGINAL	Planilla_24.pdf	05/01/2017
95	PLANILLA 025 CTO. ORIGINAL	planilla_25_.pdf	05/01/2017
96	Pliegos	PLIEGOS.pdf	05/01/2017
97	Proyecto Priorizado SENPLADES	C.02.doc	18/03/2014
98	SENPLADES	SENPLADES_-2011-150-1_ITABACA.pdf	28/12/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Delgado León, Andrés Glen	Director Provincial del Guayas	Director Distrital del Guayas	adelgado@mtop.gob.ec	
Suárez Mendieta, Manuel Orlando	Líder de Proyecto	Coordinador Técnico de Infraestructura Provincial	msuarez@mtop.gob.ec	023974600
Valle Zuñiga, Hugo Arturo	Subsecretario Regional 5	Subsecretario Regional 5	hvalle@mtop.gob.ec	023974600

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
37470_1.jpg	04/05/2016
