

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Subsecretaría Zona 6

Dirección Provincial Cañar

PROYECTO: K020 MTOP-Reconstrucción Vía Rápida Cuenca-Azogues-Biblián, incluido ampliación Tramo El Descanso-Azogues-Biblián de 42 km long.

Líder del Proyecto:	Soto Romero, José Gerardo (jsoto@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Jaramillo Vintimilla, José Francisco	Programas Relacionados:	Provincia - Azuay, Provincia - Cañar, RECONSTRUCCIONVIA RAPIDA CUENCA- AZOGUES-BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACION TRAMOEL DESCANSO- AZOGUES-BIBLIAN, SECTOR PRODUCCIÓN, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
Titular:	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	104,225,734.57
CUP:	175200000.000.0.374212	TIR:	47.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	189,622,390.98
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	136,051,254.71
Localidad de Gestión:	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/08/2013 - 30/06/2023
Fecha de última actualización:	31/07/2019	Fecha de Fin Base:	30/04/2019
Modificado por:	Cuasapaz Hernández, Nelson Fernando	Fecha del siguiente Hito:	31/07/2019

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCION:

El proyecto de inversión que se detalla a continuación se encuentra ubicado en los cantones de Cuenca y Azogues, de tal manera que se hace un breve diagnóstico de la zona de influencia del proyecto.

La Ciudad de Santa Ana de los cuatro Ríos de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay y del Cantón Cuenca, se encuentra localizada en la Región Centro-Sur de la República del Ecuador, a una altura promedio de 2.560 m sobre el nivel del mar. Cuenca es la tercera ciudad más poblada del Ecuador, después de Guayaquil y Quito, con 329.928 habitantes en el área administrativa urbana; en datos reales de aglomeración urbana con las zonas suburbanas en la que se incluyen cabeceras rurales ya fusionadas con el casco urbano en las que se cuenta a Baños, Ricaurte, San Joaquín, Turi y Sayausi, determinan la población real de la ciudad de Cuenca con 385.456 habitantes. También cabe mencionar que el cantón en su conjunto tiene 505.585 habitantes. Todos estos datos según el último censo realizado el 28 noviembre de 2010 siendo la zona urbana la que posee la mayor cantidad de habitantes. Eso se debe, en parte, al incremento de las fuentes de trabajo disponibles y a la construcción de viviendas. La conurbación de Cuenca que incluye el cantón homónimo, al igual que los cantones de la Provincia de Cañar de Azogues, Biblián y Déleg pone la población metropolitana a 602.566 en la denominada conurbación Cuenca-Azogues

PROPOSITO: Permitir un mayor y mejor desarrollo socio - económico de las poblaciones involucradas al contar con una vía que permite mejorar la capacidad de circulación vehicular, imagen y seguridad, de la población.

LINEA BASE:

La carretera Vía Rápida Cuenca - Azogues - Biblián forma parte del Eje Vial E35 que conecta las provincias de Azuay y Cañar y constituye la arteria principal de conexión con el centro y norte del país, su longitud es de 43.8 km y cruza áreas de expansión urbana de las ciudades de Cuenca y Azogues.

La vía rápida Cuenca - Azogues - Biblián, prevee las siguientes actividades: 43,8 km de pavimento flexible colocados, 3 puentes rehabilitados, 1 puente construido, 22 kilómetros de subdrenes construidos, 21 km de base colocados, 42 accesos rehabilitados, 100 % de señalización colocada (guardavías, preventiva, informativa, reglamentaria), 6 fallas geológicas intervenidas, 12 pasos peatonales.

DATOS GENERALES

Descripción

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO.

Los beneficiarios directos del proyecto serán los pobladores de las provincias de Azuay y Cañar y en forma directa todos los del área de influencia, es decir los 594.466 habitantes (según el censo del 2010) los mismos que están divididos en 280.778 hombres y 315.688 mujeres.

El proyecto en sí se ubica entre las provincias de Azuay y Cañar, y constituye la puerta de entrada y salida hacia las ciudades de Cuenca y Azogues capitales de provincias antes mencionadas, además de ambas ser consideradas

OBJETIVO GENERAL:

Reconstruir la vía rápida Cuenca - Azogues - Biblían incluido ampliación tramo El Descanso - Azogues - Biblían de 43.80 km de longitud.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- .Construcción de la obra civil
- .Desarrollo Territorial
- .Gestión Administrativa del Proyecto
- .Mantenimiento

Beneficios Cualitativos

- Reconstrucción de 43.8 km de vía.
- Garantizar seguridad a los usuarios.
- Ahorro en los tiempos de viaje.

Tipo de Beneficiario

Los beneficiarios directos del proyecto serán los pobladores de las provincias de Azuay y Cañar y en forma directa todos los del área de influencia, es decir los 594.466 habitantes (según el censo del 2010) los mismos que están divididos en 280.778 hombres y 315.688 mujeres. El cuadro que se presenta a continuación permite observar la distribución por sexo y área de los cantones beneficiados directamente.

Los beneficiarios indirectos serán las poblaciones tanto de la parte costanera como la del norte del país

Restricciones

Tiempo: El proyecto inició en agosto de 2013 con un plazo original de 20 meses para la construcción y 48 meses de mantenimiento. Sin embargo, existió ampliación de plazo por lo cual la etapa constructiva finalizó en noviembre 2018, fecha en la cual inició el periodo de mantenimiento de 4 años.

Costo: El valor del contrato original fue de \$ 80.827.338,50 (incluido IVA), el cual sufrió modificaciones debido a incremento de cantidades de obra y la inclusión de nuevos rubros, ascendiendo a un total de \$ 136.363.130,70.

Calidad: La infraestructura implementada para la Reconstrucción de la vía Rápida Cuenca - Azogues - Biblían debe cumplir lo siguiente:

- Brindar adecuados niveles de seguridad, servicialidad y comodidad a los usuarios de esta vía
- Contar con una carretera debidamente señalizada con seguridad vial.
- Cumplir con las especificaciones técnicas, cumpliendo con los estándares de calidad óptimos

Recursos: Equipo Caminera para obras civiles y personal calificado de la Empresa Hidalgo e Hidalgo S. A, los mismos que serán controlados mediante ensayos realizados con equipo de laboratorio de suelos, y personal especializado del Consorcio Austrovías. Los materiales se extraen del cerro tamuga y de la Mina Cochancay 1, 2 y 3.

Riesgos: La presencia de fallas geológicas y la deficiencia en la construcción causaría daños en la infraestructura vial.

Alcance: Se espera contar con una vía con las siguientes características:

- 43,8 km de pavimento flexible colocados.
- 3 puentes rehabilitados.
- 1 puente construidos.
- 22 kilómetros de subdrenes construidos.
- 21 km de base colocados
- 42 accesos rehabilitados.
- 100 % de señalización colocada (guardavías, preventiva, informativa, reglamentaria).
- 6 fallas geológicas intervenidas.
- 12 pasos peatonales

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 60.51 %

Fecha de Inicio: 01/08/2013

Fecha de Fin: 30/06/2023

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

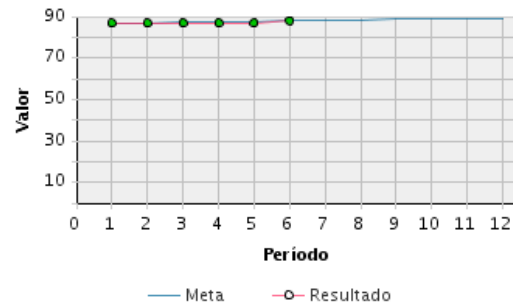

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
	87 %	87 %	87 %	87 %	87 %	88 %	88 %	88 %	89 %	89 %	89 %	89 %
	Avance real acumulado											
	87 %	87 %	87 %	87 %	87 %	88 %						
	Estado											
	●	●	●	●	●	●						

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JUNIO 2019 El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas. ACTIVIDADES REALIZADAS Limpieza de cunetas en los tre tramos. Limpieza de derrumbes en el tramo 2. Limpieza de señales verticales en el tramo 1. Limpieza de material en la vía. Retiro de guardavías dañados por causa de accidentes de tránsito y reposición de los mismos, dicha actividad se realiza con personal y maquinaria de la institución.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/07/2019 - 10:45 AM
MAYO 2019 El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas, se realiza la inspección al paso peatonal de Nulti, en la que se da detalles por parte del Especialista Estructural para corregir la traba antisísmica.	Soto Romero, José Gerardo	04/06/2019 - 09:35 AM
ABRIL 2019 El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas, se continua a la espera el diseño del Especialista estructural para la fundición de la traba antisísmica en el paso peatonal de Nulti.	Soto Romero, José Gerardo	02/05/2019 - 03:54 PM
MARZO 2019 El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas, se continua a la espera el diseño del Especialista estructural para la fundición de la traba antisísmica en el paso peatonal de Nulti.	Soto Romero, José Gerardo	03/04/2019 - 10:54 AM
FEBRERO 2019 El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas, además se realiza intervención en el paso peatonal de Nulti que fue afectado por el sismo del 21 de febrero de 2019.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	02/03/2019 - 10:14 AM
ENERO 2019 El proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	05/02/2019 - 12:38 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
DICIEMBRE 2018 La obra se terminó el 28 de julio de 2018 , el proyecto ha sido recibido provisionalmente, la contratista realiza el mantenimiento rutinario de la vía con el empleo de dos microempresas.	Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	03/01/2019 - 03:21 PM
NOVIEMBRE 2018 La obra se terminó el 28 de julio de 2018 , el proyecto ha sido recibido provisionalmente, el 23 de noviembre de 2018 se inicia la etapa de mantenimiento.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/12/2018 - 04:56 PM
OCTUBRE 2018 La obra se terminó el 28 de julio de 2018 , los miembros de comisión para la recepción provisional han informado a la Subsecretaría sobre las observaciones hechas en el recorrido de la vía en campo.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/11/2018 - 03:47 PM
SEPTIEMBRE 2018 La obra se terminó el 28 de julio de 2018 , con fecha 25 de septiembre de 2018, se designa los miembros de comisión para la recepción provisional, los mismos que realizan la inspección en campo el 28 de septiembre de 2018.	Dután Sanango, Italo Medardo	05/10/2018 - 10:58 AM
AGOSTO 2018 La obra se terminó el 28 de julio de 2018 , se encuentra en trámite la quidación económica del la obra, previo a la recepción provisional.	Buestan Toral, José Remigio	05/09/2018 - 04:33 PM
JULIO 2018 La contratista realiza los trabajos de construcción de pasos peatonales, colocación de carpeta asfáltica en los caminos de accesos a la vía rápida, hasta el 28 de julio de 2018 , fecha en la cual se terminó la etapa de construcción, se encuentra en trámite la quidación económica del la obra.	Dután Sanango, Italo Medardo	03/08/2018 - 10:31 AM
JUNIO 2018 La contratista realiza los trabajos de construcción de pasos peatonales, colocación de carpeta asfáltica en los caminos de accesos a la vía rápida, hasta el mes de junio 2018 no se ha efectivizado el anticipo por parte del Minsiterio de Finanzas correspondiente al contrato complementario Nro. 3	Dután Sanango, Italo Medardo	05/07/2018 - 12:03 PM
MAYO 2018 Con fecha 13 de mayo de 2018, la Contratista suspende los trabajos, debido a la falta de efectivización del anticipo por parte del Minsiterio de Finanzas correspondiente al contrato complementario Nro. 3	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/06/2018 - 04:29 PM
ABRIL 2018 Con fecha 23 de abril de 2018, se firma el acta de levantamiento de Suspensión de Plazo Temporal del contrato "Reconstrucción de la vía rápida: Cuenca - Azogues - Biblián" con la cual se resuelve reanudar los trabajos del proyecto indicado. Además se ha firmado un nuevo contrato complementario para la terminación del contrato.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	04/05/2018 - 12:38 PM
MARZO 2018 El proyecto se encuentra suspendido desde el 16 de febrero de 2018, se encuentra en trámite la aprobación del AVAL para la obtención de recursos para el nuevo contrato complementario.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/04/2018 - 12:23 PM
FEBRERO 2018 El proyecto se encuentra suspendido desde el 16 de febrero de 2018, previo a la fecha de suspensión se realizó la colocación de carpeta asfáltica en los caminos de acceso, construcción del puente Ayancay, y pasos peatonales.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:14 AM
ENERO 2018 El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la construcción del puente Ayancay, colocación de carpeta asfáltica en el distribuidor del Valle y construcción de pasos peatonales. El proyecto no ha sido incluido en el PAI 2018, se ha solicitado un contrato complementario Nro. 3, el mismo que ésta en trámite para su aprobación.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	23/03/2018 - 10:12 AM
DICIEMBRE 2017	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/01/2018 - 04:26 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, hormigón lanzado para estabilización de taludes, construcción del puente Ayancay, colocación de carpeta asfáltica en el distribuidor del Valle y construcción de pasos peatonales. Se ha solicitado un contrato complementario Nro. 3, el mismo que ésta en trámite para su aprobación.		
NOVIEMBRE 2017 El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, hormigón lanzado para estabilización de taludes, construcción del puente Ayancay, colocación de carpeta asfáltica en el distribuidor del Valle y construcción de pasos peatonales. Se ha solicitado un contrato complementario Nro. 3, el mismo que cuenta con el AVAL respectivo y ésta en trámite para su aprobación.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/12/2017 - 03:28 PM
OCTUBRE 2017 Mediante reunión de la Comisión Especial 451 se amplía el plazo en 120 días a partir del 28 de octubre de 2017 para la construcción del puente Ayancay, para terminar la obra del Contrato complementario 2 que se retrasó debido a la terminación del convenio de la extracción de materiales del cerro Tamuga, restricciones de libre circulación por deslizamientos del cerro Tahuall. El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, fundición de cunetas, y hormigón lanzado para estabilización de taludes, construcción de zapatas izquierda y derecha puente Ayancay, y construcción de pasos peatonales.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 08:39 PM
SEPTIEMBRE 2017 Mediante reunión de la Comisión Especial 451 se amplía el plazo en 120 días a partir del 28 de octubre de 2017 para la construcción del puente Ayancay, para terminar la obra del Contrato complementario 2 que se retrasó debido a la terminación del convenio de la extracción de materiales del cerro Tamuga, restricciones de libre circulación por deslizamientos del cerro Tahuall. El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, fundición de cunetas, y hormigón lanzado para estabilización de taludes, construcción de zapatas izquierda y derecha puente Ayancay, y construcción de pasos peatonales.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	01/11/2017 - 10:33 AM
SEPTIEMBRE 2017 Mediante reunión de la Comisión Especial 451 se amplía el plazo en 120 días a partir del 28 de octubre de 2017 para la construcción del puente Ayancay, para terminar la obra del Contrato complementario 2 que se retrasó debido a la terminación del convenio de la extracción de materiales del cerro Tamuga, restricciones de libre circulación por deslizamientos del cerro Tahuall. El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, se interviene en la colocación de guardavías, fundición de cunetas, y hormigón lanzado para estabilización de taludes, y conformación de cajera del intercambiador del Valle, construcción de pasos peatonales.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/10/2017 - 12:17 PM
AGOSTO 2017 El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, Los trabajos avanzan con normalidad Se interviene en la conformación de la estructura de pavimento en cajeras, tendido de base y carpeta asfáltica en ampliación de la calzada, fundición de beredas, además se realiza señalización horizontal y construcción de los pasos peatonales.	Chaca Álvarez, Ivan Patricio	05/09/2017 - 05:39 PM
JULIO 2017 El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, Los trabajos avanzan con normalidad Se interviene en la estabilización del tramo Turi Chico y Turi Totoras; Conformación de la estructura de pavimento en cajeras, tendido de base y carpeta asfáltica en ampliación de la calzada, además se realiza señalización horizontal y construcción de los pasos peatonales. Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado.	García González, Mariana Alexandra	05/08/2017 - 08:42 AM
JUNIO 2017 El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista HIDALGO E HIDALGO, Los trabajos avanzan con normalidad	García González, Mariana Alexandra	04/07/2017 - 03:28 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Se interviene en la estabilización del tramo Turi Chico y Turi Totoras; Colocación de Hormigón lanzado en el km 10+800-11+200; En el tramo 2 se ejecuta rubros de fresado, colocación de base asfáltica y carpeta asfáltica y señalización horizontal y construcción de los pasos peatonales. Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado.		
MAYO 2017 El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista, Los trabajos avanzan con normalidad Se interviene en el sitio crítico Turi Chico, se coloca material de base y carpeta asfáltica en el Tramo 2 del proyecto, se realizan trabajos de señalización horizontal en el tramo 2, construcción de pasos peatonales. Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado.	Guillen Luna, Andrés Ismael	01/06/2017 - 11:14 AM
ABRIL 2017 El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista, Los trabajos avanzan con normalidad Se interviene en el sitio crítico Turi Chico, se coloca material de base y carpeta asfáltica en el Tramo 2 del proyecto, se realizan trabajos de señalización horizontal en el tramo 2, construcción de pasos peatonales. Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado.	García González, Mariana Alexandra	05/05/2017 - 12:05 PM
MARZO 2017 El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista, Los trabajos avanzan con normalidad Se encuentran colocando carpeta asfáltica en el tramo II, señalización vertical en el tramo II Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/04/2017 - 12:13 PM
FEBRERO 2017 El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista, Los trabajos avanzan con normalidad Se encuentran colocando carpeta asfáltica en el tramo II Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.	Guillen Luna, Andrés Ismael	03/03/2017 - 12:19 PM
ENERO 2017 El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto Se encuentran colocando carpeta asfáltica en quimandel en el km 2+300 del tramo III Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.	Guillen Luna, Andrés Ismael	03/02/2017 - 11:31 AM
DICIEMBRE 2016 El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto Se encuentran realizando trabajos de estabilización en la falla de quimandel en el km 2+300 del tramo III Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/01/2017 - 06:58 PM
NOVIEMBRE 2016 El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto Se encuentran realizando trabajos de estabilización en la falla de quimandel en el km 2+300 del tramo III Los trabajos se están ejecutando dentro del cronograma valorado Esperando la aprobación para que se legalice el acto administrativo.	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/12/2016 - 02:20 PM
OCTUBRE 2016 El proyecto se encuentra en ejecución a cargo de la compañía contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto	Guillen Luna, Andrés Ismael	05/11/2016 - 06:13 PM
SEPTIEMBRE 2016	Guillen Luna, Andrés Ismael	04/10/2016 - 07:33 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El proyecto se encuentra en ejecucion a cargo de la compania contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto		
AGOSTO 2016 : El proyecto se encuentra en ejecucion a cargo de la compania contratista los trabajos se reiniciaron desde el mes de agosto	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/09/2016 - 06:54 PM
JULIO 2016: La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero del 2016.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/08/2016 - 01:47 PM
JUNIO 2016: La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero del 2016.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/07/2016 - 12:25 PM
MAYO 2016: La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos economicos. la compañía esta realizando el mantenimiento de la via, con la limpieza de derrumbes.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/06/2016 - 07:41 PM
ABRIL 2016: La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos economicos. la compañía esta realizando el mantenimiento de la via.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	02/05/2016 - 03:17 PM
MARZO 2016: La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos economicos. la compañía esta realizando el mantenimiento de la via.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/04/2016 - 08:50 PM
FEBRERO 2016: La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos economicos. la compañía esta realizando el mantenimiento de la via.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/03/2016 - 05:10 PM
ENERO 2016: La obra se encuentra suspendida desde el 1 de enero por falta de recursos economicos. la compañía esta realizando el mantenimiento de la via.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	11/02/2016 - 08:53 PM
DICIEMBRE 2015: Se continua construyendo cunetas y bordillos en el tramo 2, del Km 22+000 al 34+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2016 - 07:27 AM
NOVIEMBRE 2015: Se continua construyendo cunetas y bordillos en el tramo 2, del Km 22+000 al 34+000. y la construccion de los redondeles en el tramo 2.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/12/2015 - 10:13 AM
OCTUBRE 2015: Se esta construyendo cunetas y bordillos en el tramo 2, del Km 22+000 al 34+000. y continua la construccion de los redondeles en el tramo 2.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/11/2015 - 10:14 PM
SEPTIEMBRE 2015 Se esta construyendo cunetas y bordillos del Km 22+000 al 34+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/10/2015 - 04:15 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
y continua la construccion de los redondeles en estas abscisas.		
AGOSTO 2015 Se estan realizando trabajos de estabilizacion del sitio critico en el sector del Guzho Km 1+000. Se esta construyendo cunetas y bordillos del Km 22+000 al 34+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2015 - 11:49 AM
JULIO 2015 Se continua con la estabilizacion del sitio critico en el sector del Guzho Km 1+000. En el Km 4+3000 se esta tendiendo asfalto. Se esta construyendo cunetas y bordillos del Km 22+000 al 34+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/08/2015 - 01:58 PM
JUNIO 2015 Se continua con el tendido de carpeta asfaltica en las abscisas 20 + 000 a 35 + 000. Construccion de bordillos entre las abscisas entre 20+000 a 30+000. Estabilizacion del talud en el sector de Molinohuico.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/07/2015 - 03:31 PM
MAYO 2015 Tendido de carpeta asfaltica en las abscisas 20 + 000 a 35 + 000. Construccion de bordillos entre las abscisas entre 20+000 a 30+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	08/06/2015 - 01:45 PM
ABRIL 22 DEL 2015 Tendido de carpeta asfaltica en las abscisas 8+000 a 9+000, 20 + 000 a 35 + 000. Construccion de aceras en las abscisas 1+700 a 1`+ 900. Construccion de bordillos entre las abscisas 4+000 a 5+000, y entre 20+000 a 30+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	22/05/2015 - 11:21 AM
ABRIL 2015 Se continua realizando la estructura de la via desde el Km 22+000 al 34+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/05/2015 - 02:59 PM
MARZO 2015 Se continua realizando la estructura de la via desde el Km 22+000 al 34+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2015 - 03:27 PM
FEBRERO 2015 Se continua realizando el movimiento de tierras y realizando la estructura de la via desde el Km 22+000 al 34+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	09/03/2015 - 09:32 AM
ENERO 2015 Se esta realizando el movimiento de tierras y realizando la estructura de la via desde el Km 22+000 al 34+000. Se termino la construcción de los puentes.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/02/2015 - 03:08 PM
DICIEMBRE 2014 Se esta terminando la estabilización de taludes en el Km 5+000 al 20+000 Tambien se continua con la colocacion de estructura de la via en la ampliacion en el Km 25+000 al Km 38+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/01/2015 - 11:10 AM
NOVIEMBRE 2014 Se continua con la estabilización de taludes en el Km 5+000 al 20+000 Tambien se continua con la colocacion de estructura de la via en la ampliacion en el Km 25+000 al Km 38+000	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/12/2014 - 03:04 PM
OCTUBRE 2014 Se continua con la estabilización de taludes. Tambien se continua con la colocacion de estructura de la via en la ampliacion en el	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	10/11/2014 - 08:58 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Km 25+000 al Km 38+000-		
SEPTIEMBRE 2014 Se continua realizando la estabilizacion de Taludes a lo largo de la via se esta comenzando a colocar asfalto en la ampliacion entre el Km 22+000 al 30+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	06/10/2014 - 12:15 PM
AGOSTO 2014 Se continua realizando la estabilizacion de Taludes a lo largo de la via se aprobo la orden de trabajo para la reubicacion de las lineas de subtrasmisión y distribución del tramo 2.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/09/2014 - 08:29 PM
JULIO 2014 Se continua realizando la estabilizacion del Talud desde el Km 13+320 hasta el 13+750 Se esta realizando la estabilizacion de los taludes del Km 30+000 al 40+000. Se esta colocando carpeta asfaltica desde la ciudad de Biblian a la ciudad de Azogues.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/08/2014 - 10:20 PM
JUNIO 2014 Se continua realizando la estabilizacion del Talud desde el Km 13+320 hasta el 13+750 Se esta realizando la estabilizacion de los taludes del Km 30+000 al 40+000. Continua el fresado de pavimento existente desde el Km 40+000 hasta el 44+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	10/07/2014 - 07:49 AM
MAYO 2014 Se continua realizando la estabilizacion del Talud desde el Km 13+320 hasta el 13+750 Excavacion de cajoneras para conformacion de obra basica desde el Km 20+000 al 35+000 Continua el fresado de pavimento existente desde el Km 40+000 hasta el 44+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	04/06/2014 - 04:23 PM
ABRIL 2014 Se esta realizando la estabilizacion del Talud desde el Km 13+320 hasta el 13+750 Excavacion de cajoneras para conformacion de obra basica desde el Km 20+000 al 35+000 Fresado de pavimento existente desde el Km 40+000 hasta el 44+000.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/05/2014 - 02:52 PM
MARZO 2014 Se esta terminando el movimiento de tierras entre la Ciudad de Azogues y el Descanso Se esta realizando la estabilizacion del talud antre el km 13+320 hasta el Km 13+750.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	07/04/2014 - 10:52 AM
FEBRERO 2014 En el tramo 1(El Salado-Guanguarcucho), se continua con la colocacion de la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal. En el tramo 2 (Guanguarcucho-Azogues), se continua con el movimiento de tierras, construccion de subdrenes,ampliacion de puente sobre los rios Cuenca y Deleg, asi como la ampliacion del puente en el distribuidor No 2(acceso al nuevo terminal terrestre Azogues). En el tramo 3 (Azogues-Biblian), construccion de subdrenes en el lado izquierdo de la via Rapida.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/03/2014 - 10:39 AM
ENERO 2014 En el tramo 1(El Salado-Guanguarcucho), se continua con la colocacion de la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal. En el tramo 2 (Guanguarcucho-Azogues), se continua con el movimiento de tierras, construccion de subdrenes,ampliacion de puente sobre los rios Cuenca y Deleg, asi como la ampliacion del puente en el distribuidor No 2(acceso al nuevo terminal terrestre Azogues). En el tramo 3 (Azogues-Biblian), construccion de subdrenes en el lado izquierdo de la via Rapida. Ademas, se encuentra en tramite el libre aprovechamiento de las minas Biblicay y Curiurcu.	Encalada Clavijo, Efrain Eduardo	05/02/2014 - 02:31 PM
DICIEMBRE 2013 Se continua con la colocacion de la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal. Se encuentra en tramite el libre aprovechamiento de las minas Biblicay y Curiurcu.	Calle Bravo, Oscar Leonardo	06/01/2014 - 01:11 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2013 Se esta colocando la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal. Se encuentra en tramite el libre aprovechamiento de las minas Bibircay y Curiurcu.	Calle Bravo, Oscar Leonardo	06/12/2013 - 09:03 AM
OCTUBRE 2013: Se esta colocando la capa de nivelacion, construccion de subdrenes, estabilizacion de taludes, movimiento de tierras para completar el ancho de via; los trabajos se ejecutan de manera normal.	Calle Bravo, Oscar Leonardo	19/11/2013 - 01:43 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Inestabilidad en el talud del km 5+500 Tramo II	02/07/2019	Galo Fernando Izquierdo Campoverde	50	30	15	0/1

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Tiempo. Demora en las expropiaciones de terrenos CAUSARIA retraso en la obra	04/07/2019	Galo Fernando Izquierdo Campoverde	30 %	30	9	0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 6 - Austro > Azuay > Cuenca
2	Zona 6 - Austro > Cañar > Azogues
3	Zona 6 - Austro > Cañar > Biblian

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	PLANEACION: Firma del contrato realizada.	3-Adjudicación	01/08/2013		01/08/2013		Sí	5.0
2	PLANEACIÓN: Dictamen de Prioridad	5-Entregables Intermedios	01/08/2013		01/08/2013		Sí	2.0
3	PLANEACION: Entrega del anticipo efectuado.	9-Entregables Formales	30/09/2013		30/09/2013		Sí	3.0
4	EJECUCION: Obras preliminares en un 50%, realizadas	5-Entregables Intermedios	30/12/2013		30/12/2013		Sí	4.0
5	EJECUCION: Estabilizacion de Taludes en un 50%, realizadas	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		15/05/2014		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	EJECUCION: Movimiento de Tierras en un 30%, realizado	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		07/03/2014		Sí	4.0
7	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 50%, realizados	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		29/08/2014		Sí	4.0
8	EJECUCION: Obras preliminares en un 100%, concluida	5-Entregables Intermedios	30/03/2014		30/03/2014		Sí	4.0
9	EJECUCION: Puentes en un 75%, realizados	5-Entregables Intermedios	30/04/2014		29/08/2014		Sí	6.0
10	EJECUCION: Estabilizacion de Taludes en un 100%, realizado	5-Entregables Intermedios	19/09/2014		19/09/2014		Sí	3.0
11	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 75%, realizados	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	3.0
12	EJECUCION: Pavimento flexible en un 50%, realizado	5-Entregables Intermedios	20/10/2014		20/10/2014		Sí	6.0
13	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 50%, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	4.0
14	EJECUCION: Movimiento de Tierras realizado en un 60%, realizado	5-Entregables Intermedios	31/10/2014		31/10/2014		Sí	3.0
15	EJECUCION: Muros de Suelo Armado y Gaviones en un 100%, realizados	5-Entregables Intermedios	20/01/2015		20/02/2015		Sí	3.0
16	EJECUCION: Movimiento de Tierras en un 100%, realizado	5-Entregables Intermedios	25/02/2015		25/02/2015		Sí	4.0
17	EJECUCION: Puentes en un 100%, realizados	5-Entregables Intermedios	20/04/2015		16/07/2018		Sí	4.0
18	EJECUCION: Señalización en un 25%, realizada	5-Entregables Intermedios	29/06/2015		29/06/2015		Sí	1.0
19	EJECUCION: Estructura de pavimento existente en un 75%, realizado	5-Entregables Intermedios	29/07/2015		29/07/2015		Sí	2.0
20	EJECUCION: Estructura del pavimento realizado en un 100% en el tramo 1 , el Salado el descanso realizado	5-Entregables Intermedios	04/08/2015		04/08/2015		Sí	2.0
21	EJECUCION: Estructura del pavimento realizado en un 100% en el tramo 3 , Azogues - Biblian realizado	5-Entregables Intermedios	04/08/2015		04/08/2015		Sí	1.75
22	EJECUCION: Señalización en un 50%, realizada	5-Entregables Intermedios	29/09/2015		29/09/2015		Sí	1.0
23	EJECUCION: Señalización en un 75%, realizada	5-Entregables Intermedios	29/12/2015		30/03/2017		Sí	1.0
24	EJECUCION: Órdenes de Cambio	5-Entregables Intermedios	12/10/2017		30/10/2017		Sí	3.0
25	EJECUCION: Contratos Complementarios	5-Entregables Intermedios	22/02/2018		27/04/2018		Sí	3.0
26	EJECUCION: Pavimento flexible en un 100%, realizado	5-Entregables Intermedios	22/02/2018		30/06/2018		Sí	3.0
27	EJECUCION: Señalización en un 100%, realizada	5-Entregables Intermedios	22/02/2018		20/07/2018		Sí	2.0
28	CIERRE: Acta Entrega Recepcion Provisional suscrita.	9-Entregables Formales	01/04/2018		22/11/2018		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
29	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	9-Entregables Formales	28/02/2019	31/07/2019			No	0.25
30	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 23 de Noviembre del 2018 a 28 de febrero del 2019.	9-Entregables Formales	01/03/2019		01/03/2019		Sí	0.25
31	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Marzo del 2019 al 31 de mayo del 2019.	5-Entregables Intermedios	03/06/2019		05/06/2019		Sí	1.0
32	EJECUCION: Actualización del dictamen de prioridad	5-Entregables Intermedios	31/07/2019	31/07/2019			No	0.25
33	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Junio del 2019 al 31 de agosto del 2019.	9-Entregables Formales	02/09/2019	02/09/2019			No	0.25
34	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Septiembre del 2019 al 30 de noviembre del 2019.	5-Entregables Intermedios	02/12/2019	02/12/2019			No	0.25
35	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Diciembre del 2019 al 28 de febrero del 2020.	5-Entregables Intermedios	02/03/2020	02/03/2020			No	0.25
36	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Marzo del 2020 al 31 de mayo del 2020.	5-Entregables Intermedios	01/06/2020	01/06/2020			No	0.25
37	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Junio del 2020 al 31 de agosto del 2020.	5-Entregables Intermedios	01/09/2020	01/09/2020			No	0.25
38	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Septiembre del 2020 al 30 de noviembre del 2020.	5-Entregables Intermedios	01/12/2020	01/12/2020			No	0.25
39	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Diciembre del 2020 al 28 de febrero del 2021.	5-Entregables Intermedios	01/03/2021	01/03/2021			No	0.25
40	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Marzo del 2021 al 31 de mayo del 2021	5-Entregables Intermedios	01/06/2021	01/06/2021			No	0.25
41	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Junio del 2021 al 31 de agosto del 2021.	5-Entregables Intermedios	01/09/2021	01/09/2021			No	0.25
42	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Septiembre del 2021 al 30 de noviembre del 2021.	5-Entregables Intermedios	01/12/2021	01/12/2021			No	0.25
43	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Diciembre del 2021 al 28 de febrero del 2022.	5-Entregables Intermedios	01/03/2022	01/03/2022			No	0.25
44	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Marzo del 2022 al 31 de mayo del 2022	5-Entregables Intermedios	01/06/2022	01/06/2022			No	0.25

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
45	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Junio del 2022 al 31 de agosto del 2022.	5-Entregables Intermedios	01/09/2022	01/09/2022			No	0.25
46	EJECUCION: Índice de servicio de la vía desde el 01 de Septiembre del 2022 al 22 de noviembre del 2022.	5-Entregables Intermedios	23/11/2022	24/11/2022			No	0.25
47	CIERRE: Liquidación Económica aprobada.	5-Entregables Intermedios	27/11/2022	31/12/2022			No	1.0
48	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva suscrita	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	02/01/2023	31/01/2023			No	1.5
49	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	5-Entregables Intermedios	15/03/2023	17/03/2023			No	1.0
50	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno, suscrita	5-Entregables Intermedios	14/04/2023	17/04/2023			No	1.0
51	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	5-Entregables Intermedios	20/05/2023	20/05/2023			No	1.5
52	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	5-Entregables Intermedios	15/06/2023	15/06/2023			No	1.0
53	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023			No	1.0

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
1	ING. XAVIER M. ENDERICA SALGADO	Enderica Salgado, Xavier Mauricio	{PR} - Provincia - AZUAY	30/10/2017
2	Supervisión Ejecutiva Negativa	Enderica Salgado, Xavier Mauricio	{PR} - Provincia - AZUAY	29/09/2017
3	Supervisión Positiva: Estabilización de taludes, colocación de base asfáltica	Quishpi Vélez, Luis Manuel	{PR} - Provincia - CAÑAR	26/07/2017
4	Supervisión Seguimiento	Muñoz Zhunio, María Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	24/06/2017
5	Supervisión Positiva: Trabajos de limpieza y estabilización de taludes	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	30/04/2017
6	Supervisión avance negativa	Muñoz Zhunio, María Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	18/03/2017
7	Supervisión Positiva - Colocación de asfalto	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/02/2017
8	Supervisión negativa referente al avance	Muñoz Zhunio, María Augusta	{PR} - Provincia - AZUAY	30/01/2017
9	Supervisión de avance	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	29/12/2016
10	Supervisión Positiva - Colocación de carpeta asfáltica y construcción de aceras y bordillos.	Padrón Saeteros, Gladys Paulina	{PR} - Provincia - CAÑAR	29/12/2016

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

	Supervisión	Supervisor	Organización Supervisora	Fecha de creación
11	Supervisión Positiva - Colocación de carpeta asfáltica y construcción de aceras y bordillos.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/11/2016
12	Supervisión Positiva - Colocación de carpeta asfáltica y construcción de aceras y bordillos.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/10/2016
13	Supervisión Positiva - Colocación de carpeta asfáltica y señalética.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/08/2016
14	Supervisión Negativa - Obra paralizada falta de presupuesto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	20/07/2016
15	Verificación de estado de la obra.	Llorret Valdivieso, Juan Cristobal	{PR} - Provincia - AZUAY	29/07/2016
16	Supervisión Negativa - Obra paralizada falta de presupuesto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/04/2016
17	Supervisión Negativa - Obra paralizada.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	25/01/2016
18	Supervisión Positiva- colocación de carpeta asfáltica	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/12/2015
19	Supervisión Positiva- colocación de carpeta asfáltica	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/11/2015
20	Supervisión Positiva - trabajos de colocación de pavimento rígido.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/09/2015
21	Supervisión positiva al Tramo 1 El Salado - Guangarcucho en la reconstrucción de la Autopista Cuenca- Azogues - Biblian	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	29/09/2015
22	Supervisión Satisfactoria a la reconstrucción de la vía	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	31/07/2015
23	Aplicación de los puentes, colocación de carpeta asfáltica.	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/05/2015
24	Supervisión positiva al proyecto en su ejecución; en los Hitos GPR existen demoras en avances	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	30/04/2015
25	Colocación de la carpeta asfáltica	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/03/2015
26	SUPERVISION SATISFACTORIA AL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS Y A LOS AVANCES DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	13/02/2015
27	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2015
28	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	22/01/2015
29	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	14/11/2014
30	Supervisión al avances del proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	23/10/2014
31	Supervisión Estado de Proyecto	Berrezueta Carrion, Leonardo Renato	{PR} - Provincia - AZUAY	29/08/2014
32	Verificación del desarrollo del proyecto	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	23/08/2014
33	Movimiento de tierras y ampliación de la Vía	Cardenas Espinoza, Juan Jorge	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/07/2014
34	Avance de obras en lo que corresponde a Azuay.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	14/04/2014
35	Movimiento de Tierras	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	21/04/2014
36	Trabajos de desalojo de material y compactación	González Zhinin, Víctor Stalin	{PR} - Provincia - CAÑAR	24/01/2014
37	Supervisión del Proyecto	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	24/02/2014
38	Supervisión de Proyecto.	Cordero Ortiz, Miguel Humberto	{PR} - Provincia - AZUAY	22/01/2014

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de avance de mantenimiento		100.00 %	14	14	01/01/2019	Junio


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	28,866,906.61
Estimado Al Fin Del Proyecto:	136,051,254.71 **
Costo Total:	104,225,734.57
Total Devengado:	135,455,004.71
% Costo Total Devengado:	129.96 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 129.96 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	118,009,735.14	800,000.00	0.00	118,809,735.14
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	148,045,711.21	596,250.00	0.00	148,641,961.21
Ppto. Codificado	140,735,805.51	596,250.00	0.00	141,332,055.51
Ppto. Comprometido	129,933,780.84	0.00	0.00	129,933,780.84
Planeado - Codificado (2019)		203,750.00		
Programado a Devengar	140,423,186.44	596,250.00	0.00	141,019,436.44
Ppto. Devengado	135,455,004.71	0.00	0.00	135,455,004.71
Pagado Real	120,213,166.19	0.00	0.00	120,213,166.19
Estimado a fin de año	* 135,455,004.71	596,250.00	0.00	136,051,254.71
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	4,968,181.73	0.00	0.00	4,968,181.73
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 96.46 %	0.00 %	0.00 %	96.05 %
Ppto. Codificado 998	28,866,785.65	0.00	0.00	28,866,785.65
Ppto. Devengado 998	28,169,005.94	0.00	0.00	28,169,005.94

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

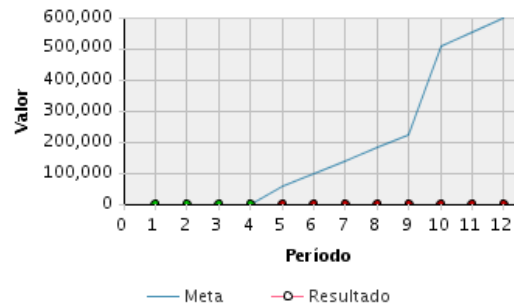

Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
May	55,901.61	0.00	55,901.61	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	40,008.23	0.00	95,909.84	0.00	0.00 %		0.00 %
Jul	40,702.50	0.00	136,612.34	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	47,287.50	0.00	183,899.84	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	38,661.30	0.00	222,561.14	0.00	0.00 %		0.00 %
Oct	285,336.69	0.00	507,897.83	0.00	0.00 %		0.00 %
Nov	45,200.00	0.00	553,097.83	0.00	0.00 %		0.00 %
Dic	43,152.17	0.00	596,250.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Total	596,250.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
12	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
13	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
14	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
15	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A1 Contrato Original	Contrato_original.pdf	08/07/2015
2	A2 Dictamen de prioridad Reconstrucción Vía Rápida Septiembre 2012	DICT_SENPLADES-SZ6A-2012-0429-OF.pdf	18/05/2017
3	A3 Notificación entrega anticipo	100_-DPC-MTOP-DPC_-_Entrega_de_anticipo.pdf	20/06/2019
4	A4 Planilla 2 - Sábana - Reajuste de Precios	Planilla_2_-_Sábana_-_Reajuste_de_Precios.pdf	30/12/2016
5	A4 Sábana Planilla 29 Contrato Original (Se cumple 50% avance Obras Preliminares)	P29_2016_08_AGOSTO_C._ORIG.pdf	19/05/2017
6	A5 Sábana Planilla 18 Contrato Original (Se cumple 50% avance Estabilidad Taludes)	PLANILLA_18_compressed.pdf	20/06/2019
7	A6 Sábana Planilla 06 Contrato Original (Se cumple 30% avance Movimiento Tierras)	PLANILLA_06.pdf	20/06/2019
8	A7 Sábana Planilla 21 (Avance de 50% en Muros de Suelo Armado y Gaviones)	PLANILLA_21_compressed.pdf	20/06/2019
9	A8, B9 Sábana Planilla 40 (Avance de 100% en Obras Preliminares; 75% Estructura pavimento existente)	PLANILLA_40.pdf	21/06/2019
10	B0 Sábana Planilla 44 Contrato Original (Se cumple 100% avance Estabilidad Taludes)	PLANILLA_44.pdf	20/06/2019
11	B1 Sábana Planilla 34 Contrato Original (Avance 75% Muros de Suelo Armado y Gavión Armado)	P34_2017_01_ENERO_C._ORIG.pdf	19/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
12	B2 Sábana Planilla 20 Contrato Original (Se cumple 50% avance Pavimento Flexible)	PLANILLA_20_compressed.pdf	20/06/2019
13	B3 Sábana Planilla 22 Contrato Original (Se cumple 50% avance Estructure Pavimento Existente)	PLANILLA_22_compressed.pdf	21/06/2019
14	B4 Sábana Planilla 10 Contrato Original (Se cumple 60% avance Movimiento Tierras)	PLANILLA_10.pdf	21/06/2019
15	B5, B6, B7, C6, C7 Sábana Planilla 47 (Avance de 100% en Muros de Suelo Armado y Gaviones; Movimiento de Tierras; Puentes; Pavimento Flexible, Señalización)	PLANILLA_47.pdf	21/06/2019
16	C2 Sábana Planilla 31 (Avance de 50% en Señalización)	P31_2016_10_OCTUBRE_C_ORIG.pdf	24/06/2019
17	C3 Sábana Planilla 33 (Avance de 75% en Señalización)	P33_2016_12_DICIEMBRE_C_ORIG.pdf	24/06/2019
18	C4 Acta 451 Ampliacion de plazo	Acta_451_Ampliacion_de_plazo.pdf	28/12/2016
19	C4 Acta de suspension de plazo	Acta_de_suspension_de_plazo.pdf	28/12/2016
20	C4 Acta levantamiento de suspension de plazo	Acta_levantamiento_de_suspension_de_plazo.pdf	28/12/2016
21	C4 Levantamiento suspensión de plazo	ACTA_LEVANTAMIENTO.pdf	04/05/2018
22	C4 Orden de Cambio 4	orden_de_cambio_4.pdf	19/05/2017
23	C4 Orden de Cambio Nro. 3	orden_de_cambio_3.pdf	19/05/2017
24	C4 Orden de Cambio Nro. 5	Orden_de_Cambio_Nro._5.pdf	21/06/2019
25	C4-Orden de cambio 1 -Via-Rapida	Orden_de_Cambio_1-Via_Rapida.pdf	22/05/2015
26	C4-Orden de cambio 2-Via Rapida	ORDEN_DE_CAMBIO_2_VIA_RAPIDA.pdf	22/05/2015
27	C5 Contrato Complementario Nro. 2	contrato_complementario_2.pdf	19/05/2017
28	C5 Contrato complementario Nro. 3	CONTRATO_COMPLEMENTARIO_Nro_3.pdf	04/05/2018
29	C5 Costo mas Porcentaje	Costo_mas_Porcentaje.pdf	28/12/2016
30	C5 Costo mas Porcentaje 01	Costo_mas_Porcentaje_01.pdf	28/12/2016
31	C5 Costo mas Porcentaje 02	Costo_mas_Porcentaje_02.pdf	28/12/2016
32	C5-Contrato Complementario-Via-Rapida	Contrato_Complementario-Via-Rapida.pdf	22/05/2015
33	C8 Acta de recepción provisional	recepcion_provisional_rapida.pdf	05/12/2018
34	C8 Informe hecha por la Comisión con las observaciones del Proyecto.	MTOP-CONS_CAÑ-2018-171-ME.pdf	05/11/2018
35	C8 Memorando Delegación miembros comisión de recepción provisional de construcción.	MTOP-SUBZ6-2018-1349-ME.pdf	05/10/2018
36	C9 Informe de Fiscalización Nro. 1	In505FISQuin1-0.pdf	18/05/2017
37	C9 Informe de Fiscalización Nro. 10	In505FISQuin10-0.pdf	18/05/2017
38	C9 Informe de Fiscalización Nro. 11	In505FISQuin11-0.pdf	18/05/2017
39	C9 Informe de Fiscalización Nro. 12	In505FISQuin12-0.pdf	18/05/2017
40	C9 Informe de Fiscalización Nro. 13	In505FISQuin13-0.pdf	18/05/2017
41	C9 Informe de Fiscalización Nro. 14	In505FISQuin14-0.pdf	18/05/2017
42	C9 Informe de Fiscalización Nro. 15	In505FISQuin15-0.pdf	18/05/2017
43	C9 Informe de Fiscalización Nro. 16	In505FISQuin16-0.pdf	18/05/2017
44	C9 Informe de Fiscalización Nro. 17	In505FISQuin17-0.pdf	18/05/2017
45	C9 Informe de Fiscalización Nro. 18	In505FISQuin18-0.pdf	18/05/2017
46	C9 Informe de Fiscalización Nro. 19	In505FISQuin19-0.pdf	18/05/2017
47	C9 Informe de Fiscalización Nro. 2	In505FISQuin2-0.pdf	18/05/2017
48	C9 Informe de Fiscalización Nro. 20	In505FISQuin20-0.pdf	18/05/2017
49	C9 Informe de Fiscalización Nro. 21	In505FISQuin21-0.pdf	18/05/2017
50	C9 Informe de Fiscalización Nro. 22	In505FISQuin22-0.pdf	18/05/2017
51	C9 Informe de Fiscalización Nro. 24	In505FISQuin24-0.pdf	18/05/2017
52	C9 Informe de Fiscalización Nro. 25	In505FISQuin25-0.pdf	18/05/2017
53	C9 Informe de Fiscalización Nro. 26	In505FISQuin26-0.pdf	18/05/2017
54	C9 Informe de Fiscalización Nro. 27	In505FISQuin27-0.pdf	18/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
55	C9 Informe de Fiscalización Nro. 28	In505FISQuin28-0.pdf	18/05/2017
56	C9 Informe de Fiscalización Nro. 29	In505FISQuin29-0.pdf	18/05/2017
57	C9 Informe de Fiscalización Nro. 3	In505FISQuin3-0.pdf	18/05/2017
58	C9 Informe de Fiscalización Nro. 30	In505FISQuin30-0.pdf	18/05/2017
59	C9 Informe de Fiscalización Nro. 31	In505FISQuin31-0.pdf	18/05/2017
60	C9 Informe de Fiscalización Nro. 32	In505FISQuin32-0.pdf	18/05/2017
61	C9 Informe de Fiscalización Nro. 33	In505FISQuin33-0.pdf	18/05/2017
62	C9 Informe de Fiscalización Nro. 34	In505FISQuin34-0.pdf	18/05/2017
63	C9 Informe de Fiscalización Nro. 35	In505FISQuin35-0.pdf	18/05/2017
64	C9 Informe de Fiscalización Nro. 36	In505FISQuin36-0.pdf	18/05/2017
65	C9 Informe de Fiscalización Nro. 37	In505FISQuin37-0.pdf	18/05/2017
66	C9 Informe de Fiscalización Nro. 38	In505FISQuin38-0.pdf	18/05/2017
67	C9 Informe de Fiscalización Nro. 39	In505FISQuin39-0.pdf	18/05/2017
68	C9 Informe de Fiscalización Nro. 4	In505FISQuin4-0.pdf	18/05/2017
69	C9 Informe de Fiscalización Nro. 40	In505FISQuin40-0.pdf	18/05/2017
70	C9 Informe de Fiscalización Nro. 41	In505FISQuin41-0.pdf	18/05/2017
71	C9 Informe de Fiscalización Nro. 42	In505FISQuin42-0.pdf	18/05/2017
72	C9 Informe de Fiscalización Nro. 43	In505FISQuin43-0.pdf	18/05/2017
73	C9 Informe de Fiscalización Nro. 44	In505FISQuin44-0.pdf	18/05/2017
74	C9 Informe de Fiscalización Nro. 45	In505FISQuin45-0.pdf	18/05/2017
75	C9 Informe de Fiscalización Nro. 46	In505FISQuin46-0.pdf	18/05/2017
76	C9 Informe de Fiscalización Nro. 47	In505FISQuin47-0.pdf	18/05/2017
77	C9 Informe de Fiscalización Nro. 48	In505FISQuin48-0.pdf	18/05/2017
78	C9 Informe de Fiscalización Nro. 49	In505FISQuin49-0.pdf	18/05/2017
79	C9 Informe de Fiscalización Nro. 5	In505FISQuin5-0.pdf	18/05/2017
80	C9 Informe de Fiscalización Nro. 50	In505FISQuin50-0.pdf	18/05/2017
81	C9 Informe de Fiscalización Nro. 51	In505FISQuin51-0.pdf	18/05/2017
82	C9 Informe de Fiscalización Nro. 52	In505FISQuin52-0.pdf	18/05/2017
83	C9 Informe de Fiscalización Nro. 53	In505FISQuin53-0.pdf	18/05/2017
84	C9 Informe de Fiscalización Nro. 54	In505FISQuin54-0.pdf	18/05/2017
85	C9 Informe de Fiscalización Nro. 55	In505FISQuin55-0.pdf	18/05/2017
86	C9 Informe de Fiscalización Nro. 56	In505FISQuin56-0.pdf	18/05/2017
87	C9 Informe de Fiscalización Nro. 57	In505FISQuin57-0.pdf	18/05/2017
88	C9 Informe de Fiscalización Nro. 58	In505FISQuin58-0.pdf	05/07/2017
89	C9 Informe de Fiscalización Nro. 59	In505FISQuin59-0.pdf	05/07/2017
90	C9 Informe de Fiscalización Nro. 6	In505FISQuin6-0.pdf	18/05/2017
91	C9 Informe de Fiscalización Nro. 60	In505FISQuin60-0.pdf	05/07/2017
92	C9 Informe de Fiscalización Nro. 68	In505FISQuin68-0.pdf	05/12/2017
93	C9 Informe de Fiscalización Nro. 69	informe_quincenal_69.pdf	01/11/2017
94	C9 Informe de Fiscalización Nro. 7	In505FISQuin7-0.pdf	18/05/2017
95	C9 Informe de Fiscalización Nro. 70	In505FISQuin70-0.pdf	05/12/2017
96	C9 Informe de Fiscalización Nro. 72	In505FISQuin72-0.pdf	05/01/2018
97	C9 Informe de Fiscalización Nro. 72	In505FISQuin72-0.pdf	05/04/2018
98	C9 Informe de Fiscalización Nro. 73	In505FISQuin73-0.pdf	05/04/2018
99	C9 Informe de Fiscalización Nro. 74	In505FISQuin74-0.pdf	05/04/2018
100	C9 Informe de Fiscalización Nro. 75	In505FISQuin75-0.pdf	05/04/2018
101	C9 Informe de Fiscalización Nro. 76	In505FISQuin76-0.pdf	05/04/2018
102	C9 Informe de Fiscalización Nro. 77	In505FISQuin77-0.pdf	05/04/2018

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
103	C9 Informe de Fiscalización Nro. 78	In505FISQuin78-0.pdf	05/04/2018
104	C9 Informe de Fiscalización Nro. 79	In505FISQuin79-0.pdf	05/04/2018
105	C9 Informe de Fiscalización Nro. 8	In505FISQuin8-0.pdf	18/05/2017
106	C9 Informe de Fiscalización Nro. 80	In505FISQuin80-0.pdf	05/07/2018
107	C9 Informe de Fiscalización Nro. 81	In505FISQuin81-0.pdf	05/07/2018
108	C9 Informe de Fiscalización Nro. 82	In505FISQuin82-0.pdf	05/07/2018
109	C9 Informe de Fiscalización Nro. 83	In505FISQuin83-0.pdf	05/07/2018
110	C9 Informe de Fiscalización Nro. 84	In505FISQuin84-0.pdf	05/07/2018
111	C9 Informe de Fiscalización Nro. 85	In505FISQuin85-0.pdf	05/07/2018
112	C9 Informe de Fiscalización Nro. 9	In505FISQuin9-0.pdf	18/05/2017
113	C9 Informe de Fiscalización Nro.23	In505FISQuin23-0.pdf	18/05/2017
114	C9 Informe Fiscalización Nro. 67 septiembre de 2017	In505FISQuin67-0.pdf	05/10/2017
115	C9 Informe Qincenal de Fiscalización	In505FISQuin63-0.pdf	05/08/2017
116	C9 Informe Qincenal de Fiscalización agosto 2017	In505FISQuin65-0.pdf	05/09/2017
117	C9 Liquidacion económica Fiscalización.	Liquidacion_Fiscalizacion1.pdf	05/09/2018
118	C9 Ratificación de liquidación económica Fiscalización	Ratificacion_liq_Fisc.pdf	05/09/2018
119	CEDULA-REPORTE 2013	REPORTE_2013.pdf	30/12/2016
120	CEDULA-REPORTE 2014	REPORTE_2014.pdf	30/12/2016
121	CEDULA-REPORTE 2015	REPORTE_2015.pdf	30/12/2016
122	CEDULA-REPORTE 2016	REPORTE_2016.pdf	30/12/2016
123	Cédula presupuestaria mes de Julio 2017	CEDULA_VIA_RAPIDA_JULIO_2017.pdf	05/08/2017
124	D0 Designación Supervisor y Fiscalizador de la etapa de mantenimiento.	MTOP-SUBZ6-2018-1854-ME_(Designación_por_parte_de_Subsecretaria).pdf	03/01/2019
125	D0 Índice de servicio en el periodo noviembre 2018 a febrero 2019. Etapa de mantenimiento	INDICE_SERVICIO_NOV_18_-_FEB_19.pdf	25/06/2019
126	D1 Indice de servicio en el periodo Marzo 19 a Mayo 19. Etapa de Mantenimiento	Indice_de_servicio_MAR_19_-_MAY_19.pdf	25/06/2019
127	D2 Actualización de Dictamen de Prioridad Septiembre 2014	ACT_DICT_SENPLADES-SZ6A-2014-0439-OF.pdf	18/05/2017
128	D2 Actualización de Dictamen de Prioridad Septiembre 2014 anexo	ANEXO_SENPLADES-SZ6A-2014-0439-OF.pdf	18/05/2017
129	D2 Actualización de prioridad proyecto	ACT_DIC_SENPLADES-SZ6A-2014-0065-OF.pdf	18/05/2017
130	D2 Dictamen Favorable febrero 2013	DIC_FAV_SENPLADES-SGPBV-2013-0141-OF.pdf	18/05/2017
131	D2 Oficio autorización de AVAL	MTOP-CGP-2017-1387-ME.pdf	05/12/2017
132	D2 OFICIO-DICTAMEN-PRIORIDAD-SEMPLEDES	ACT_DICT_SENPLADES-SZ6A-2014-0439-OF-DICTAMEN-PRIORIDAD-VIA_RAPIDA.pdf	08/08/2015
133	D2 PROYECTO DE SEMPLADES	A4.docx	26/12/2013
134	PLANILLA CC01 14	PLANILLA__CC01_14.pdf	30/12/2016
135	Planilla 12 contrato Complementario 1	P12_2016_08_AGOSTO_C._COMP_1.pdf	19/05/2017
136	Planilla 13 contrato Complementario 1	P13_2016_09_SEPTIEMBRE_C._COMP_1.pdf	19/05/2017
137	Planilla 14 contrato Complementario 1	P14_2016_10_OCTUBRE_C._COMP_1.pdf	19/05/2017
138	Planilla 15 contrato Complementario 1	P15_2016_11_NOVIEMBRE_C._COMP_1.pdf	19/05/2017
139	Planilla 16 contrato Complementario 1	P16_2016_12_DICIEMBRE_C._COMP_1.pdf	19/05/2017
140	Planilla 3 - Contrato Complemetario N° 1 - Sábana (1)	Planilla_3_-_Contrato_Complemetario_N°_1_-_Sábana_(1).pdf	30/12/2016
141	Planilla 30 Contrato Original	P30_2016_09_SEPTIEMBRE_C._ORIG.pdf	19/05/2017
142	Planilla 31 Contrato Original	P31_2016_10_OCTUBRE_C._ORIG.pdf	19/05/2017
143	Planilla 32 Contrato Original	P32_2016_11_NOVIEMBRE_C._ORIG.pdf	19/05/2017
144	Planilla 33 Contrato Original y Orden de Cambio Diciembre 2016	P33_2016_12_DICIEMBRE_C._ORIG.pdf	19/05/2017

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
145	Planilla 35 Contrato Original y Orden de Cambio Febrero 2017	P35_2017_02_FEBRERO_C._ORIG.pdf	19/05/2017
146	Planilla 36 Contrato Original y Orden de Cambio Marzo 2017	P36_2017_03_MARZO_C._ORIG.pdf	19/05/2017
147	Planilla 37 Contrato Original y Orden de Cambio Abril 2017	Planilla_37.pdf	05/07/2017
148	Planilla 38 Contrato Original y Orden de Cambio Abril 2017	Planilla_38.pdf	05/07/2017
149	Planilla 4 - Contrato Complementario N° 1 - Sábana	Planilla_4_-_Contrato_Complementario_N°_1_-_Sábana.pdf	30/12/2016
150	PLANILLA 4 CONTRATO COMPLEMENTARIO	Planilla_4_-_Contrato_Complementario_N°_1_-_Sábana.pdf	30/12/2016
151	Planilla 6	Planilla_6.pdf	30/12/2016
152	PLANILLA 7 CONTRATO COMPLEMENTARIO	Planilla_7_CC_N°_1_-_Sábana_-_Resumen_de_Reajuste_de_Precios.pdf	30/12/2016
153	Planilla 8 CC N° 1 - Sábana - Resumen de Reajuste de Precios	Planilla_8_CC_N°_1_-_Sábana_-_Resumen_de_Reajuste_de_Precios.pdf	30/12/2016
154	Planilla Nro 10 Contrato Compl. Nro. 2	PLANILLA_N°.10.pdf	05/04/2018
155	Planilla Nro 11 Contrato Compl. Nro. 2	PLANILLA_N°.11.pdf	05/07/2018
156	Planilla Nro 2 Contrato Compl. Nro. 2	P02_2017_06_JUNIO_C._COMP_2.pdf	05/09/2017
157	Planilla Nro 4 Contrato Compl. Nro. 2	Planilla_4_CC2.pdf	05/10/2017
158	Planilla Nro 5 Contrato Compl. Nro. 2	Sabana_+_Reajuste_PI_-_05.pdf	01/11/2017
159	Planilla Nro 6 Contrato Compl. Nro. 2	P06_2017_09_OCTUBRE_C._COMP_2.pdf	05/12/2017
160	Planilla Nro 7 Contrato Compl. Nro. 2	Planilla_7_hh.pdf	05/01/2018
161	Planilla Nro 8 Contrato Compl. Nro. 2	PLANILLA_N°.08.pdf	05/04/2018
162	Planilla Nro 9 Contrato Compl. Nro. 2	PLANILLA_N°.09.pdf	05/04/2018
163	Planilla Nro. 3 del Contratao Compl 5 Fiscalización	SABANA_AUSTROVIAS_VIA_RAPIDA.pdf	05/08/2017
164	Planilla Nro. 39 Contrato Original	P39_2017_06_JUNIO_C.ORIG.pdf	05/09/2017
165	Planilla Nro. 39 Contrato Original y Orden de Cambio	SABANA_HeH_VIA_RAPIDA.pdf	05/08/2017
166	Planilla Nro. 41 Contrato Original y Orden de Cambio	Planilla_41.pdf	05/10/2017
167	Planilla Nro. 42 Contrato Original y Orden de Cambio	Sabana_+_Reajuste_PI_-_42.pdf	01/11/2017
168	Planilla Nro. 43 Contrato Original y Orden de Cambio	P43_2017_09_OCTUBRE_C.ORIG..pdf	05/12/2017
169	Planilla Nro. 45 Contrato Original y Orden de Cambio	PLANILLA_N°.45.pdf	05/04/2018
170	Planilla Nro. 46 Contrato Original y Orden de Cambio	PLANILLA_N°.46.pdf	05/04/2018
171	Planilla Nro. 47 Contrato Original y Orden de Cambio	PLANILLA_N°.47.pdf	05/04/2018
172	Planilla Nro. 5 del Contratao Compl 5 Fiscalización	Planilla_05_CC5_y_Reajuste.pdf	05/10/2017
173	Planilla Nro. 6 del Contratao Compl 5 Fiscalización	P06_2017_08_AGOSTO_C._COMP_5_Fiscalización.pdf	05/12/2017
174	Planilla Nro. 7 del Contratao Compl 5 Fiscalización	Planilla_Fiscalización_Via_Rápida.pdf	05/01/2018
175	PLANILLAS H&H	PLANILLA_VIA_RAPIDA_CUENCA_AZOGUES.rar	30/12/2016

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Izquierdo Campoverde, Galo Fernando	Titular	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas del Cañar	gizquierdo@mtop.gob.ec	
Quezada Jara, Mónica Fabiola	Patrocinador Ejecutivo	Subsecretaria Zonal 6	mquezada@mtop.gob.ec	023974600
Soto Romero, José Gerardo	Lider de Proyecto	Analista de Infraestructura Provincial 2	jsoto@mtop.gob.ec	023974600
Torres Jara, Julia Brumilda	Coordinador Administrativa Financiera	Analista Administrativa Financiero	jt Torres@mtop.gob.ec	072240227 ext 62814

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
73104_1.jpg	05/04/2018
