

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Loja

PROYECTO: K039 MTOP - Centro Binacional de atención en Frontera -CEBAF- Macará

Líder del Proyecto:	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL (jrcruz@mtop.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Punin Burneo, Eduardo Patricio	Programas Relacionados:	CENTRO BINACIONAL DE ATENCION EN FRONTERA - CEBAF- MACARA
Titular:	Regalado Jaramillo, Marco Joffre	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	50590000.1504.6387	TIR:	39.00 %
Objetivos Operativos:	4	VAN:	54,830.80
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	14,675,920.90
Localidad de Gestión:	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	22/07/2014 - 31/05/2022
Fecha de última actualización:	05/11/2021	Fecha de Fin Base:	31/12/2019
Modificado por:	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	Fecha del siguiente Hito:	30/04/2021

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN:

La zona del proyecto está localizada al sur occidente de la ciudad de Loja, cuyo emplazamiento se ubica a una distancia de 140 Km desde la ciudad de Loja, en el sector del puente internacional de Macará y tiene las siguientes coordenadas: S 9514399.14 , E 614940.28 Este proyecto tiene una población del área de influencia directa proyectada al año 2010 de 19.908 habitantes que se considera como población objetivo que se beneficiarán con la construcción del Centro Binacional de atención en fronteras y mejoramiento de las vías de acceso e internas.

Como beneficiarios indirectos se considera que este proyecto sirve a población flotante (turistas, comerciantes eventuales, romeriantes de ambos países, etc.) con 439.098 hab.

PRODUCTO:

Construcción y Operación del Centro Binacional de atención de Frontera -CEBAF- Macará - La Tina

LINEA BASE:

El concepto del proyecto se basó en la unión y confraternidad bilateral

Ecuador - Perú, al no encontrarse un referente adecuado se consideró basarse en el elemento universal más conocido de acuerdo ente las partes, y el nexo entre dos pueblos, la unión de manos, partiendo de este elemento se consideró que para el elemento principal y central de este proyecto este contaría con un área de nexo en el centro donde se comparte una gran área pero se respetan los espacios entre cada país y cada entidad, y se coloca dos elemento circunscritos al nexo pero unidos a este.

Se mantuvo siempre la sobriedad del proyecto, pero con un juego sutil de incursión a nuevas y moderas formas arquitectónicas, elementos orgánicos que la población asimila como propias, una gran edificación a la vista muy liviana que sorprende al observador en cada giro, dos grandes estructuras rodean a los módulos mostrando gran fuerza y autoridad, y siguiendo hasta enterrarse en la tierra firmemente.

Se diseñó de tal manera que existan grandes plantas libres lo cual libera el espacio y también brinda la oportunidad de modificar las plantas según las necesidades futuras, esto se toma más en cuenta al ver las plantas de las jefaturas de las entidades en donde el área libre permite adecuarse según se requiera.

Se han considerado todos los espacios para que las autoridades y el personal de las entidades realicen eficazmente sus labores, tanto en el área de pasajeros y equipajes como en el de vehículos pesados y mercancías.

El CEBAF Macará-La Tina será la imagen de la integración supranacional, el progreso y desarrollo con responsabilidad de exponer la identidad y cultura propia de cada país.

OBJETIVO GENERAL: Construcción del Centro Binacional de atención de Frontera -CEBAF- Macará - La Tina

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Los objetivos específicos del CEBAF, son los siguientes:

- Construcción del Edificio.
- Construcción de Vías

DATOS GENERALES

Descripción

CONTRATISTA: Consorcio A.S.
 FISCALIZADOR: Ing. Cecibel Vargas
 SUPERVISOR: Ing. Jonathan Cruz
 ADMINISTRADOR: Director Distrital de Loja Ing. Marco Regalado
 FINANCIAMIENTO: Presupuesto General del Estado
 MONTO DE INVERSIÓN: En agosto 2014 se obtiene el dictamen de prioridad favorable por un monto total de inversión de US\$ 16.652.941,43, a ser financiados con recursos fiscales del Presupuesto General del Estado., en el 2019 el monto de inversión asciende a USD. 17,394,259.97, para lo cual nose ha necesitado realizar la actualización del dictamen debido a que no supera el 15% del monto total.

Beneficios Cualitativos

Contribuir al Plan Maestro Vial Nacional en concordancia con la iniciativa para la integración de la Infraestructura, para que exista una integración regional, Provincial y Cantonal, con lo cual se mejorarán las condiciones socio - económicas y ambientales del sector.

Tipo de Beneficiario

De acuerdo a los datos proporcionados por el INEC y el VII censo de población y VI de vivienda, la población del área de influencia directa proyectada al año 2010 es de 19.908 habitantes que se considera como población objetivo que se beneficiarán con la construcción del Centro Binacional de atención en fronteras y mejoramiento de las vías de acceso e internas.
 Como beneficiarios indirectos se considera que este proyecto sirve a población flotante (turistas, comerciantes eventuales, romeriantes de ambos países, etc.), 439.098 habitantes

Restricciones


TIEMPO: El proyecto tendrá una duración de 6 meses.
 COSTO: el Valor monetario del presupuesto límite previsto para su realización es de \$ 17,394,259.97, valor que no supera el 15% del valor que consta en el dictamen de prioridad del proyecto, razón por la cual no existe actualización del dictamen aprobado en agosto 2014 que tiene monto total de inversión de US\$ 16.652.941,43, a ser financiados con recursos fiscales del Presupuesto General del Estado.
 CALIDAD: la calidad de los materiales y de los equipos informáticos podría verse afectado si las importaciones no se dieran.
 RECURSOS: La puesta en marcha los equipos eléctricos y electrónicos puede retrasarse por los trámites de importación que se deberán realizar.
 La falta de asignación presupuestaria suficiente podría hacer retrasar el normal desarrollo de la obra.
 RIESGOS: el temporal invernal podría impedir con el objetivo de este proyecto, haciendo que este se retrase.
 ALCANCE: La falta de mobiliario y equipamiento tecnológico impediría hacer uso de las instaciones del centro para el fin que fue creado.

Fase Actual:

Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado **Congelado** Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 92.76 %

Fecha de Inicio: 22/07/2014

Fecha de Fin: 31/05/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2021	Avance programado acumulado											
	88 %	88 %	88 %	90 %	91 %	92 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %
	Avance real acumulado											
2021	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE 2021: Obra suspendida, con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-202-OF, de fecha 19 de julio de 2021, se levanta la suspensión de la obra desde el 20 de julio de 2021, se realizaron trabajos en sistemas electrónicos, eléctricos, cableado estructurado y puesta en marcha de ascensor. Con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-298-OF, se suspende nuevamente la obra a partir del 15 de septiembre de 2021 por trámite de orden de cambio 4.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/11/2021 - 07:17 AM
SEPTIEMBRE 2021: Obra suspendida, con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-202-OF, de fecha 19 de julio de 2021, se levanta la suspensión de la obra desde el 20 de julio de 2021, se realizaron trabajos en sistemas electrónicos, eléctricos, cableado estructurado y puesta en marcha de ascensor. Con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-298-OF, se suspende nuevamente la obra a partir del 15 de septiembre de 2021 por trámite de orden de cambio 4.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/10/2021 - 09:03 AM
AGOSTO 2021: Obra en ejecución, con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-202-OF, de fecha 19 de julio de 2021, se levanta la suspensión de la obra desde el 20 de julio de 2021, se realizan trabajos en sistemas electrónicos, eléctricos, cableado estructurado y puesta en marcha de ascensor.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	02/09/2021 - 11:39 AM
JULIO 2021: Obra en ejecución, con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-202-OF, de fecha 19 de julio de 2021, se levanta la suspensión de la obra desde el 20 de julio de 2021, se realizan trabajos eléctricos y electrónicos.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/08/2021 - 09:04 AM
JUNIO 2021: Obra suspendida por falta de acreditación de pagos a la contratista. Con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-73-OF, de fecha 15 de marzo de 2021, el administrador del contrato notifica al contratista el levantamiento de la suspensión de la obra, y con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-79-OF, el administrador del contrato comunica al contratista la suspensión total de los trabajos a partir del día 22 de marzo del 2021 hasta que se efective el pago de los valores adeudados correspondientes al saldo de la Planilla No.18 del contrato Original.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/07/2021 - 02:19 PM
MAYO 2021: Obra suspendida por falta de acreditación de pagos a la contratista. Con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-73-OF, de fecha 15 de marzo de 2021, el administrador del contrato notifica al contratista el levantamiento de la suspensión de la obra, y con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-79-OF, el administrador del contrato comunica al contratista la suspensión total de los trabajos a partir del día 22 de marzo del 2021 hasta que se efective el pago de los valores adeudados correspondientes al saldo de la Planilla No.18 del contrato Original.	Suescun Cueva, Stalin Oswaldo	04/06/2021 - 04:29 PM
ABRIL 2021: Con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-73-OF, de fecha 15 de marzo de 2021, el administrador del contrato notifica al contratista el levantamiento de la suspensión de la obra, y con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-79-OF, el administrador del contrato comunica al contratista la suspensión total de los trabajos a partir del día 22 de marzo del 2021 hasta que se efective el pago de los valores adeudados correspondientes al saldo de la Planilla No.18 del contrato Original.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/05/2021 - 10:58 AM
MARZO 2021: Con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-73-OF, de fecha 15 de marzo de 2021, el administrador del contrato notifica al contratista el levantamiento de la suspensión de la obra, y con Oficio Nro. MTOP-DDL-21-79-OF, el administrador del contrato comunica al contratista la suspensión total de los trabajos a partir del día 22 de marzo del 2021 hasta que se efective el pago de los valores adeudados correspondientes al saldo de la Planilla No.18 del contrato Original.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/04/2021 - 08:40 AM
FEBRERO 2021: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persisten planillas pendientes de pago. El PAI 2021 ya esta aprobado por un valor de 2'993.445,78 sin embargo aun no se entregan estos recursos a la Dirección de Loja.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	04/03/2021 - 08:58 AM
ENERO 2021: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persisten planillas pendientes de pago. El PAI 2021 no esta aún aprobado.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/02/2021 - 08:52 AM
DICIEMBRE 2020: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persisten planillas pendientes de pago. PAI 2020 con fondos asignados menores a los solicitados, por lo que no se podrá culminar la obra sin incremento de techo presupuestario, a pesar de la asignación 2020 no se puede pagar planillas pendiente de pago ya que es de monto mayor al asignado, por lo que persiste la suspensión de esta obra tan importante. Mediante reunión con el Director de la DDL y el SM se llegaron al acuerdo de asignar 270.000,00USD para pagar un abono a la planilla Nro. 18, el cual se efectivizó a la contratista; mas, persiste deuda impaga.	CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	05/01/2021 - 11:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2020: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persisten planillas pendientes de pago. PAI 2020 con fondos asignados menores a los solicitados, por lo que no se podrá culminar la obra sin incremento de techo presupuestario, a pesar de la asignación 2020 no se puede pagar planillas pendiente de pago ya que es de monto mayor al asignado, por lo que persiste la suspensión de esta obra tan importante. Mediante reunión con el Director de la DDL y el SM se llegarán al acuerdo de asignar 270.000,00USD para pagar un abono a la planilla Nro. 18, el cual se efectivizó a la contratista; mas, persiste deuda impaga.	Orellana Ochoa, Eduardo Enrique	03/12/2020 - 10:06 AM
OCTUBRE 2020: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persisten planillas pendientes de pago. PAI 2020 con fondos asignados menores a los solicitados, por lo que no se podrá culminar la obra sin incremento de techo presupuestario, a pesar de la asignación 2020 no se puede pagar planillas pendiente de pago ya que es de monto mayor al asignado, por lo que persiste la suspensión de esta obra tan importante. Mediante reunión con el Director de la DDL y el SM se llegarán al acuerdo de asignar 270.000,00USD para pagar un abono a la planilla Nro. 18, el cual se efectivizó a la contratista; mas, persiste deuda impaga.	Vega Silva, Andrea Karla	04/11/2020 - 11:14 AM
SEPTIEMBRE 2020: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persisten planillas pendientes de pago. PAI 2020 con fondos asignados menores a los solicitados, por lo que no se podrá culminar la obra sin incremento de techo presupuestario, a pesar de la asignación 2020 no se puede pagar planillas pendiente de pago ya que es de monto mayor al asignado, por lo que persiste la suspensión de esta obra tan importante. Mediante reunión con el Director de la DDL y el SM se llegarán al acuerdo de asignar 270.000,00USD para pagar un abono a la planilla Nro. 18; sin embargo aún la contratista sigue impaga.	Vega Silva, Andrea Karla	02/10/2020 - 12:23 PM
Agosto2020: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persisten planillas pendientes de pago. PAI 2020 con fondos asignados menores a los solicitados, por lo que no se podrá culminar la obra sin incremento de techo presupuestario, a pesar de la asignación 2020 no se puede pagar planillas pendiente de pago ya que es de monto mayor al asignado, por lo que persiste la suspensión de esta obra tan importante. Mediante reunión con el Director de la DDL y el SM se llegarán al acuerdo de asignar 270.000,00USD para pagar un abono a la planilla Nro. 18; sin embargo aún la contratista seguiría impaga.	Vega Silva, Andrea Karla	01/09/2020 - 07:24 PM
Julio 2020: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persiste planillas pendientes de pago. PAI 2020 con fondos asignados menores a los solicitados, por lo que no se podrá culminar la obra sin incremento de techo presupuestario, a pesar de la asignación 2020 no se puede pagar planillas pendiente de pago ya que es de monto mayor al asignado, por lo que persiste la suspensión de esta obra tan importante. Con memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-584-ME, del 19/05/2020, la Supervisora del proyecto solicita recursos para culminación del centro.	Vega Silva, Andrea Karla	03/08/2020 - 02:09 PM
Junio 2020: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persiste planillas pendientes de pago. PAI 2020 con fondos asignados menores a los solicitados, por lo que no se podrá culminar la obra sin incremento de techo presupuestario, a pesar de la asignación 2020 no se puede pagar planillas pendiente de pago ya que es de monto mayor al asignado, por lo que persiste la suspensión de esta obra tan importante. Con memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-584-ME, del 19/05/2020, la Supervisora del proyecto solicita recursos para culminación del centro.	Vega Silva, Andrea Karla	02/07/2020 - 08:52 PM
Mayo 2020: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persiste planillas pendientes de pago. PAI 2020 con fondos asignados menores a los solicitados, por	Vega Silva, Andrea Karla	04/06/2020 - 09:50 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
lo que no se podrá culminar la obra sin incremento de techo presupuestario, a pesar de la asignación 2020 no se puede pagar planillas pendiente de pago ya que es de monto mayor al asignado, por lo que persiste la suspensión de esta obra tan importante. Con memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2020-584-ME, del 19/05/2020, la Supervisora del proyecto solicita recursos para culminación del centro.		
Abril2020: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persiste planillas pendientes de pago. PAI 2020 con fondos asignados menores a los solicitados, por lo que no se podrá culminar la obra sin incremento de techo presupuestario, a pesar de la asignación 2020 no se puede pagar planillas pendiente de pago ya que es de monto mayor al asignado, por lo que persiste la suspensión de esta obra tan importante.	Vega Silva, Andrea Karla	05/05/2020 - 04:04 PM
MARZO 2020: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persiste planillas pendientes de pago. PAI 2020 con fondos asignados menores a los solicitados, por lo que no se podrá culminar la obra sin incremento de techo presupuestario, a pesar de la asignación 2020 no se puede pagar planillas pendiente de pago ya que es de monto mayor al asignado, por lo que persiste la suspensión.	Vega Silva, Andrea Karla	05/04/2020 - 12:55 PM
FEBRERO 2020: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persiste planillas pendientes de pago. PAI 2020 con fondos asignados menores a los solicitados, por lo que no se podrá culminar la obra sin incremento de techo presupuestario, a pesar de la asignación 2020 no se puede pagar planillas pendiente de pago ya que es de monto mayor al asignado, por lo que persiste la suspensión.	Rojas Cazar, Walter Emilio	03/03/2020 - 10:00 AM
ENERO 2020: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29,30 y 31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persiste planillas pendientes de pago. PAI 2020 con fondos asignados menores a los solicitados, por lo que no se podrá culminar la obra sin incremento de techo presupuestario, a pesar de la asignación 2020 no se puede pagar planillas pendiente de pago ya que es de monto mayor al asignado, por lo que persiste la suspensión.	Vega Silva, Andrea Karla	05/02/2020 - 02:50 PM
DICIEMBRE 2019: Obra suspendida desde el 15 de marzo de 2019 hasta el 28 de octubre, 29-31 de octubre obra en ejecución, desde 01 de noviembre el administrador del contrato se deja insubsistente la suspensión quedando nuevamente paralizada desde el 01 de noviembre hasta la actualidad, con plazo vigente 68 días, desde que se reinicie el proyecto, actualmente persiste planillas pendientes de pago. PAI 2020 con fondos asignados menores a los solicitados, por lo que no se podrá culminar la obra sin incremento de techo presupuestario.	Vega Silva, Andrea Karla	04/01/2020 - 10:43 AM
NOVIEMBRE 2019: OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2019 HASTA LA ACTUALIDAD, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS, DESDE QUE SE REINICIE EL PROYECTO, ACTUALMENTE PERSISTE PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO. PAI 2020 CON FONDOS ASIGNADOS MENORES A LOS SOLICITADOS, POR LO QUE NO SE PODRÁ CULMINAR LA OBRA SIG INCREMENTO DE TECHO PRESUPUESTARIO.	Vega Silva, Andrea Karla	02/12/2019 - 09:58 AM
OCTUBRE 2019: OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2019 HASTA 28 DE OCTUBRE DE 2019, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS, FECHA DE TERMOINACIÓN DE OBRA ES EL 07 DE ENERO DE 2020, ACTUALMENTE PERSISTE PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO.	Vega Silva, Andrea Karla	05/11/2019 - 04:31 PM
SEPTIEMBRE 2019: OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2019, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUÉS QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, ACTUALMENTE PERSISTEN PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO Y OTRAS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN. SE REQUIERE UNA REPROGRAMACIÓN DE HITOS, MAS NO SE LA PUEDE REALIZAR DEBIDO A QUE NO SE ESTABLECE LA FECHA DE REINICIO DE OBRA PARA DETERMINAR FECHAS DE NUEVOS HITOS.	Vega Silva, Andrea Karla	02/10/2019 - 10:51 AM
AGOSTO 2019: OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2019, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUÉS QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO Y OTRAS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN.	Vega Silva, Andrea Karla	05/09/2019 - 11:42 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
JULIO 2019: OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2019, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUÉS QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, UNAS PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO Y OTRAS EN TRAMITE DE APROBACIÓN.	Vega Silva, Andrea Karla	02/08/2019 - 10:04 AM
JUNIO 2019: OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 15 DE MARZO DE 2019, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUÉS QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, UNAS PLANILLAS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN POR EL MEF Y OTRAS PENDIENTES DE PAGO.	Vega Silva, Andrea Karla	04/07/2019 - 03:08 PM
MAYO 2019: OBRA SUSPENDIDA, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUES QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, UNAS PLANILLAS PENDIENTES DE ACREDITACIÓN Y OTRAS PENDIENTES DE PAGO, DEBIDO A LA FALTA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	Rojas Cazar, Walter Emilio	04/06/2019 - 12:29 PM
ABRIL 2019: OBRA SUSPENDIDA, CON PLAZO VIGENTE 71 DÍAS DESPUES QUE SE LEVANTE LA SUSPENSIÓN, LA MISMA QUE FUE MOTIVADA POR EL NO PAGO DE PLANILLAS DE 2018, PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO DEL 2018 DEBIDO A LA NO ASIGNACIÓN DE RECURSOS A ESTA DIRECCIÓN EN LAS FUENTES 998 E IVA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO DE ESTAS PLANILLAS..	Vega Silva, Andrea Karla	02/05/2019 - 04:58 PM
MARZO 2019: OBRA EN EJECUCIÓN NORMAL, CON PLAZO VIGENTE HASTA 25/05/2019. PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO DEL 2018 DEBIDO A LA NO ASIGNACIÓN DE RECURSOS A ESTA DIRECCIÓN EN LAS FUENTES 998 E IVA, RAZÓN POR LA CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL PAGO DE ESTAS PLANILLAS..	Vega Silva, Andrea Karla	03/04/2019 - 09:19 AM
FEBERO 2019: CON LA EFECTIVIZACIÓN DEL ACTICIPO OBRA REINICIA SUS ACTIVIDADES DESDE EL 07/02/2019 DEL 2019, CON PLAZO VIGENTE HASTA 25/05/2019. PLANIOLLAS PENDIENTES DE PAGO DEBIDO A LA NO ASIGNACIÓN DE RECURSOS.	Vega Silva, Andrea Karla	01/03/2019 - 09:37 AM
Ener 2019: Una vez que se ha regularizado la suscripción de los actos administrativos se reactivado la obra desde el 15 de noviembre de 2018, por lo tanto el proyecto se encuentra con una ejecución a partir de esta fecha. El pago de planillas aprobadas por la unidad administrativa no se pudo llevar a término debido a que MEF deshabilitó pagos con fuente998, el 28 de diciembre del 2018 se realizó el pago del anticipo por parte del MTOP, pero su acreditación no se realiza hasta la fecha, todo esto incumple lo establecido contractualmente, sumado a esto están pendientes de acreditación de 4 planillas, lo que dificulta la ejecución de la obra, por lo que dando cumplimiento a lo establecido contractualmente se suspende la obra hasta el pago de lo adeudado y anticipo del CC04.	Vega Silva, Andrea Karla	04/02/2019 - 02:34 PM
Diciembre 2018: Una vez que se ha regularizado la suscripción de los actos administrativos se reactivado la obra desde el 15 de noviembre de 2018, por lo tanto el proyecto se encuentra con una ejecución a partir de esta fecha. El pago de planillas aprobadas por la unidad administrativa no se pudo llevar a término debido a que MEF deshabilitó pagos con fuente998, el 28 de diciembre del 2018 se realizo el pago del anticipo por parte del MTOP, pero su acreditación no se realiza, todo esto incumple lo establecido contractualmente, sumado a esto están pendientes de acreditación las planillas 4 planillas, lo que dificulta la ejecución por parte de la contratista llevandolos a la presentar la solicitud de paralización, misma que se encuentra en estudio de ser o no aprobada por parte de fiscalización.	Vega Silva, Andrea Karla	02/01/2019 - 03:15 PM
Noviembre 2018: Una vez que se ha regularizado la suscripción de los actos administrativos se reactivado la obra desde el 26 de noviembre de 2018, por lo tanto el proyecto se encuentra en ejecución a partir de esta fecha.	Rojas Cazar, Walter Emilio	05/12/2018 - 04:25 PM
Octubre 2018: En vista de que la asignación presupuestaria no se realizó oportunamente para el CC03, se vio la necesidad de dividirlo a este en dos, en el CC03 y CC04, es así que el CC03 actualmente en trámite ahora no contempla incremento de monto per si ampliación de plazo de 60 días. Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y sin incremento de monto. Ya se realizó la asignación de 1.86MM USD para suscripción el CC03 para trámite del CC04. Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto	Vega Silva, Andrea Karla	05/11/2018 - 08:17 AM
septiembre 2018: Debido a que matriz Quito hasta la fecha no hace la asignación d erecursos para la suscripcion del CC03, se vio la necesidad de dividirlo a este en dos, en el CC03 y CC04, es así que el CC03 actualmente en trámite ahora no contempla incremento de monto per si ampliación d eplazo de 60 días. Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y sin incremento de monto. El CC04 quedará pendiente hasta que haya la asignación de 2.32MM USD para su certificación y posterior trámite.	Vega Silva, Andrea Karla	02/10/2018 - 04:46 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto		
AGOSTO 2018: Obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto	Vega Silva, Andrea Karla	03/09/2018 - 12:27 PM
JULIO 2018: Obra en ejecución, obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto	Vega Silva, Andrea Karla	02/08/2018 - 12:43 PM
JUNIO 2018: Obra en ejecución, obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto	Vega Silva, Andrea Karla	05/07/2018 - 05:41 PM
MAYO 2018: Obra en ejecución, obra suspendida hasta que se legalice el contrato complementario Nro.03 con variación de cantidades, rubros nuevos y aumento de monto	Vega Silva, Andrea Karla	04/06/2018 - 12:37 PM
ABRIL 2018: Obra en ejecución, los trabajos se realizan con normalidad, con acta 451 firmada se da ampliación de plazo hasta el 04 de junio del 2018. En trámite contrato complementario Nro.03, variación de cantidades y rubros nuevos	Vega Silva, Andrea Karla	02/05/2018 - 10:11 AM
ENERO-MARZO 2018: Obra en ejecución, los trabajos se realizan con normalidad, con acta 451 firmada se da ampliación de plazo hasta el 04 de junio del 2018.	Bustamante Rivera, Esner Fidel	03/04/2018 - 09:27 AM
dic 2017: se levanta la paralización dle proyecto el 26 de diciembre del 2017. con ampliación d eplazo de 45 días, pendiente liquidación de plazo, se regularizan los trabajos en Cebaf-Macará	Vega Silva, Andrea Karla	02/01/2018 - 11:41 AM
Nov 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado.	Vega Silva, Andrea Karla	04/12/2017 - 05:03 PM
Oct 2017: Actualmente el proyecto se encuentra reactivado desde el 11/10/2017, se realizan trabajos eléctricos y eléctricos, además de trabajos de imprimación de vías.	Vega Silva, Andrea Karla	01/11/2017 - 08:22 AM
SEP 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado por falta de pago de planillas, por parte del MTOP_Dirección Distrital de Loja se realizaron los pagos de planillas pendientes el día 17/08/2017, se requiere que MEF acredite dichos fondos urgentemente a la contratista, para levantar la paralización de la obra.	Ludeña Suescun, Rusbel Enrique	03/10/2017 - 09:08 AM
AGOSTO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra paralizado por falta de pago de planillas.. 1) Se realizaron los pagos de planillas pendientes el día 17/08/2017 por parte de la Dirección Distrital de Loja, se requiere que MEF acredite dichos fondos urgentemente. 2) Con fecha 29 de marzo de 2017 se da la suspensión indefinida del proyecto, hasta que la comisión 451 resuelva sobre la solicitud de ampliación del plazo contractual y las condiciones climáticas mejoren. Con fecha 28 de junio de 2017, se reúne la Comisión 451 en Quito y celebran el acta, en la cual levantan la suspensión y aprueban la variación de cantidades, creación de rubros nuevos sin incremento de monto e incremento de plazo en sesenta días, tomando como nueva fecha para la terminación de los trabajos el 27 de agosto de 2017. Con memorando MTOP-DDL-2017-1351-ME, del 04 de agosto 2017 se da paso a la paralización legal de la obra hasta que de se de el pago de haberes pendientes al contratista. Con oficio Nro. 391-CONSORCIO A.S-CEBAF, del 04 de agosto, se solicita ampliación de 45 días a partir de la cancelación y acreditación de los haberes pendientes de pago. Por lo que urgentemente se requiere la colaboración del MEF. El Mtop es únicamente la ejecutora de la infraestructura, los responsable de los mecanismos de administración son INMOBILIAR y CANCELLERIA de acuerdo a la reunión realizada entre Cancillería, MTOP, INMOBILIAR Y SENPLADES que así lo establecieron.	Vega Silva, Andrea Karla	05/09/2017 - 12:44 PM
JULIO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución desde el 27 de junio del 2017, con un avance físico de la obra del 84%, con plazo vigente según acta 451 hasta el 28 de agosto del 2017. Planillas pendientes de pago por falta de asignación de recursos 998, por lo que la contratista solicitó la paralización legal de los trabajos por incumplimiento en el pago por parte de la contratista.	Vega Silva, Andrea Karla	02/08/2017 - 03:44 PM
JUNIO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario Nro.2.	Vega Silva, Andrea Karla	05/07/2017 - 08:35 AM
MAYO 2017: Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario Nro.2.	Vega Silva, Andrea Karla	05/06/2017 - 10:38 AM
abril 2017 Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-381-ME, de fecha 28 de octubre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y	LALVAY MACANCELA, CRISTIAN GEOVANNY	05/05/2017 - 10:09 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
disminucion de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual, referente a la Propuesta de Hormigon 350 Kg/cm2 en parqueos del CEBAF, Macara - La Tina. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.		
Noviembre 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-381-ME, de fecha 28 de octubre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminucion de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual, referente a la Propuesta de Hormigon 350 Kg/cm2 en parqueos del CEBAF, Macara - La Tina. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	13/12/2016 - 09:37 AM
Octubre 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-381-ME, de fecha 28 de octubre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminucion de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual, referente a la Propuesta de Hormigon 350 Kg/cm2 en parqueos del CEBAF, Macara - La Tina. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	08/11/2016 - 07:51 PM
Septiembre 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-348-ME, de fecha 28 de septiembre de 2016, el Ing. Volter González, Fiscalizador del Proyecto, remite a la Dirección Provincial información solicitada desde matriz para trámite de Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminucion de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	10/10/2016 - 09:05 AM
Agosto 2016: En trámite Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminucion de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	09/09/2016 - 12:55 PM
Julio 2016: En trámite Contrato Complementario No. 1 para ampliación de plazo en 90 días, aumento y disminucion de cantidades, creación de rubros nuevos, sin incremento de monto contractual. Actualmente el proyecto se encuentra suspendido hasta que exista pronunciamiento por parte de la Comisión 451 respecto al trámite de Contrato Complementario.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	09/08/2016 - 05:30 PM
Junio 2016: Se reinician los trabajos de obra con una ampliación de 60 días, a partir del 8 de junio del 2016. Se legaliza Orden de Cambio No. 1 para ampliación de plazo.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	05/07/2016 - 03:24 PM
Mayo 2016: Mediante reunión de la comisión 451, aprobó una ampliación de 60 días para terminar los trabajos objeto del contrato, cuyo plazo corre a partir de que se efectivicen el pago correspondiente de cuatro planillas por parte del Ministerio de Finanzas. Actualmente el proyecto continúa suspendido.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	02/06/2016 - 04:45 PM
Abril 2016: Mediante reunión de la comisión 451, aprobó una ampliación de 60 días para terminar los trabajos objeto del contrato, cuyo plazo corre a partir de que se efectivicen el pago correspondiente de cuatro planillas por parte del Ministerio de Finanzas. Actualmente el proyecto continúa suspendido. Marzo 2016: Mediante reunión de la comisión 451, aprobó una ampliación de 60 días para terminar los trabajos objeto del contrato, cuyo plazo corre a partir de que se efectivicen el pago correspondiente de cuatro planillas por parte del Ministerio de Finanzas. Actualmente el proyecto continúa suspendido.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	04/05/2016 - 03:00 PM
Febrero 2016: Hasta la presente fecha el Ministerio de Finanzas no efectiviza el pago de las cuatro planillas realizadas por MTOP a la Contratista, por lo que no se reinician los trabajos con los 60 días de ampliación conforme aprobación de Comisión 451.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	07/03/2016 - 04:14 PM
Enero 2016: Comisión 451, aprueba ampliación de plazo por 60 días.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	11/02/2016 - 12:53 PM
Diciembre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2015 - 06:32 PM
Noviembre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2015 - 06:32 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2015 - 06:32 PM
Septiembre 2015: Continúa la suspensión de los trabajos, conforme Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2015 - 06:32 PM
Agosto 2015: Se culminan los trabajos de colocacion de estructura metálica en el edificio central, mediante Oficio Nro. MTOP-DPL-15-363-OF, de fecha 25 de agosto la Fiscalización-MTOP, notifica al contratista sobre la suspensión de los trabajos hasta que se proceda con los pagos correspondientes.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2015 - 06:31 PM
Julio 2015: Se continuan realizando trabajos de colocacion de estructura metálica, la contratista solicita suspensión de trabajos por cuanto hasta la presente fecha no se le han cancelado ninguna planilla.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2015 - 06:31 PM
Junio 2015: Se continuan realizando trabajos de colocacion de estructura metálica, construcción de tanque séptico.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2015 - 06:31 PM
Mayo 2015: Con los contrapisos fundidos se inician trabajos de colocación de estructuras metálicas.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2015 - 06:30 PM
Abril 2015: Se realizan trabajos preliminares como movimiento de tierras, construcción de bodegas para campamento y adquisición de materiales para colocación de estructuras metálicas.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2015 - 06:29 PM
Marzo 2015: Se entrega el anticipo a la contratista con fecha 25 de marzo del 2015 con lo cual inician los trabajos.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2015 - 06:29 PM
Febrero 2015: Se suscribe acta de adjudicación y contrato para construcción del CEBAF con la contratista CONSORCIO A.S	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2015 - 06:28 PM
Enero 2015: El proceso precontractual se encuentra en proceso de adjudicación.	Vargas Pineda, Cecibel del Carmen	30/12/2015 - 06:28 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Trámite de la Orden de cambio 4	19/10/2021	Marco Joffre Regalado Jaramillo	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 4, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. * General. La falta de la suscripción de la orden de cambio 4 CAUSARIA retraso la entrega de la obra	05/11/2021	Marco Joffre Regalado Jaramillo	100 %	100	100	0/1

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 7 - Sur > Loja > Macara

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Documento de Proyecto en formato SENPLADES elaborado	1-Solicitud de Información	22/07/2014		22/07/2014		Sí	8.0
2	DEFINICIÓN: Proyecto en SIPEP postulado	1-Solicitud de Información	22/07/2014		22/07/2014		Sí	2.0
3	PLANEACIÓN: Priorización SENPLADES emitida	1-Solicitud de Información	22/10/2014		22/10/2014		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: Proyecto en PAI incluido	1-Solicitud de Información	22/10/2014		22/10/2014		Sí	2.0
5	EJECUCIÓN: Programación presupuestaria aprobada (Patrocinador Ejecutivo)	1-Solicitud de Información	23/10/2014		23/10/2014		Sí	2.0
6	EJECUCIÓN: Términos de Referencia aprobados	2-Publicación de Pliegos	23/10/2014		23/10/2014		Sí	2.0
7	PLANEACIÓN: Proyecto con recursos económicos asignados	2-Publicación de Pliegos	23/10/2014		23/10/2014		Sí	3.0
8	EJECUCIÓN: Adjudicación realizada	3-Adjudicación	05/02/2015		05/02/2015		Sí	2.0
9	EJECUCIÓN: Aval aprobado	4-Inicio de Trabajo	21/02/2015		21/02/2015		Sí	2.0
10	EJECUCIÓN: Certificación presupuestaria aprobada	4-Inicio de Trabajo	21/02/2015		21/02/2015		Sí	2.0
11	EJECUCIÓN: Contrato Principal y/o Complementario suscrito	4-Inicio de Trabajo	27/02/2015		27/02/2015		Sí	2.0
12	EJECUCIÓN: Entrega de anticipo, ejecutado	4-Inicio de Trabajo	25/03/2015		25/03/2015		Sí	4.0
13	EJECUCIÓN: Inicio de Trabajos, ejecutado	4-Inicio de Trabajo	25/03/2015		25/03/2015		Sí	2.0
14	EJECUCIÓN: Trabajos Preliminares, movimiento de tierras	5-Entregables Intermedios	22/07/2015		22/07/2015		Sí	2.0
15	EJECUCIÓN: Obras de calzada fase 1	5-Entregables Intermedios	19/11/2015		19/11/2015		Sí	2.0
16	EJECUCIÓN: Obras Estructurales	5-Entregables Intermedios	27/11/2015		27/11/2015		Sí	6.0
17	EJECUCIÓN: Instalaciones Hidro-sanitarias	5-Entregables Intermedios	30/11/2015		30/11/2015		Sí	6.0
18	EJECUCIÓN: Construcción de garitas	5-Entregables Intermedios	09/09/2016		09/09/2016		Sí	4.0
19	EJECUCIÓN: Instalaciones electricas	5-Entregables Intermedios	10/10/2016		10/10/2016		Sí	4.0
20	EJECUCIÓN: Instalaciones Electrónicas y Mecánicas	5-Entregables Intermedios	10/10/2016		10/10/2016		Sí	7.0
21	EJECUCIÓN: Obras arquitectonicas	5-Entregables Intermedios	30/11/2016		30/11/2016		Sí	6.0
22	EJECUCIÓN: Acabados arquitectónicos edificio central	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	6.0
23	EJECUCIÓN: Acabados arquitectónicos otras edificaciones	5-Entregables Intermedios	30/11/2018		30/11/2018		Sí	5.0
24	EJECUCIÓN: Obras de calzada fase 2	5-Entregables Intermedios	31/03/2019		31/03/2019		Sí	2.0
25	EJECUCIÓN: Señalización	5-Entregables Intermedios	30/04/2021	30/04/2021			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
26	CIERRE: Informes de Fiscalización aprobados	5-Entregables Intermedios	31/05/2021	31/05/2021			No	1.0
27	CIERRE: Liquidación Económica	5-Entregables Intermedios	30/06/2021	30/06/2021			No	1.0
28	CIERRE: Acta Entrega Recepción Provisional suscrita	5-Entregables Intermedios	31/07/2021	31/07/2021			No	1.0
29	CIERRE: Acta Entrega Recepción Definitiva	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/02/2022	28/02/2022			No	2.0
30	Completado: Recepción definitiva del proyecto y acta de recepción, ejecutado	9-Entregables Formales	15/03/2022	15/03/2022			No	0.5
31	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Administrativa Financiera de aspectos administrativos finiquitados y de no existencia de obligaciones pendientes de pago - suscrito	9-Entregables Formales	31/03/2022	31/03/2022			No	1.0
32	CIERRE: Certificación de la Cordinación General Jurídica de no encontrarse inmerso en proceso legal alguno	9-Entregables Formales	31/03/2022	31/03/2022			No	1.0
33	CIERRE: Certificación de no mantener saldos presupuestarios, contables o de tesorería pendientes por liquidar - suscrito MEF	9-Entregables Formales	31/03/2022	31/03/2022			No	1.0
34	CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado	9-Entregables Formales	31/05/2022	31/05/2022			No	1.0
35	CIERRE: Solicitud de cierre de proyecto Máxima Autoridad aprobado	9-Entregables Formales	31/05/2022	31/05/2022			No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Porcentaje de Equipamiento tecnológico colocado		70.00 %	1	0.7	01/01/2019	Septiembre


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	4,256,899.14
Estimado Al Fin Del Proyecto:	14,675,920.90 **
Costo Total:	17,394,259.97
Total Devengado:	15,772,755.89
% Costo Total Devengado:	90.68 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 90.68 %

Perfil Económico 2021

	Años Previos	Año Actual (2021)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	31,020,475.80	2,993,445.78	0.00	34,013,921.58
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	4,387,018.26	536,735.19	0.00	4,923,753.45
Ppto. Codificado	19,638,277.02	2,091,615.91	0.00	21,729,892.93
Ppto. Comprometido	17,080,261.54	2,091,615.91	0.00	19,171,877.45
Planeado - Codificado (2021)		901,829.87		
Programado a Devengar	13,246,160.80	0.00	0.00	13,246,160.80
Ppto. Devengado	14,675,920.90	1,096,834.99	0.00	15,772,755.89
Pagado Real	9,636,318.49	1,096,834.99	0.00	10,733,153.48
Estimado a fin de año	* 14,675,920.90	1,227,546.42	0.00	15,903,467.32
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	-1,429,760.10	-1,227,546.42	0.00	-2,657,306.52
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 110.79 %	-	0.00 %	119.07 %
Ppto. Codificado 998	2,004,507.62	464,146.16	0.00	2,468,653.78
Ppto. Devengado 998	1,855,130.51	464,146.14	0.00	2,319,276.65

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

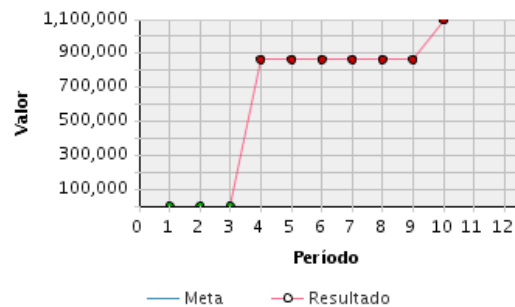

Presupuesto Mensual 2021

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %

Presupuesto Mensual 2021							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		100.00 %
Abr	0.00	864,069.49	0.00	864,069.49	115.00 %		115.00 %
May	0.00	0.00	0.00	864,069.49	115.00 %		115.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	864,069.49	115.00 %		115.00 %
Jul	0.00	0.00	0.00	864,069.49	115.00 %		115.00 %
Ago	0.00	0.00	0.00	864,069.49	115.00 %		115.00 %
Sep	0.00	0.00	0.00	864,069.49	115.00 %		115.00 %
Oct	0.00	232,765.50	0.00	1,096,834.99	115.00 %		115.00 %
Nov	0.00		0.00				
Dic	0.00		0.00				
Total	0.00	1,096,834.99					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
15	Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.
16	Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciación del equipo caminero y la contratación de personal calificado para la operación del mismo.
17	Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de ingeniería de puntos críticos.
18	Incrementar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	A.1.HITO3.Dictamen de prioridad SENPLADES	Dictamen_de_prioridad__SENPLADES_del_CEBAF.pdf	31/05/2015
2	A.2.HITO13.Informe ejecutivo febrero-2015	Infor-ejecutivo_febrero-2015.pdf	10/12/2015
3	A.3.HITO13. Informe ejecutivo marzo-2015	Infor-ejecutivo_marzo-2015.pdf	10/12/2015
4	A.4.HITO13.Informe ejecutivo abril-2015	Infor-ejecutivo_abril-2015.pdf	10/12/2015
5	A.5.HITO13.Informe ejecutivo mayo-2015	Infor-ejecutivo_mayo-2015.pdf	10/12/2015
6	A.6.HITO14.Informe ejecutivo junio-2015	Infor-ejecutivo_junio-2015.pdf	10/12/2015
7	A.7.HITO14.Informe ejecutivo julio-2015	Infor-ejecutivo_julio-2015.pdf	10/12/2015
8	A.8.HITO14.Informe ejecutivo agosto-2015	Infor-ejecutivo_agosto-2015.pdf	10/12/2015
9	A.9.HITO14.Informe ejecutivo septiembre-2015	Infor-ejecutivo_septiembre-2015.pdf	10/12/2015
10	A.HITO22.INFORME MAYO 2017	AVANCE_SEMANAL_OBRA_CEBAF_05_09_2017.xlsx	03/10/2017
11	B1.HITO14.Informe ejecutivo octubre-2015	Infor-ejecutivo_octubre-2015.pdf	10/12/2015
12	B2.HITO14.Informe ejecutivo noviembre-2015	Infor-ejecutivo_noviembre-2015.pdf	10/12/2015
13	B3.HITO6.Convocatoria	CONVOCATORIA_CEBAF.pdf	31/05/2015
14	B4.HITO11.Contrato	01-contrato.pdf	31/05/2015
15	B5.HITO13.Memorando nombrando Fiscalizador y Supervisor	MTOP-DPL-2015-365-ME.pdf	31/05/2015
16	B6.HITO13.Memorando nombrando al nuevo fiscalizador	MTOP-DPL-2015-562-ME.pdf	31/05/2015
17	B7.HITO11.ACTA 451 CEBAF - MACARA - LA TINA	ACTA_451_CEBAF_-_MACARA_-_LA_TINA.pdf	05/04/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
18	B8.HITO13.Memorando Nro. MTOP-EITZ7-2016-348-ME	Memorando_Nro._MTOP-EITZ7-2016-348-ME.pdf	10/10/2016
19	B9.HITO2.Proyecto postulado en SipeIP	Proyecto_postulado_en_SipeIP.pdf	02/10/2019
20	C1.HITO18.Informe Ejecutivo Enero 2016	B.1_Informe_Ejecutivo_Enero_2016.pdf	07/03/2016
21	C2.HITO15.Informe Ejecutivo Febrero 2016	B.2_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016.pdf	07/03/2016
22	C3.HITO15.Informe Ejecutivo Marzo 2016	B.3_Informe_Ejecutivo_Marzo_2016.pdf	05/04/2016
23	C4.HITO16.Informe Ejecutivo Abril 2016	Informe_Ejecutivo_Abril_2016.pdf	04/05/2016
24	C5.HITO17.Informe Ejecutivo Mayo 2016	Informe_Ejecutivo_Mayo_2016.pdf	03/06/2016
25	C6.HITO17.Informe Ejecutivo Julio 2016	Informe_Ejecutivo_Julio_2016.pdf	11/08/2016
26	C7.HITO17.Informe Ejecutivo Agosto 2016	Informe_Ejecutivo_Agosto_2016.pdf	09/09/2016
27	C8.HITO18.Informe Ejecutivo Septiembre 2016	B.9_Informe_Ejecutivo_Septiembre_2016.pdf	10/10/2016
28	D1.HITO11.Acta 451 cebaf	acta_451_cebaf.pdf	02/08/2017
29	D2.HITO23.INFORME CEBAF AL 31 DE MARZO DEL 2018	INFORME_CEBAF_AL_31_DE_MARZO_DEL_2018.pdf	04/04/2018
30	D3.HITO22.INFORME SEMANAL CEBAF 04 2018	INFORME_SEMANAL_CEBAF_04_2018.pdf	02/05/2018
31	D4.HITO23.Informe Ejecutivo CEBAF Macará - La Tina Mayo 2018	Informe_Ejecutivo_CEBAF_Macará_- _La_Tina_Mayo_2018.pdf	04/06/2018
32	D5.HITO23.INFORME SEMANAL CEBAF 30 06 2018	INFORME_SEMANAL_CEBAF_30_06_2018.pdf	05/07/2018
33	D6.HITO19.informe de trabajos de julio del 2017	AVANCE_SEMANAL_OBRA_CEBAF_08_2017.pdf	02/08/2017
34	D7.HITO20.informe agosto	informe-CEBAF_04_08_2017.pdf	05/09/2017
35	D8.HITO22. informe_OBRA_CEBAF_08_2017	informe_OBRA_CEBAF_08_2017.pdf	02/08/2018
36	Designación de líder de proyecto 2021	Memorando_Nro._MTOP-DDL-2021-957-ME.pdf	22/04/2021
37	E1.HITO3.DICTAMENDEPRIORIDADCEBAF	DICTAMENDEPRIORIDADCEBAF.PDF	14/03/2019
38	E2.HITO1.ESTUDIOS_CEBAF_MACARA_V3	ESTUDIOS_CEBAF_MACARA_V3.PDF	14/03/2019
39	E3.HITO1.FORMATO SENPLADES CEBAF-MACARA 22-07-2014	FORMATO_SENPLADES_CEBAF-MACARA_22-07-2014.docx	20/03/2019
40	E4.HITO24.INFORMEDEEJECUCION	INFORMEDEEJECUCION.PDF	14/03/2019
41	E5.HITO5.MTOP-CONS_LOJ-2019-141-ME SOLICITANDO INCREMENTO DE TECHO PRESUPUESTARIO PARA CULMINACIÓN DE OBRA	MTOP-CONS_LOJ-2019-141-ME.pdf	01/03/2019
42	E6.HITO23.AYUDA MEMORIA CEBAF 02 01 2019	AYUDA_MEMORIA_CEBAF_02_01_2019.pdf	02/01/2019
43	E7.HITO22.AYUDA MEMORIA (FEBRERO 2019)	AYUDA_MEMORIA_(FEBRERO_26_2019)_CEBAF(1).pdf	01/03/2019
44	E8.HITO23.AYUDA MEMORIA (MARZO 31 2019) CEBAF	AYUDA_MEMORIA_(MARZO_31_2019)_CEBAF.xlsx	03/04/2019
45	E9.HITO7.CAMBIO DE FASE_ MTOP-SUBZ7-2019-0351-ME	MTOP-SUBZ7-2019-0351-ME.pdf	15/04/2019
46	F1.HITO7.Suspension 15 03 2019 cebaf macará Administracion	suspension__15_03_2019_cebaf_macará_Administracion.pdf	04/07/2019
47	F2.HITO24.AYUDA MEMORIA (07 2019) CEBAF	AYUDA_MEMORIA_(07_2019)_CEBAF.pdf	02/08/2019
48	F3.HITO24.AYUDA_MEMORIA_(08_2019)_CEBAF	AYUDA_MEMORIA_(08_2019)_CEBAF.pdf	05/09/2019
49	F4.HITO7.CEDULA ENERO	CEDULA_ENERO.pdf	17/09/2019
50	F5.HITO7.CEDULA FEBRERO	CEDULA_FEBRERO.pdf	17/09/2019
51	F6.HITO7.CEDULA MARZO	CEDULA_MARZO.pdf	17/09/2019
52	F7.HITO7.CEDULA ABRIL	CEDULA_ABRIL.pdf	17/09/2019
53	F8.HITO7.CEDULA MAYO	CEDULA_MAYO.pdf	17/09/2019
54	F9.HITO7.CEDULA JUNIO	CEDULA_JUNIO.pdf	17/09/2019
55	G1.HITO7.CEDULA JULIO	CEDULA_JULIO.pdf	17/09/2019
56	G2.HITO7.CEDULA AGOSTO	CEDULA_AGOSTO.pdf	02/10/2019
57	G3.HITO7.CEDULA SEPTIEMBRE	CEBAF_-_SEPTIEMBRE(1).pdf	25/11/2019
58	G4.HITO7.CEDULA OCTUBRE	CEBAF_-_OCTUBRE(1).pdf	25/11/2019
59	G5.HITO7.CEDULA NOVIEMBRE	CEBAF_-_NOVIEMBRE(1).pdf	25/11/2019
60	G6 HITO11. orden de cambio 1	orden_de_cambio_1.pdf	13/11/2019

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
61	G7.HITO11.Contrato complementario 01	CC01.pdf	13/11/2019
62	G8.HITO11.Contrato complementario 02	CC02.pdf	13/11/2019
63	G9.HITO11.orden de cambio 02	OC02.pdf	13/11/2019
64	H1.HITO11.Contrato complementario 03	CC_03.pdf	13/11/2019
65	H2.HITO11.orden de cambio 03	OC_03.pdf	13/11/2019
66	H3.HITO11.Contrato complementario 04	CC_04.pdf	13/11/2019
67	H4 SOLICITUD APERTURA DE FICHA DEL PROYECTO	MTOP-DDL-2019-1596-ME__y_MTOP-CONS_2019-528-ME.pdf	22/11/2019
68	H5.HITO11.Cronograma reprogramado 29 10 2019	Cronograma_reprogramado1.pdf	22/11/2019
69	H6.HITO2.Ficha_Proyecto sipeip 2019	Ficha_Proyecto_sipeip_2019.pdf	29/11/2019
70	H7.HITO4.PAI 2019 PROYECTOS INVERSIÓN loja	PAI_2019_PROYECTOS_INVERSIÓN_loja.xls	29/11/2019
71	H8.Cambio de fase a CONGELADO	cambio_fase_a_congelado.pdf	02/12/2019
72	H9. SUSPENSIÓN DEL PROYECTO DESDE EL 15 DE MARZO	MTOP-DDL-2019-2842-ME(1).pdf	02/12/2019
73	I1.RIESGO1. SOLICITANDO RECURSOS PARA PAGOS PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO_CEBAF-MACARÁ-LA TINA	MTOP-CONS_LOJ-2019-1517-ME.pdf	17/12/2019
74	I2.INSUBSISTENCIA AL LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS PROYECTO CEBAF MACARA	MTOP-DDL-2019-2842-ME(2).pdf	04/01/2020
75	I3. HITO7. CEDULA PRESUPUESTARIA ENERO-ABRIL 2020	CEDULAS_MENSUALES_CEBAF.rar	29/04/2020
76	I4. HITO7. CEDULA ENERO 2020	ENERO.pdf	02/10/2020
77	I5.HITO7. CEDULA FEB 2020	FEBRERO.pdf	02/10/2020
78	I6.HITO7.CEDULA MAR 2020	MARZO.pdf	02/10/2020
79	I7.HITO7.CEDULA ABR 2020	ABRIL.pdf	02/10/2020
80	I8..HITO7.CEDULA MAY 2020	MAYO.pdf	02/10/2020
81	I9..HITO7.CEDULA JUN 2020	JUNIO.pdf	02/10/2020
82	J1..HITO7.CEDULA JUL 2020	JULIO.pdf	02/10/2020
83	J2..HITO7.CEDULA AGO 2020	AGOSTO.pdf	02/10/2020
84	J3..HITO7.CEDULA SEP 2020	SEPTIEMBRE.pdf	02/10/2020
85	J4.HITO17.Informe Ejecutivo sep 2020	AYUDA_MEMORIA_(SEP_2020)_CEBAF.pdf	02/10/2020
86	J5..HITO7.CEDULA OCT 2020	CEDULA_-CEBAF_-OCTUBRE_-KARLA.pdf	30/10/2020
87	J6.HITO17.Informe Ejecutivo NOV 2020	ayuda_memoria_CEBAF_03_12_2020.pdf	03/12/2020
88	J7.HITO22.cambio lider K039	cambio_lider_K039.pdf	24/12/2020
89	J8.HITO24.Informe Ejecutivo DIC 2020	Ayuda_nuevo_formato_CEBAF_diciembre_2020.pdf	05/01/2021
90	J9. HITO7.CEDULA ENE 2021	Cedula_presupuestaria_enero2021.pdf	29/01/2021
91	K1. Recursos solicitados para el POA 2021	Recursos_CEBAF_Macará_POA_2021_Fiscalizacion.xls	29/01/2021
92	K2. HITO7. APROBACIÓN POA 2021	POA_2021.rar	04/03/2021
93	K3. Levantamiento y suspensión de la obra (15/03/2021 y 25/03/2021)	Levantamiento_y_suspensión_de_la_obra_(15032021_y_25032021).pdf	03/04/2021
94	K4. INFORME CEBAF mayo 2021	Ayuda_CEBAF_mayo_2021.xls	04/06/2021
95	K5. INFORME CEBAF JUNIO 2021	Ayuda_nuevo_formato_CEBAF_junio_2021.xls	05/07/2021
96	K6.HITO7. Levantamiento de suspensión julio 2021	MTOP-DDL-21-202-OF.pdf	05/08/2021
97	K7.HITO7. CUR DE PAGO Y CEDULA PRESUPUESTARIA (JULIO 2021)	CEDULA_Y_CUR_DE_PAGO_PLANILLA_18.rar	05/08/2021
98	K8. Cambio de fase Agosto 2021	Cambio_de_fase_Agosto_2021.rar	12/08/2021
99	K9. HITO 20. INFORME CEBAF AGOSTO 2021	Ayuda_nuevo_formato_CEBAF_agosto_2021.xls	02/09/2021
100	L1.HITO7. CEDULAS PRESUPUESTARIAS (ENERO-AGOSTO 2021)	CEDULAS_ENERO-AGOSTO_2021.rar	06/09/2021

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
101	L2. SUSPENSIÓN DEL PROYECTO DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE	MTOP-DDL-21-298-OF.pdf	05/10/2021
102	L3.HITO7. CEDULA PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2021	Cedula_presupuestaria_septiembre_2021.pdf	05/11/2021
103	L4.HITO7. CEDULA PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2021	Cedula_presupuestaria_octubre_2021.pdf	05/11/2021

LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	SITOP
	http://sitop.mtop.gob.ec:8080/mtop/

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
CORDERO SANCHEZ, ANDREA DEL CISNE	Analista Distrital de Presupuesto	ANALISTA DE PRESUPUESTO DISTRITAL	acordero@mtop.gob.ec	072561665 EXT72509
CRUZ PINEDA, JONATHAN RAUL	Supervisor del proyecto	Analista de Infraestructura Distrital 1	jrcruz@mtop.gob.ec	
Pineda Betancourt, Gabriela Del Cisne	Coordinadora de Planificación Zonal 7	Coordinadora de Planificación Zonal 7	gpineda@mtop.gob.ec	023974600
Punin Burneo, Eduardo Patricio	Subsecretario Regional 7	Subsecretario/a de Transportes y Obras Públicas Zonal 7	epunin@mtop.gob.ec	
Regalado Jaramillo, Marco Joffre	Director Distrital de Loja, Administrador del proyecto	Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Loja	mregalado@mtop.gob.ec	
VARGAS PINEDA, CECIBEL DEL CARMEN	Coordinador Tecnico de Infraestructura Distrital	EXPERTO DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL	cvargas@mtop.gob.ec	072561665 ext 72518
VARGAS PINEDA, CECIBEL DEL CARMEN	Fiscalizador del proyecto	EXPERTO DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL	cvargas@mtop.gob.ec	072561665 ext 72518

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo	Fecha de Alta
97605_1.jpg	05/01/2021
